Өскемен қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Шүлбі кентінің психиатриялық ауруханасы» ШЖҚ КМК аумағындағы екі бақылау-өткізу пункттері құрылғысы бар қоршауын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
И.о. директора
филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области
Салимов Б.Я.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 06-0321/15 от 14.10.2015 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГП на ПХВ «Психиатрическая больница поселка Шульбинск» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ «Психиатрическая больница поселка Шульбинск» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
поселок Шульбинск

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Восток Инжиниринг»
город Усть-Каменогорск

город Усть-Каменогорск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГП на ПХВ «Психиатрическая больница поселка Шульбинск» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГП на ПХВ «Психиатрическая больница поселка Шульбинск» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области».

Год разработки – 2015.

Настоящее заключение выполнено согласно договора № 0305 от 10.09.2015 г. на проведение экспертизы по рабочему проекту «Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГП на ПХВ «Психиатрическая больница поселка Шульбинск» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области».

2. ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Психиатрическая больница п. Шульбинск» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Восток Инжиниринг», государственная лицензия на проектные работы ГСЛ № 14004774 от 07.04.2014 г., выдана Комитетом по делам строительства и ЖКХ Минестерства регианального развития РК. Приложение к государственной лицензии от 07.04.2014 г., выданное Комитетом по делам строительства и ЖКХ Минестерства регианального развития РК, II категория проектирования.

ГИП – *Подкорытова В.И., приказ № 27 от 19.08.2015 г.*

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- письмо заказчика КГП на ПХВ «Психиатрическая больница п. Шульбинск» УЗ ВКО № 01-807 от 18.08.2015 г., о том, что финансирование объекта предусмотрено по программе 033 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения», по специфике 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»;
- задание на проектирование № 01-703 от 25.06.2015 г., утвержденное заказчиком КГП на ПХВ «Психиатрическая больница п. Шульбинск» УЗ ВКО;
- письмо КГП на ПХВ «Психиатрическая больница п. Шульбинск» УЗ ВКО № 01-806 от 18.08.2015 г. о начале строительства объекта – апрель 2016 г.;
- заключения от 2015 г. о техническом состоянии строительных конструкций ограждения КГП на ПХВ «Психиатрическая больница п. Шульбинск» УЗ ВКО, г. Семей п. Шульбинск, ул. Прибрежная, 1, аттестат эксперта № 03579 от 28.08.2012 г. выданный Агенством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- дефектная ведомость от 20.07.2015 г.;
- технический паспорт от 23.08.2010 г., выданный центром недвижимости.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- заключение по рабочему проекту КГП на ПХВ «Психиатрическая больница п. Шульбинск» УЗ ВКО № 01-85 от 18.08.2015 г. о согласовании рабочего проекта.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

- Том 1. Пояснительная записка (2015-1-ПЗ);
- Том 2. Альбом чертежей, раздела:

«Архитектурно-строительные решения» (2015-1-АС);
«Отопление и вентиляция» (2015-1-ОВ);
«Электротехнические решения» (2015-1-ЭО);
«Пожарная сигнализация» (2015-1-ПС);
- Том 3. Сметная документация (2015-1-СМ).

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Главная цель – улучшение технического состояния ограждения здания и возможность эксплуатации в полном объеме.

Целесообразность строительства определена заказчиком.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Здание КГП на ПХВ «Психиатрическая больница п. Шульбинск» УЗ ВКО расположено по ул. Прибрежная, 1, п. Шульбинск, Восточно-Казахстанской области.

Природно-климатические условия района строительства:

- Климатический район – 1В;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 38 °С;
- скоростной напор ветра – 0,38 кПа;
- вес снегового покрова – 1,00 кПа;
- сейсмичность района строительства – до 6 баллов.

Существующее положение

Согласно заключения о техническом состоянии строительных конструкций ограждения КГП на ПХВ «Психиатрическая больница п. Шульбинск» УЗ ВКО, г. Семей п. Шульбинск, ул. Прибрежная, 1, выявлено:

Ограждение сборное железобетонное, длинной 630,20 м.

Категория технического состояния ограждения психиатрической больницы соответствует IV категории (аварийное состояние конструкции).

Ограждение не соответствует требований безопасности: имеют место трещины, отход анкеров от пластин закладных деталей из-за коррозии в сварных швах; деформация закладных и соединительных элементов, нарушение стыков сборных элементов с взаимным смещением последних, значительные смещение опор, прогибы изгибаемых элементов при наличии трещин в растянутой зоне, выкрашивание бетона, искривление и значительная осадка отдельных участков ограждения, коррозия и местами разрывы, обнажение арматуры.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Ограждение

При выполнении капитального ремонта ограждения предусмотрены следующие виды работ:

- демонтаж сборного железобетонного ограждения;
- устройство сборного железобетонного ограждения, высотой 3,20 м.

Стойки, панели, фундаменты ограждения – сборные железобетонные, приняты по каталогу ТОО «ЖБК». Отметка низа фундаментов минус 0,50 м.

Относительная отметка 0,000 равна абсолютной отметки земли.

Доборные элементы ограждения приняты из силикатного кирпича СОРПо-М100/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М100, предусмотрено

армирование кирпичной кладки арматурной сеткой из стержней класса Вр1, через 3 ряда кладки по высоте. Фундаменты под ограждение из кирпича - ленточные бетонные, из бетона класса В12,5F75. Отметка низа фундаментов минус 0,50 м.

В основании фундаментов ограждения предусмотрена щебеночная подушка толщиной 200 мм по уплотненному грунту, коэффициент уплотнения 0,95.

- по периметру ограждения предусмотрено устройство калиток и ворот.

Калитка: стойки – металлическая труба по ГОСТ 10704-91, полотно – из металлического уголка по ГОСТ 8509-3, профлиста по ГОСТ 2404594.

Ворота – металлические по серии 3.017-3.

Фундаменты под раму ворот и стойки калитки - монолитные бетонные, из бетона класса В12,5F75. Отметка низа фундаментов минус 1,10 м.

В основании фундаментов предусмотрена щебеночная подушка толщиной 200 мм по уплотненному грунту, коэффициент уплотнения 0,95.

Контрольно-пропускной пункт (КПП)

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости - II.

Проектируемое здание кирпичное, одноэтажное прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 2,50х2,40 м. Высота этажа 2,30 м (от пола до низа несущих конструкций).

Конструктивная схема здания – поперечно-стеновая, пространственная конструктивная система из несущих кирпичных стен, объединенных для совместной работы горизонтальными дисками покрытий, воспринимает всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок.

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* по железобетонной подушке, толщиной 300 мм, из бетона класса В15, армированная сетками из арматуры класса Вр1. Отметка низа фундаментов минус 1,55 м.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола КПП.

В основании фундаментов предусмотрена подушка из щебня, толщиной 500 мм по грунтовой подушке, толщиной 1,00 м, уплотненной до коэффициента 0,95.

Стены – из керамического полнотелого кирпича марки Кр-р-по-250х120х65/1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 380 мм. Значение временного сопротивления кирпичной кладки осевому растяжению по неперевязанным швам для стен не менее 120 кПа (1,2 кгс/см^2).

С наружной стороны кирпичные стены предусмотрены с утеплением минераловатными плитами ПТЭ-150, толщиной100 мм с последующей штукатуркой по сетке.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Покрытие – сборные плоские железобетонные плиты по серии ИИ 03-02.

Двери – металлопластиковые, индивидуального изготовления.

Окна – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом, индивидуального изготовления.

Внутренняя отделка: потолок – затирка, водоэмульсионная покраска, стены – штукатурка, водоэмульсионная покраска.

Полы – линолеум.

Наружная отделка: стены – штукатурка с окраской фасадной краской; цоколь – штукатурка с окраской фасадной краской.

Кровля – плоская, рулонная, односкатная. В качестве утеплителя покрытия приняты минераловатные плиты ПТЭ-150, толщиной 130 мм.

Водосток - наружный неорганизованный.

В проекте учтены мероприятия по энергосбережению, в соответствии с требованиями СН РК 2.04-01-2009.

Для отвода от фундамента дождевых и талых вод, вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм.

Таблица 1

Основные показатели по разделу архитектурно-строительные решения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество
Контрольно-пропускной пункт (КПП)			
1	Площадь застройки	кв.м	9,16
2	Общая площадь	кв.м	4,96
3	Строительный объем	куб.м	25,42

Антикоррозионные мероприятия назначены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004. Горизонтальная гидроизоляция – из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. Металлические конструкции предусмотрено окрасить лакокрасочным покрытием (двумя слоями эмали по слою грунтовки).

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование

Отопление и вентиляция

Рабочий проект отопления и вентиляции пропускного пункта разработан на основании задания на проектирование, в соответствии с СНиП РК 4.02-42-2006 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Отопление контрольно-пропускного пункта предусмотрено электрическое.

Источник теплоснабжения – теплофоны ЭРГНА 0,7 и ЭРГНА 0,3.

Вытяжка из помещения - естественная через форточки и дверь.

Приток неорганизованный через фрамуги окон и через дверь.

Таблица 2

Основные показатели по разделу ОВ

Наименование здания	Период года при tн, °С	Расход тепла, Вт				Расход холода, Вт	Установ. мощность эл.двиг., кВт
		на отопление	на вентиляцию	на ГВС	общий		
КПП	- 38°	1550	-	-	1550	-	-

Электротехнические решения

Раздел проекта электротехнические решения по обеспечению электрической энергией объектов - контрольно-пропускных пунктов (КПП) № 1 и № 2, запроектирован на основании задания на проектирования в соответствии нормативно - техническим документам.

Электроприемники КПП относятся к III категории по надежности и обеспечиваются одним источником питания, от резервных автоматических выключателей существующих щитов № 1 здания психиатрической больницы запитан шкаф распределительный (ШР) КПП № 1, щита № 3 – ШР КПП № 2. Электроснабжение принято кабелем ВВГ 5х6

проложенным от выхода из здания до забора в трубе ПНД в траншее, по забору в металлической гофротрубе с креплением скобами до КПП.

Шкаф ШР предусмотрен в комплекте с автоматическим выключателями модульного исполнения и с УЗО 30 мА в металлическом щите встроенного исполнения на 12 модулей.

Силовым электрооборудованием КПП представлены розеточные сети, теплофоны и привод ворот. Групповую силовую сеть от ШР принято проложить скрыто в штрабах стен кабелем ВВГ 3х2,5 мм2.

Электроосвещение в КПП представлено рабочим и аварийным освещением. Для рабочего освещения применены светильники с люминесцентными и компактно люминесцентными лампами, для аварийного – светильник со светодиодной лампой с дополнительным независимым источником питания в соответствии с характеристиками помещения.

Групповую осветительную сеть от ШР принято проложить скрыто в штрабах стен кабелем ВВГ 3х1,5 мм2.

Линии групповой сети выполнены 3-х проводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - PE). В системе предусмотрены меры основной и дополнительной защиты от поражения электрическим током при прямом и косвенном прикосновениях. Принята система заземления TN-S и устройство защитного отключения с током утечки 30мА.

Таблица 3

Основные технические показатели

Показатель	Ед. изм.	Значение	
		КПП № 1	КПП № 2
Категория надежности электроснабжения		III	
Напряжение питающей сети	В	380/220	
Установленная мощность	кВт	2,3	
Расчетная мощность	кВт	2,07	
Расчетный ток	А	9,4	
Протяженность распределительной электропроводки	м	102,3	91,2

Системы связи и сигнализации

Пожарная сигнализация

Рабочий проект запроектирован на основании задания на проектирование утвержденного заказчиком.

Система пожарной сигнализации относиться к I категории по надежности электроснабжения, соответственно обеспечивается двумя взаиморезервируемыми источниками питания. Основной источник питания - электрическая сеть, резервный источник питания – аккумуляторная батарея. Переключение на резервное питание предусмотрено автоматическое.

В качестве прибора охранно-пожарной автоматики принят прибор "Гранит-2". Прибор запроектировано установить в КПП №1 и КПП № 2.

В качестве пожарных датчиков приняты ручные пожарные извещатели и дымовые пожарные извещатели. Ручные пожарные извещатели предусмотрено установить на высоте 1,5 м от уровня пола, дымовые пожарные извещатели установить на потолке, с учетом контроля всей защищаемой площади.

Сеть пожарной сигнализации запроектирована проводами марки КСВВ 4х0,5, КСВВ 2х0,5 и ПВС 2х1,5.

Шлейфы пожарной сигнализации приняты с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.

Проектом принято система оповещения о пожаре и эвакуации 1 типа в соответствии приложения Б, таблица 2 СН РК 2.02-11-2002. 1 тип системы оповещения включает звуковое оповещение эвакуации в комбинации со световым указателем «ВЫХОД».

Включение сигнального устройства, световых указателей и звукового оповещения о пожаре предусмотрено при срабатывании пожарных извещателей.

Прокладка кабеля в помещениях предусмотрена открытая в кабельном канале.

Аппаратура пожарной сигнализации и средств связи присоединена нулевой заземляющей жилой к сети заземления.

Система видеонаблюдения

Раздел видеонаблюдения проекта, запроектирован на основании задания на проектирование утвержденного заказчиком, в соответствии нормативно - техническим документам.

Проектом предусмотрено устройство наружного видеонаблюдения. В комплектацию системы видеонаблюдения входит:

- видеорегистратор;
- видеомонитор;
- видеокамера;
- блок питания.

Видеорегистратор, видеомонитор и блок питания запроектированы к установке в КПП № 1 и КПП № 2. Для видеонаблюдения использованы всепогодные камеры.

Сеть видеонаблюдения предусмотрено выполнить кабелем связи RG59. Прокладка кабеля в помещении и в наружной части до видеокамеры принято выполнить открыто в кабельном канале.

Предусмотрено КПП обеспечить телефонной двусторонней связью от здания психиатрической больницы путем воздушной прокладки телефонного провода ПРППМ 2х1,2 и устройством телефонного аппарата.

6.3 Организация строительства

Представлен расчет продолжительности строительства, выполненный в соответствии с пособием к СНиП РК 1.04.03-2008 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений. Срок производства работ составляет 3,0 месяца

Согласно письму № 01-806 от 18.08.2015 года определен срок начала строительства – апрель 2016 года.

6.4 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса Sana-2001 (версия 24-2.27) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-22;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-22;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы), согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет СН РК 8.02-02-2002);
- средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей и прогнозной сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2016 годов согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 03 декабря 2013 года № 148-V, на период 2017-2018 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 33 заседания РБК от 28 августа 2013 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих и прогнозных ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

Таблица 4

Основные показатели по сметной документации

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм	Количество
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	6,794
	в том числе:		
	СМР	млн. тенге	6,558
	обрудование	млн. тенге	0,091
	прочие затраты	млн. тенге	0,145
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015 – 2016 г. г.	млн. тенге	23,411
	в том числе:		
	СМР	млн. тенге	17,950
	оборудование	млн. тенге	0,250
	прочие затраты	млн. тенге	5,211

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности», Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра экономики РК № 165 от 28.02.2015 г., разработчиком проекта установлен II (второй) уровень ответственности.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011, СНиП РК 3.02-02-2009, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93. Рабочий проект разработан согласно утвержденному заданию на проектирование и другим исходным данным.

В соответствии с Указом Президента Республики от 27.01.09 г. № 733 о казахстанском содержании проектов, в проекте предусмотрено применение оборудования и изделий казахстанского производства.

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 и СН РК 8.02-02-2002.

В результате проведенной экспертизы рабочий проект дополнен необходимыми исходными данными и согласованиями, доработаны все разделы, откорректирована сметная стоимость строительства, определен срок начала строительства.

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по ВКО в рабочий проект «Капитальный ремонт ограждения с

устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГП на ПХВ «Психиатрическая больница поселка Шульбинск» УЗ ВКО» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-строительные решения

Пояснительная записка

1. Откорректирована, согласно исправленных чертежей, после замечаний экспертизы.

Альбом чертежей

Ограждение территории

Раздел АС/ГП

2. Общие данные, Лист АС/ГП-2, внесено:

- климатический подрайон – 1В;
- уровень ответственности - III.

3. Ограждение, Лист АС/ГП-4 – АС/ГП-6:

- марка кирпича принята по ГОСТ 379-2015;
- в примечании на листе АС/ГП-3 указано «в основании щебеночной подготовки предусмотреть уплотнение грунтов, до коэффициента 0,95»;
- предусмотрено усиление кирпичной кладки арматурной сеткой.

4. Спецификация элементов ограждения, Лист АС/ГП-7:

- стойка СТ1. Указана отметка земли, отметка низа фундамента.

5. Калитка, ворота, Лист АС/ГП-8:

- ворота приняты по серии 3.017-3;
- предусмотрены фундаменты под несущую раму ворот.

Контрольно-пропускной пункт

Раздел АС

6. Общие данные, Лист АС-2:

- марка кирпичной кладки принята по ГОСТ 530-2012.

7. Фасады, Лист АС-3:

- по осям 1 и 2 перемычки предусмотрены несущие, т.к. опираются плиты перекрытия;
- марка кирпичной кладки принята по ГОСТ 530-2012.

8. Разрезы, Лист АС-4:

- разрез 1-1. Указан состав крыльца входа;
- разрез 1-1. Утеплитель принят 150 мм, Биполь ХПП принят 3 слоя, согласно табл. 4 СНиП РК 3.02-06-2009.

9. Схема расположения фундаментов, Лист АС-5:

- в основании фундамента: 1) предусмотрена грунтовая подушка толщиной 1,00 м уплотненная до коэффициента 0,95, 2) подушка из щебня толщиной 500 мм, уплотненная до коэффициента 0,95;
- плиты покрытия связаны с кирпичной кладкой анкерами.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование

Отопление и вентиляция

Пояснительная записка

10. Пояснительная записка приведена в соответствие с рабочим проектом.

Альбом чертежей

11. Выполнина таблица «Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ» согласно ГОСТ 21.602-2003 п.5.9.

Электротехнические решения

12. Откорректировано сечение кабелей согласно подключаемым нагрузкам.
13. Добавлено аварийное освещение.
14. В проекте учтено казахстанское содержание.

Системы связи и сигнализации

15. На плане сети АПС указан ручной извещатель.
16. Добавлены в спецификацию оборудования источник бесперебойного питания, приемно-контрольный прибор и звуковое сигнальное устройство.
17. Представлена структурная схема видеонаблюдения.

Сметная документация

18. В соответствии с СН РК 1.02-03-2011 (приложение К), представлена сводная ведомость потребности материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком.
19. Сметная документация пересчитана с учетом изменений и дополнений к сборникам сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5, выпуски 1-22.
20. В соответствии с СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9 в сметный расчет стоимости внесены средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска.
21. В соответствии с СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9 в сметный расчет стоимости внесены средства на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами в следствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне.
22. Уточнены расценки на устройство ограждения в соответствии с СН РК 8.02-05-2002, сборник 7.

Таблица 5

Технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Примечание (+ увеличение, - уменьшение)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Протяженность ограждения	м	630,20	630,20	-
2	Общая площадь зданий (КПП)	кв.м	4,96x2	4,96x2	-
3	Строительный объем	куб.м	25,42x2	25,42x2	-
4	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	7,195	6,794	-0,401
4.1	в том числе СМР	млн. тенге	6,953	6,558	-0,395
4.2	оборудование		0,091	0,091	-
4.3	прочие затраты		0,151	0,145	-0,006

5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015 – 2016 г. г.	млн. тенге	24,495	23,411	-1,084
5.1	в том числе СМР	млн. тенге	19,030	17,950	-1,080
5.2	оборудование		0,250	0,250	-
5.3	прочие затраты		5,215	5,211	-0,004
	из них:				
	- 2015 г.;			1,838	
	- 2016 г.			21,573	
6	Продолжительность строительства	мес.	3,0	3,0	-

Примечание:

Снижение сметной стоимости произошло в результате корректировки расценок в соответствии с СН РК 8.02-05-2002 и приведения сметы в соответствие с проектными данными.

Общее снижение сметной стоимости составило 1,084 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГП на ПХВ «Психиатрическая больница поселка Шульбинск» УЗ ВКО»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Протяженность ограждения	630,20 м
Общая площадь зданий	9,92 кв. м
Строительный объем зданий	50,84 куб. м
Общая сметная стоимость строительства	
в базовых ценах 2001 года,	6,794 млн. тенге,
в том числе СМР	6,558 млн. тенге.
оборудование	0,091 млн. тенге.
прочие затраты	0,145 млн. тенге.
Общая сметная стоимость строительства	
в текущих и прогнозных ценах 2015-2016 г.г.	23,411 млн. тенге,
в том числе СМР	17,950 млн. тенге.
оборудование	0,250 млн. тенге.
прочие затраты	5,211 млн. тенге.
Продолжительность строительства	3,0 месяца

2. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ, рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГП на ПХВ «Психиатрическая больница п. Шульбинск» УЗ ВКО в соответствии с условиями договора от 10.09.2015 г. № 0305.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Шүлбі кентінің психиатриялық ауруханасы» ШЖҚ КМК аумағындағы екі бақылау-өткізу пунктері құрылғысы бар қоршауын күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтерге сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Қоршау ұзындығы	630,20	м
Ғимараттардың жалпы ауданы	9,92	шаршы метр
Ғимараттардың құрылыс көлемі	50,84	текше метр
2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	6,794	млн. теңге
соның ішінде: ҚМЖ	6,558	млн. теңге
жабдық	0,091	млн. теңге
басқада шығын	0,145	млн. теңге
2015-2016 ж.ж. ағымдағы және болжамдық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	23,411	млн. теңге
соның ішінде: ҚМЖ	17,950	млн. теңге
жабдық	0,250	млн. теңге
басқада шығын	5,211	млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	3,0	ай.

2. Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттама шешімінің 5 бөлімінің орындалу мақсатында тапсырысшыға, құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдар мен конструкцияларын барынша көп қолдану.

3. Бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмыстарына берілген кезде жұмыс жобаны бұл сараптаманың қорытындысымен сәйкестігіне тексеру керек.

4. Өндірістік жұмыстар басталмай тұрып жұмыс жоба 3 айдың ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиісті.

5. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2015 жылғы 10 қыркүйектегі № 0305 шарттың талаптарына сәйкес Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Шүлбі кентінің психиатриялық ауруханасы» ШЖҚ КМК кепілдік етеді.

Ф.И.О.	Должность	ЭЦП

Шушакова Т.А.	Эксперт	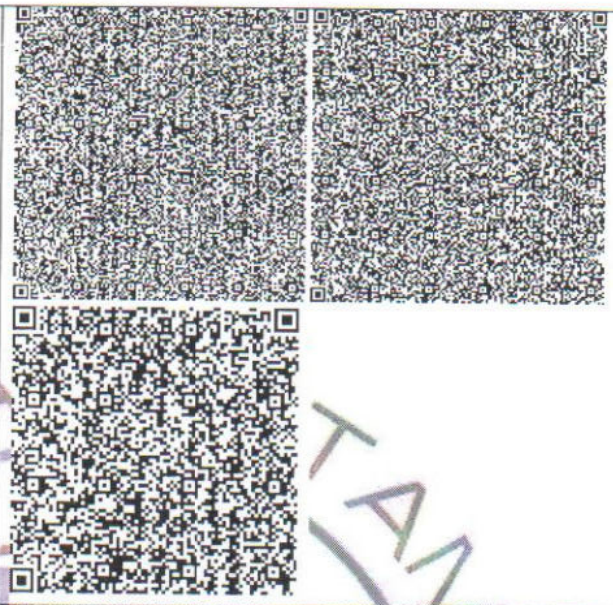
Мосиенко Т.Г.	Начальник производственного отдела	
Текеев С.Е.	Эксперт	

Абылханов М.К.	Эксперт	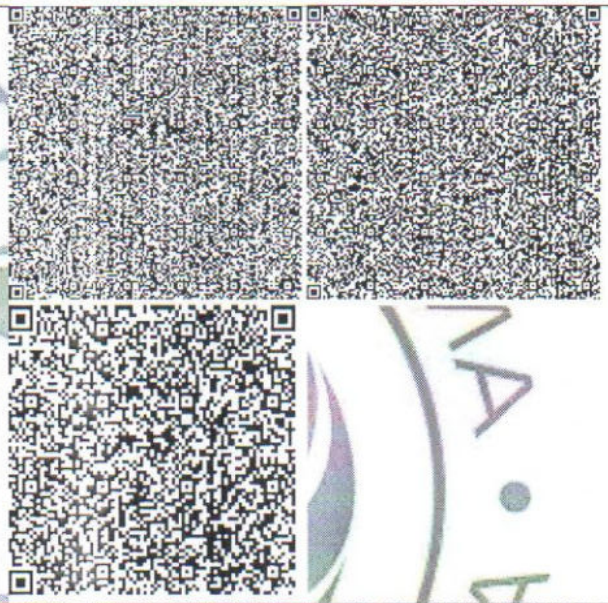
Игнатович Е.Ю.	Эксперт	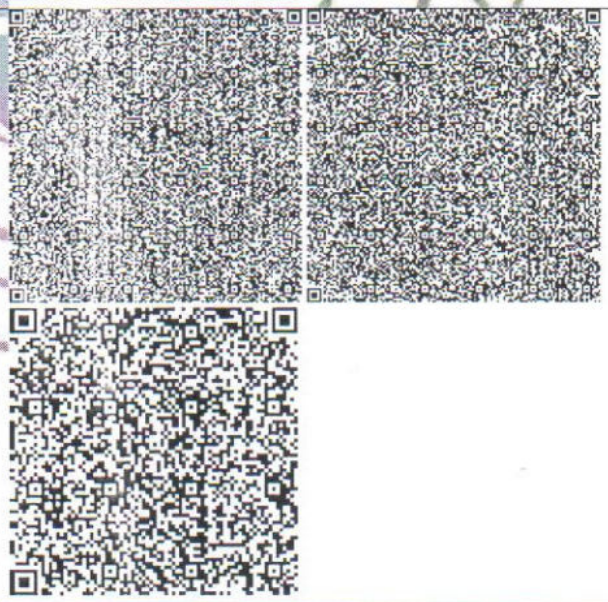

Бекітемін
«Мемсараптама» РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы
Директорының м.а.
Б.Я. Салимов

«Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Шүлбі кентінің психиатриялық ауруханасы» ШЖҚ КМК аумағындағы екі бақылау-өткізу пункттері құрылғысы бар қоршауын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша

14.10.2015 ж. № 06-0321/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі
денсаулық сақтау басқармасының
«Шүлбі кентінің психиатриялық ауруханасы» ШЖҚ КМК
Шүлбі кенті

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Восток Инжиниринг» ЖШС
Өскемен қаласы

Счет-фактура № 00000000013 от 26.08.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "B&B building" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:080340015315, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, ВАЛИХАНОВА, 100, 642, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: (2а)

ИИК поставщика: БИК ALMNKZKA ИИК KZ21826F1KZTD2002490 АО "АТФБанк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №432-2 от 06 июня 2016 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, Прибрежная , 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель:Коммунальное государственное казенное предприятие "Психиатрическая больница поселка Шульбинск" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970640000666, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, Прибрежная , 1 (10а)

ИИК получателя: БИК HSBKKZKX ИИК KZ026010261000035648 АО "Народный Банк Казахстана" (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории Заказчика	услуга	1	4 913 941	4 913 941	Без НДС		4 913 941		
Всего по счету:					4 913 941			4 913 941		

И.о.Директора по приказу №8 от 01.08.2016 года: Агеев С. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Психиатрическая больница поселка Шульбинск" управления** — **970640000666**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "B&B building" Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, ВАЛИХАНОВА, 100, 64** — **080340015315**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №432-2 от 06 июня 2016 года

Номер документа	Дата составления
13	26.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории Заказчика			услуга	1	4 913 941,00	4 913 941,00		4 913 941,00
				Итого	1	x	4 913 941,00		4 913 941,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Дроев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Джаксыбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2016

Заказчик : КГКП "Психиатрическая больница поселка Шульбинск УЗ ВКО"
Подрядчик : ТОО B&B bilding
Договор №432-2 от 06 июня 2016 года **Ф-3**
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"

СПРАВКА

стоимости выполненых работ за АВГУСТ месяц 2016 года

Наименование объекта : Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"

№ п/п	Наименование затрат	Выполнение с начала сезона, тенге	Выполнение за текущий месяц, тенге
1	2	3	4
1	Акт №1	4913941	4913941
2	Без НДС	0	0
3	Итого:	**4913941**	4913941
4	Аванс 0	0	0
5	Итого затраты подрядчика:	4913941	4913941
	Итого к оплате:	4913941	**4913941**

Заказчик:
Директор
КГКП Психиатрическая больница пос. Шульбинск УЗ ВКО

_____ Джаксыбеков М. А.

Подрядчик:
И. О. директора
ТОО B&B bilding

_____ Агеев С. Н.

форма № 2в

Заказчик : КГКП Психиатрическая больница поселка Шульбинск УЗ ВКО
Подрядчик : ТОО B&B bilding
Договор №432-2 от 06 июня 2016 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП" Психиатрическая больница п. Шульбинск" УЗ ВКО
Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП" Психиатрическая больница п. Шульбинск" УЗ ВКО

А к т № __1__

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2016 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость,тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих, ч/час не занят.обсл.	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.		Ед.	Всего
					Основн.з/п	в т.ч. з/п	Основн.з/п	в т.ч. з/п	%		
Локальная смета 2-1. Раздел 1 Землянные работы											
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн	м3	29,2	29,07	27,60	849	806	214	0,010210	0
		или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,47	6,95	43	203	87,00	0,024130	1
2	Е1-164-2	Разборка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений	м3	1	251,77		252	0	257	1,771000	2
		с откосами в группах 2 группы			251,77		252	0	102,00		0
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	м3	17,68	154,22		2727	0	2782	1,117800	20
		2 группы			154,22		2727	0	102,00		1
Локальная смета 2-1. Раздел 2 Фундамент											
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,12	2792,55	126,11	5920	267	427	0,977500	2
					142,31	47,81	302	101	106,00	0,225000	0
5	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	24	396,99	215,87	9528	5181	4928	0,547400	12
					87,72	75,27	2105	1806	126,00	0,296380	7
6	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	16	564,04	304,22	9025	4868	4622	0,768200	12
					122,91	106,34	1967	1701	126,00	0,421880	7
7	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из	м3	8,92	8213,00		73260	0	0		0
		тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78					0	0			0
8	Е6-1-20	Устройство монолитных участков	м3	0,48	7404,07	389,15	3554	187	298	3,243000	2
					507,15	147,01	243	71	95,00	0,718000	0
9	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов	м2	8,6	432,18	8,93	3717	77	263	0,164450	1
		в 1 слой рулонными материалами			25,42	3,35	219	29	106,00	0,016380	0
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхн.	м2	46,2	252,00	4,78	11642	221	2191	0,243800	11
		стен и фундаментов битумом в 2 слоя			42,95	1,80	1984	83	106,00	0,008750	0
Локальная смета 2-1. Раздел 3 Стены											
11	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	м3	9	7974,68	419,80	71772	3778	9180	5,221000	47
		из кирпича			804,71	157,50	7242	1418	106,00	0,762500	7
12	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	24	124,98	83,04	3000	1993	1731	0,170200	4
					27,43	29,82	658	716	126,00	0,131380	3
13	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 94884	м3	0,744	27211,00		20245	0	0		0

							0	0				0
Локальная смета 2-1. Раздел 4. Покрытие												
14	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	шт	4	984,59	250,96	3938	1004	2184	2 001000	8
					344,14	88,94	1377	356	126,00	0,381500	2
15	30-17-50.	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов пл.1600 кг/м3 т.16 см.норм.н 500 кг/м2	м2	11,52	2460,00		28339	0	0		0
							0	0			0
Локальная смета 2-1. Раздел 5. Кровля											
16	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	м2	13,96	105,07	1,24	1467	17	207	0,079810	1
					13,33	0,48	186	7	107,00	0,002250	0
19	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	13,96	186,87	19,93	2609	278	706	0,279450	4
					39,85	7,45	556	104	107,00	0,036380	1
20	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек к=15,000	м2	209,4	5,84	0,18	1223	38	43	0,001040	0
					0,13	0,06	27	13	107,00	0,000380	0
21	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	м2	13,96	476,99	22,91	6659	320	550	0,158700	2
					28,21	8,58	394	120	107,00	0,041880	1
22	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	15,86	598,34	1,55	9490	25	3000	1,117800	17,7
					176,21	0,59	2795	9	107,00	0,002880	0,0
23	Е9-61-10	Монтаж и изготовление козырька	т	0,20663	11267,24	2984,46	2328	617	1240	40,365000	8
					7038,00	369,29	1454	76	81,00	1,687500	0
25	1-1-907.	Швеллеры из гор.проката немерной длины нормальной точности прокатки из углеродистой стали кип.полуспок. №8-14	т	0,09577	70000,00		6704	0	0		0
							0	0			0
26	Е10-5-1	Установка обрешетки из брусьев	м3	0,08	19950,44	395,71	1596	32	360	25,875000	2
					4010,63	149,06	321	12	108,00	0,725000	0
27	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	6	722,08	10,38	4332	62	705	0,651250	4
					108,31	1,46	650	9	107,00	0,006000	0
28	Е15-37-9	Подшивка козырька профлистом	м2	11,8	1018,83	3,58	12022	42	3649	1,874500	22
					324,35	1,18	3827	14	95,00	0,005750	0
Локальная смета 2-1. Раздел 6. Полы											
29	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,92	121,51	3,28	1205	33	147	0,078320	1
					12,09	1,24	120	12	111,00	0,006000	0
30	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	0,6	6589,01		5271	0	579	4,209000	3
					652,05		522	0	111,00		0
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек	м2	9,92	246,88	12,44	2449	123	712	0,409400	4
					60,03	4,68	595	46	111,00	0,022750	0
Локальная смета 2-1. Раздел 7 Окна, двери											
34	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных глухих площадь проема до 2 м2	м2	6,792	6893,20	24,15	46819	164	1625	1,278920	9
					213,70	7,99	1451	54	108,00		0
Локальная смета №7--1-1. Общестроительные работы. Раздел 1 Демонтажные работы											
1	Е7-53-8 (ДМ)	Демонтаж ж/б секций ограждения	шт	58	361,58	228,38	20972	13246	17363	0,808000	47
					133,20	80,63	7726	4677	140,00	0,343040	20
Локальная смета №7--1-1. Общестроительные работы. Раздел 2 Монтажные работы											
3	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	м3	17,05	402,75		6867	0	7760	2,800000	48
					402,75		6867	0	113,00		0
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,8575	2748,77	100,89	16101	591	1120	0,850000	5
					123,75	38,25	725	224	118,00	0,180000	1

5	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,33	7292,94	95,97	9700	128	1128	4,900000	7
					771,75	36,25	1026	48	105,00	0,177100	0
6	Е6-11-6	Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона	т	0,04954	18837,97	11119,34	933	551	612	42,500000	2
					7560,00	4200,75	375	208	105,00	20,520000	1
7	8-6-79.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общ.назн прямошовные диам. 108 мм толщина стенки 4,0 мм	м	3,825	629,00		2406	0	0		0
							0	0			0
8	1-1-879.	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм нормально точности прокатки	т	0,00954	49389,00		471	0	0		0
							0	0			0
9	4-1-23.	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-111 диам. 10 мм	т	0,00076	53000,00		40	0	0		0
							0	0			0
10	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00592	81997,62	304,24	485	2	206	198,000000	1
					33075,00	114,75	196	1	105,00	0,560000	0
11	Е7-1-1	Укладка фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	шт	38	302,09	197,24	11479	7495	9170	0,652000	25
					104,85	67,51	3984	2565	140,00	0,249900	9
12	Е7-5-1	Установка стоек массой до 1 т в стаканы фундаментов зданий с глубиной заделки до 0,7 м	шт	38	1831,77	581,49	69607	22097	48505	4,140000	157
					713,25	198,49	27104	7543	140,00	0,729000	28
13	Е7-53-8	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2	шт	76	546,71	285,47	41550	21696	28440	1,010000	77
					166,50	100,79	12654	7660	140,00	0,428800	33
14	30-21-26.	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	м3	51,887	13700,00		710852	0	0		0
							0	0			0
		Добавляемые виды и объемы работ									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,2	29,07	27,60	849	806	214	0,010210	0
					1,47	6,95	43	203	87,00	0,024130	1
2	Е1-164-2	Разборка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в группах 2 группы	м3	1	251,77		252	0	257	1,771000	2
					251,77		252	0	102,00		0
3	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,12	2792,55	126,11	5920	267	427	0,977500	#ЗНАЧ!
					142,31	47,81	302	101	106,00	0,225000	0
4	Е6-1-20	Устройство монолитных участков	м3	5,52	7404,07	389,15	40870	2148	3430	3,243000	18
					507,15	147,01	2799	811	95,00	0,718000	4
5	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	м2	8,6	432,18	8,93	3717	77	263	0,164450	1
					25,42	3,35	219	29	106,00	0,016380	0
6	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхн. стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	18,6	252,00	4,78	4687	89	882	0,243800	5
					42,95	1,80	799	33	106,00	0,008750	0
7	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	м3	9	7974,68	419,80	71772	3778	9180	5,221000	47
					804,71	157,50	7242	1418	106,00	0,762500	7
8	Цена поставщика	Профиль квадратный 50х25 мм	т	0,12	59200,00		7104	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете:					**1378576**	**95518**			**857**
							146423	**28911**			**125**
		Стоимость строительно-монтажных работ					1378576				
		Накладные расходы					171557				
		Нормативная трудоемкость в н. р.									86
		Сметная заработная плата в н. р.						25734			
		Итого:					1550133				
		Ненормируемые непредвиденные затраты 6%					93008				

		Всего, стоимость строительно-монтажных работ					**1643141**					
		сметная з/плата						**201068**				
		нормативная трудоемкость										**1068**
		Итого:					**1643141**					
		Временные здания и сооружения 3,4%					**55867**					
		Итого:					**1699007**					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в змнее время 2,2%						**37378**					
		Затраты на выслугу лет, 1%					**16990**					
		Затраты на дополнительны отпуска, 04%					**6796**					
		Сметная стоимость в базовом уровне цен 2001 года					**1760172**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года					**4817590**					
		К=2,737										
		Налоги сборы и др.об.платежи, 2 %					**96352**					
		Итого:					**4913941**					
		Без НДС										
		Итого:					**4913941**					

Заказчик:
Директор
КГКП Психиатрическая больница пос. Шульбинск УЗ ВКО

_____ Джаксыбеков М. А.

Технический надзор
Директор
ТОО СпецСтройИнжиниринг

_____ Жаримбет С. С.

Подрядчик:
И. О. директора
ТОО B&B bilding

_____ Агеев С. Н.

Счет-фактура № 00000000018 от 09.09.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "B&B building" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:080340015315, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, ВАЛИХАНОВА, 100, 642, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: (2а)

ИИК поставщика: БИК ALMNKZKA ИИК KZ21826F1KZTD2002490 АО "АТФБанк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №432-2 от 06 июня 2016 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, Прибрежная , 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель:Коммунальное государственное казенное предприятие "Психиатрическая больница поселка Шульбинск" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970640000666, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, Прибрежная , 1 (10а)

ИИК получателя: БИК HSBKKZKX ИИК KZ026010261000035648 АО "Народный Банк Казахстана" (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории Заказчика	услуга	1	3 513 546	3 513 546	Без НДС		3 513 546		
Всего по счету:					3 513 546			3 513 546		

И.о.Директора по приказу №8 от 01.08.2016 года: Агеев С. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Психиатрическая больница поселка Шульбинск" управления** — **970640000666**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "B&B building" Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, ВАЛИХАНОВА, 100, 64** — **080340015315**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №432-2 от 06 июня 2016 года

Номер документа	Дата составления
18	09.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории Заказчика			услуга	1	3 513 546,00	3 513 546,00		3 513 546,00
				Итого	1	x	3 513 546,00		3 513 546,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Алеев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Дмитриев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.09.2016

М.П.

Заказчик : КГКП "Психиатрическая больница поселка Шульбинск УЗ ВКО"
Подрядчик : ТОО B&B bilding
Договор №432-2 от 06 июня 2016 года

Ф-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"

СПРАВКА

стоимости выполненых работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

Наименование объекта : Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"

№ п/п	Наименование затрат	Выполнение с начала сезона, тенге	Выполнение за текущий месяц, тенге
1	2	3	4
1	Акт №2	8427487	3513546
2	Без НДС	0	0
3	Итого:	**8427487**	3513546
4	Аванс 0	0	0
5	Итого затраты подрядчика:	8427487	3513546
	Итого к оплате:	3513546	**3513546**

Заказчик:
Директор
КГКП Психиатрическая больница пос. Шульбинск УЗ ВКО

Джаксыбеков М. А.

Подрядчик:
И. О. директора
ТОО B&B bilding

Атеев С. Н.

Заказчик : КГКП Психиатрическая больница поселка Шульбинск УЗ ВКО

форма № 2в

Подрядчик : ТОО B&B bilding

Договор №432-2 от 06 июня 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГП на ПХВ Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГП на ПХВ Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО

А к т № __2__

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2016 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость,тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих, ч/час не занят.обсл.	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.			
					Основн.з/п	в т.ч. з/п	Основн.з/п	в т.ч. з/п	%	Ед.	Всего
		Локальная смета 2-1. Раздел 6. Полы									
32	Е11-36-1	Устройство покрытия из линолиума на клее бустилат	м2	9,92	935,07	6,13	9276	61	766	0,439300	4
					67,28	2,31	667	23	111,00	0,011250	0
33	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	16,34	125,78	0,20	2055	3	339	0,103390	2
					18,61	0,09	304	1	111,00	0,000380	0
		Локальная смета 2-1. Раздел 7 Окна, двери									
35	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2	1,68	225,99	6,98	380	12	201	0,673900	1
					108,16	2,65	182	4	108,00	0,012880	0
36	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	5,66	2030,00		11490	0	0		0
							0	0			0
37	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	5,66	201,91	0,56	1143	3	248	0,261200	1
					40,86	0,09	231	1	107,00	0,000900	0
		Локальная смета 2-1. Раздел 8. Внутренняя отделка									
39	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей т. 3 мм	м2	10,28	220,91	4,93	2271	51	1165	0,636530	7
					117,43	1,68	1207	17	95,00	0,009110	0
40	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульс. составами по штукатурке и сбор.констр, подготов под окраску	м2	10,28	204,45	2,06	2102	21	283	0,177100	2
					28,21	0,79	290	8	95,00	0,003750	0
41	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором или цементным раствором	м2	24,6	189,44	5,08	4660	125	3675	0,851000	21
					156,03	1,21	3838	30	95,00	0,064630	2
42	Е15-65-1	Штукатурка по камню и бетону плоских оконных и дверных откосов	м2	14,5	374,55	7,91	5431	115	4995	2,058500	30
					359,66	2,99	5215	43	95,00	0,014630	0
43	Е15-180-1	Простая окраска стен и откосов поливинилацетатными в/э. составами по штукатурке и сбор.констр, подготов под окраску	м2	39,1	200,98	1,49	7858	58	973	0,158700	6
					25,62	0,56	1002	22	95,00	0,002750	0
		Локальная смета 2-1. Раздел 9. Наружная отделка									
46	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем (отмостка)	м2	23,6	121,51	3,28	2868	77	349	0,078320	2
					12,09	1,24	285	29	111,00	0,006000	0
47	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В3,5	м3	1,888	5423,79	82,51	10240	156	460	1,552500	3
					225,11	31,16	425	59	95,00	0,152250	0
48	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5	м3	0,708	5423,79	82,51	3840	58	172	1,522500	1

					225,11	31,16	159	22	95,00	0,152250	0
Локальная смета 2-1-2 Электроснабжение.											
1	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами масса 1 м до 0,5 кг	м	170	66,80	18,10	11356	3077	3892	0,120000	20
					20,30	3,80	3451	646	95,00	0,022000	4
2	16-1-1227	Кабели силовые нне распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,05	54398,00		2720	0	0		0
							0	0			0
3	16-1-1226	Кабели силовые нне распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,04	35536,00		1421	0	0		0
							0	0			0
4	16-1-1229	Кабели силовые нне распространяющие горение ВВГнг 3х6-1 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,08	133193,00		10655	0	0		0
							0	0			0
5	Е21-22-2	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	194,52		778	0	127	0,187000	1
					29,48		118	0	108,00		0
6	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	6	118,89		713	0	175	0,171000	1
					27,00		162	0	108,00		0
7	18-3-48.	Коробки ответительные пластмассовые тип У192, УХ Л 2	1000 шт	0,008	26100,00		209	0	0		0
							0	0			0
8	18-3-51.	Коробки ответительные стальные с полиэтиленовой крышкой степень защиты 1Р31 тип У197 УХЛ3	1000 шт	0,01	24200,00		242	0	0		0
							0	0			0
9	Е21-18-1	Монтаж светильников установливаемых на штырях, до 2х люминесцентных ламп	шт	2	244,37	65,36	489	131	402	0,946000	2
					151,65	34,45	303	69	108,00	0,156200	0
10	17-2-64.	Светильник для люминесцентных ламп тип ЛПО01Х2Х36-012 ГОСТ 17677-82	шт	2	741,00		1482	0	0		0
							0	0			0
11	17-6-90.	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74) тип ЛБ36 ЛД36 ЛДЦ36, ЛТБ 36, ЛХБ36	шт	2	101,00		202	0	0		0
							0	0			0
12	17-5-2.	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ8799-75) тип 2ОС-127	шт	4	17,00		68	0	0		0
							0	0			0
13	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крбках для пом.с нормальными условиями среды	шт	2	169,86	57,56	340	115	266	0,550000	1
					86,85	35,93	174	72	108,00	0,157000	0
14	17-1-129.	Светильник потолочный тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт	2	375,00		750	0	0		0
							0	0			0
15	17-6-62.	Лампы нергосберигающие (прим)	шт	2	184,00		368	0	0		0
							0	0			0
16	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	518,13	31,00	1036	62	878	2,300000	5
					393,75	12,29	788	25	108,00	0,060000	0
17	18-3-615.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 1Р31 тип ИЭК ГОСТ Р 51778-201	шт	2	993,00		1986	0	0		0
							0	0			0
18	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2х и 3х полюстных на ток до 25А	шт	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,400000	17
					236,25	1,15	2835	14	108,00	0,005600	0
19	18-1-340.	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика ГОСТ Р51231.1-2010	шт	4	113,00		452	0	0		0
							0	0			0
20	18-1-336.	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика ГОСТ Р51231.1-2010	шт	2	113,00		226	0	0		0
							0	0			0
21	18-1-747.	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 10А 30мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	6	513,00		3078	0	0		0
							0	0			0
22	8-10-264.	Шина нулевая на 8 групп (прим)	шт	4	135,00		540	0	0		0
							0	0			0

23	E21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания	шт	2	1985,55		3971	0	268	0,778000	2
					124,20		248	0	108,00		0
24	9-3-142.	Термолегулятор ТА-3	шт	2	2782,00		5564	0	0		0
							0	0			0
Локальная смета №7--1-1. Общестроительные работы. Раздел 2 Монтажные работы											
3	E1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	м3	17,05	402,75		6867	0	7760	2,800000	48
					402,75		6867	0	113,00		0
4	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,8575	2748,77	100,89	16101	591	1120	0,850000	5
					123,75	38,25	725	224	118,00	0,180000	1
5	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,33	7292,94	95,97	9700	128	1128	4,900000	7
					771,75	36,25	1026	48	105,00	0,177100	0
6	E6-11-6	Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона	т	0,04954	18837,97	11119,34	933	551	612	42,500000	2
					7560,00	4200,75	375	208	105,00	20,520000	1
7	8-6-79.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общ.назн прямошовные диам. 108 мм толщина стенки 4,0 мм	м	3,825	629,00		2406	0	0		0
							0	0			0
8	1-1-879.	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм нормально точности прокатки	т	0,00954	49389,00		471	0	0		0
							0	0			0
9	4-1-23.	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-111 диам. 10 мм	т	0,00076	53000,00		40	0	0		0
							0	0			0
10	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00592	81997,62	304,24	485	2	206	198,000000	1
					33075,00	114,75	196	1	105,00	0,560000	0
11	E7-1-1	Укладка фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	шт	38	302,09	197,24	11479	7495	9170	0,652000	25
					104,85	67,51	3984	2565	140,00	0,249900	9
12	E7-5-1	Установка стоек массой до 1 т в стаканы фундаментов зданий с глубиной заделки до 0,7 м	шт	38	1831,77	581,49	69607	22097	48505	4,140000	157
					713,25	198,49	27104	7543	140,00	0,729000	28
13	E7-53-8	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2	шт	76	546,71	285,47	41550	21696	28440	1,010000	77
					166,50	100,79	12654	7660	140,00	0,428800	33
14	30-21-26.	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	м3	51,887	13700,00		710852	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете:					**988716**	**56721**			**449**
							74816	**19333**			**79**
		Стоимость строительно-монтажных работ					988716				
		Накладные расходы					119654				
		Нормативная трудоемкость в н. р.									60
		Сметная заработная плата в н. р.						17948			
		Итого:					1108370				
		Ненормируемые непредвиденные затраты 6%					66502				
		Всего, стоимость строительно-монтажных работ					**1174872**				
		сметная з/плата						**112097**			
		нормативная трудоемкость									**589**
		Итого:					**1174872**				
		Временные здания и сооружения 3,4%					**39946**				
		Итого:					**1214817**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в змнее время 2,2%						**26726**				
		Затраты на выслугу лет, 1%					**12148**				
		Затраты на дополнительны отпуска, 04%					**4859**				

		Сметная стоимость в базовом уровне цен 2001 года					**1258551**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года					**3444653**					
		К=2,737										
		Налогъ. сборы и др.об.платежи, 2 %					**68893**					
		Итого:					**3513546**					
		Без НДС										
		Итого:					**3513546**					

Заказчик:
Директор
КГКП Психиатрическая больница пос. Шульбинск УЗ ВКО

_____ Джаксыбеков М. А.

Технический надзор
Директор
ТОО СпецСтройИнжиниринг

_____ Жаримбет С. С.

Подрядчик:
И. О. директора
ТОО B&B bilding

_____ Агеев С. Н.

Счет-фактура № 00000000020 от 25.10.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "B&B building"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:080340015315, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, ВАЛИХАНОВА, 100, 642, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: (2)

ИИК поставщика: БИК ALMNKZKA ИИК KZ21826F1KZTD2002490 АО "АТФБанк" (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №423-2 от 06 июня 2016 года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Восточно-Казахстанская область, Семей, п.Шульбинск, Прибрежная , 1 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Коммунальное государственное казенное предприятие "Психиатрическая больница поселка Шульбинск" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970640000666, Восточно-Казахстанская область, Семей. Шульбинск, Прибрежная , 1 (10а)

ИИК получателя: БИК HSBKKZKX ИИК KZ026010261000035648 АО "Народный Банк Казахстана" (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории Заказчика	услуга	1	7 473 059	7 473 059	Без НДС		7 473 059		
Всего по счету:					7 473 059			7 473 059		

И.о.Директора по приказу №8 от 01.08.2016 года: Агеев С. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
970640000666

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Психиатрическая больница поселка Шульбинск" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, Прибрежная , 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
080340015315

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "B&B building" Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, ВАЛИХАНОВА, 100, 64**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №423-2 от 06 июня 2016 года

Номер документа	Дата составления
20	25.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории Заказчика			услуга	1	7 473 059,00	7 473 059,00		7 473 059,00
				Итого	1	x	7 473 059,00		7 473 059,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Агеев
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2016

Заказчик : КГКП "Психиатрическая больница поселка Шульбинск УЗ ВКО"
Подрядчик : ТОО B&B bilding
Договор №423-2 от 06 июня 2016 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"

Ф-3

СПРАВКА

стоимости выполненых работ за НОЯБРЬ месяц 2016 года

Наименование объекта : Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"

№ п/п	Наименование затрат	Выполнение с начала сезона, тенге	Выполнение за текущий месяц, тенге
1	2	3	4
1	Акт №4	18967317	7473059
2	Без НДС	0	0
3	Итого:	**18967317**	7473059
4	Аванс 0	0	0
5	Итого затраты подрядчика:	18967317	7473059
	Итого к оплате:	7473059	**7473059**

Заказчик:
Директор
КГКП Психиатрическая больница пос. Шульбинск УЗ ВКО

Джаксыбеков М. А.

Подрядчик:
И. О. директора
ТОО B&B bilding

Агеев С. Н.

Заказчик : КГКП "Психиатрическая больница поселка Шульбинск УЗ ВКО"

форма № 2в

Подрядчик : ТОО B&B bilding

Договор №423-2 от 06 июня 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"

А к т № __4__

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2016 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость,тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих, ч/час не занят.обсл.	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.			
					Основн.з/п	в т.ч. з/п	Основн.з/п	в т.ч. з/п	%	Ед.	Всего
Локальная смета №2-1-3. Отопление.											
1	Ц8-104-1	Теплообменник, мощностью отводимого тепла до 30 кВт	шкаф	3	2432,00	497,00	7296	1491	4249	9,000000	27
					1537,00	110,00	4611	330	86,00	0,644000	2
2	99-2-1 (пл)	Тепловон 0,7 кВт	шт	2	3915,00		7830	0	0		0
							0	0			0
3	99-2-2 (пл)	Теплофон 0,3 кВт	шт	1	3034,00		3034	0	0		0
							0	0			0
Локальная смета №2-1-4. Слаботочные сети.											
1	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, свето звуковой	шт	4	457,50	1,60	1830	6	1573	2,000000	8
					437,00		1748	0	90,00		0
2	18-4-3199.	Извещатели пожарные дымовые модели ИП212-63 Данко (прим)	шт	4	712,00		2848	0	0		0
							0	0			0
3	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	2	4487,60	1,60	8975	3	7695	23,000000	46
					4275,00		8550	0	90,00		0
4	18-4-3240.	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт	2	3385,00		6770	0	0		0
							0	0			0
5	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	6	153,50		921	0	778	1,000000	6
					144,00		864	0	90,00		0
6	18-4-3128.	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт	4	499,00		1996	0	0		0
							0	0			0
7	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактн. на открывание окон, дверей	шт	2	195,70		391	0	320	1,000000	2
					178,00		356	0	90,00		0
8	18-4-3211.	Извещатели пожарные ручные модели ИПР513-10	шт	2	267,00		534	0	0		0
							0	0			0
9	18-2-11.	Коробка КК-8	шт	4	461,00		1844	0	0		0
							0	0			0
10	Ц8-409-1	Прокладка кабель-канала, труб	м	30	108,60	48,90	3258	1467	1476	0,220000	7
					39,60	12,20	1188	366	95,00	0,071000	2
11	8-4-1026.	Кабель-канал 20х16 (прим)	м	10	39,00		390	0	0		0

							0	0				0
12	8-4-1025.	Труба ПХВ диам.16 мм (прим)	м	20	27,00		540	0	0			0
							0	0				0
13	Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух и трехж.с разд.осн.по стенам и пот.проклад.по осн.бетон.и мет	м	36	73,70	1,30	2653	47	1908	0,330000		12
					58,70	0,20	2113	7	90,00	0,001000		0
14	Ц8-412-1	Затягивание проводов в прол.трубы и мет.рукава:провод перв в общей оплетке суммарное сечение до 2,5мм2	м	30	8,50	0,10	255	3	208	0,050000		2
					7,30		219	0	95,00			0
15	16-7-248.	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для передвиж. Марка ПВС сечение 2х1,5мм2	1000м	0,026	17400,00		452	0	0			0
							0	0				0
16	16-6-1902.	Кабель связи КСВВ 2х0,5 (прим)	км	0,02	37822,00		756	0	0			0
							0	0				0
17	16-6-1903.	Кабель связи КСВВ 4х0,5 (прим)	км	0,02	40282,00		806	0	0			0
							0	0				0
18	Ц10-172-4	Оборудование станции: аккумулятор ББП	шт	4	283,40		1134	0	1495	2,000000		8
					281,00		1124	0	133,00			0
19	99-3-3 (пл)	Аккумулятор 12В, 7 А\ч	шт	2	829,00		1658	0	0			0
							0	0				0
20	99-3-4 (пл)	Блок бесперебойного питания ББП-30 Элис	шт	2	1370,00		2740	0	0			0
							0	0				0
21	Ц10-350-22	Аппаратура цветного телевидидения: камера телевизионная передающая	шт	4	4209,80	27,80	16839	111	15671	19,000000		76
					3870,00	9,00	15480	36	101,00	0,053000		0
22	99-3-5 (пл)	Видиорегистратор РТХ	шт	2	4717,00		9434	0	0			0
							0	0				0
23	99-3-1 (пл)	Камера EW01F36IR	шт	2	1993,00		3986	0	0			0
							0	0				0
24	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	90	66,80	18,10	6012	1629	2061	0,120000		11
					20,30	3,80	1827	342	95,00	0,022000		2
25	99-3-2 (пл)	Кабель сигнальный КВТ-П-2-2х0,5	м	30	21,00		630	0	0			0
							0	0				0
26	16-6-35.	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные ТУ16.505.755-80 марка ПРППМ диам.жилы 1,2 мм	1000м	0,06	20800,00		1248	0	0			0
							0	0				0
27	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка абоненская	шт	2	107,30		215	0	200	1,000000		2
					99,00		198	0	101,00			0
28	18-1-839.	Розетка телефонная одноместная серии КВАРТА цвет белый модели РТ10-КБ тип ИЭК	шт	2	60,00		120	0	0			0
							0	0				0
Локальная смета №2-1-5. Технологическое оборудование.												
1	77-1-53	Стул полумягкий	шт	2	1505,00		3010	0	0			0
							0	0				0
2	77-1-52	Стол письменный однотумбовый	шт	2	9030,00		18060	0	0			0
							0	0				0
3	77-1-64	Шкаф для одежды	шт	2	15480,00		30960	0	0			0
							0	0				0
4	77-1-144	Лампа настольная	шт	2	846,00		1692	0	0			0
							0	0				0
5	77-1-131	Телефонный аппарат	шт	2	5600,00		11200	0	0			0
							0	0				0

6	77-1-113	Корзина для мусора	шт	2	97,00		194	0	0		0
							0	0			0
		Локальная смета №4-1-1. Сети электроснабжения.									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в группах 2 группы	м3	72	218,93		15763	0	17812	1,540000	111
					218,93		15763	0	113,00		0
2	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	200	36,70	27,80	7340	5560	2983	0,060000	12
					8,80	6,90	1760	1380	95,00	0,040000	8
3	30-8-92.	Песок природный	м3	12	1050,00		12600	0	0		0
							0	0			0
4	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВт в проложенных трубах, блоках и коробах масса 1 м до 1 кг	м	140	27,70	2,10	3878	294	2687	0,100000	14
					19,70	0,50	2758	70	95,00	0,003000	0
5	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплениями скобами, диам.до25мм	м	140	125,60	64,10	17584	8974	7608	0,260000	36
					41,40	15,80	5796	2212	95,00	0,093000	13
6	8-6-7.	Металлическая гофра 20х25 (прим)	м	140	104,00		14560	0	0		0
							0	0			0
7	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ прокпад по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворот. и в конце трассы мас.1м до 1кг	м	70	23,20	2,10	1624	147	1117	0,100000	7
					16,50	0,30	1155	21	95,00	0,002000	0
8	16-1-710.	Кабели силовые ВБбШв 5х6,0 (мк) -1 ГОСТ 16442-80	км	0,21	268977,00		56485	0	0		0
							0	0			0
9	1-1-2167.	Лента сигнальная "Осторожно кабели" (прим)	м	40	1240,35		49614	0	0		0
							0	0			0
10	8-4-2508.	Гильза из нержавеющей стали диам. 25х25 для металополимер труб СТ РК 1893-2009	шт	2	400,00		800	0	0		0
							0	0			0
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грцнтом 2 группы	м3	48	134,10		6437	0	7274	0,972000	47
					134,10		6437	0	113,00		0
12	Е21-22-12	Установка выключателей , переключателей пакетных 2-х и 3-х полюстных на ток до 25 А	шт	2	496,94	3,06	994	6	513	1,400000	3
					236,25	1,15	473	2	108,00	0,005600	0
13	18-1-604.	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р51327.-2010	шт	2	194,00		388	0	0		0
							0	0			0
		Локальная смета №7-1-1. Общестроительные работы									
2	Е7-25-2 (ДМ)	Демонтаж металлических ворот	шт	2	3293,05	1458,17	6586	2916	4893	7,560000	15
					1324,35	422,93	2649	846	140,00	1,641570	3
3	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	м3	17,05	402,75		6867	0	7760	2,800000	48
					402,75		6867	0	113,00		0
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,8575	2748,77	100,89	16101	591	1120	0,850000	5
					123,75	38,25	725	224	118,00	0,180000	1
5	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,33	7292,94	95,97	9700	128	1128	4,900000	7
					771,75	36,25	1026	48	105,00	0,177100	0
6	Е6-11-6	Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона	т	0,04954	18837,97	11119,34	933	551	612	42,500000	2
					7560,00	4200,75	375	208	105,00	20,520000	1
7	8-6-79.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общ.назн прямошовные диам. 108 мм толщина стенки 4,0 мм	м	3,825	629,00		2406	0	0		0
							0	0			0
8	1-1-879.	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм нормально точности прокатки	т	0,00954	49389,00		471	0	0		0
							0	0			0
9	4-1-23.	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-111 диам. 10 мм	т	0,00076	53000,00		40	0	0		0
							0	0			0

10	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00592	81997,62	304,24	485	2	206	198,000000	1
					33075,00	114,75	196	1	105,00	0,560000	0
11	Е7-1-1	Укладка фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	шт	-114	302,09	197,24	-34438	-22485	-27509	0,652000	-74
					104,85	67,51	-11953	-7696	140,00	0,249900	-28
12	Е7-5-1	Установка стоек массой до 1 т в стаканы фундаментов зданий с глубиной заделки до 0,7 м	шт	-114	1831,77	581,49	-208822	-66290	-145514	4,140000	-472
					713,25	198,49	-81311	-22628	140,00	0,729000	-83
13	Е7-53-8	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2	шт	-228	546,71	285,47	-124650	-65087	-85319	1,010000	-230
					166,50	100,79	-37962	-22980	140,00	0,428800	-98
14	30-21-26.	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	м3	51,887	13700,00		710852	0	0		0
							0	0			0
17	Е9-61-10	Монтаж и изготовление калитки К1	т	0,115	9752,34	2387,56	1122	275	664	35,100000	4
					6120,00	295,43	704	34	90,00	1,350000	0
18	1-1-899.	Прокат углово равнополочный, т.4-10 мм, ширина полки 60-100 мм немерной длины	т	0,06555	59200,00		3881	0	0		0
							0	0			0
19	1-1-886.	Прокат тонколистовой горячекатанный в листах толщиной 3,9 мм	т	0,0134	51027,00		684	0	0		0
							0	0			0
20	4-1-10.	Сталь арматурарная горячекатанная гладкая диам. 20 мм 22 мм	т	0,0038	49180,00		187	0	0		0
							0	0			0
21	Е9-47-1	Облицовка калитки стальным профилированным листом	м2	1,98	55,95	2,99	111	6	89	0,299000	1
					48,83	0,97	97	2	90,00	0,004700	0
22	1-1-434.	Настил профилированный оцинкованный Н57-825-0,7	м2	2,18988	1190,00		2606	0	0		0
							0	0			0
23	1-1-813.	Задвижка накладная	шт	2	142,00		284	0	0		0
							0	0			0
24	Е9-46-1	Монтаж и изготовление ворот	т	2,197	153717,47	17434,99	337717	38305	19929	41,400000	91
					7650,00	2428,67	16807	5336	90,00	8,150000	18
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,34	21,80	0,05	160	0	39	0,029500	0
					5,81	0,02	43	0	90,00	0,000100	0
26	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	14,68	19,64	0,02	288	0	41	0,016000	0
					3,13		46	0	90,00		0
Локальная смета №7-1-2. Электрооборудование для ворот.											
1	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	м	110	78,15	8,23	8597	905	8053	0,388000	43
					63,68	4,11	7005	452	108,00	0,018800	2
2	8-6-6.	Металлорукав диам. 15 мм (прим)	м	70	81,00		5670	0	0		0
							0	0			0
3	8-6-6.	Металлорукав диам. 10 мм (прим)	м	40	81,00		3240	0	0		0
							0	0			0
4	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металические рукава провода первого одножильного или многожильного в об.опл.	м	160	11,05	1,10	1768	176	1709	0,058100	9
					9,23	0,66	1477	106	108,00	0,002900	0
5	16-3-135.	Кабели контрольные марка КПГ число жил и сечение 2х1,5	м	0,03	229800,00		6894	0	0		0
							0	0			0
6	16-7-99.	Провода силовые для эл.установок на напряжение до 450 В с алюм.жилой ПВ1 сечением 2,5мм2	км	0,1	2683,00		268	0	0		0
							0	0			0
7	16-7-117.	Провода силовые для эл.установок на напряжение до 450 В с алюм.жилой ПВ1 сечением 2,5мм2	км	0,03	9081,00		272	0	0		0
							0	0			0
8	18-3-54.	Коробка протяжная тип У995 У2	шт	3	381,00		1143	0	0		0

							0	0				0
9	Ц8-524-13	Сборка из нескольких ящиков уст. На конструкциях в стене	ящик	1	875,00	45,00	875	45	351	2,000000		2
		рубильник, 2 блока предохранитель-выкллючатель на ток 100А			360,00	9,00	360	9	95,00	0,053000		0
10	75-6-309.	Устройство управления РУСМ М5411-2274 с автом.выключ.	шт	1	22118,00		22118	0	0			0
		на каждый фидер, фидер-1 номинал.ток 2А тепл.реле 1,6А					0	0				0
11	17-6-6.	Лампы биспиральные тип Б230-240-40	шт	1	34,00		34	0	0			0
							0	0				0
12	Ц8-538-1	Выключатель путевой или конечный рычажный общего назначен.	шт	2	410,30	16,30	821	33	504	2,000000		4
					263,00	2,30	526	5	95,00	0,013000		0
13	18-1-1595.	Выключатель путевой (конечный) ВПК2112 прим	шт	1	1440,00		1440	0	0			0
							0	0				0
14	18-1-1595.	Выключатель путевой ВПК2111 прим	шт	1	1440,00		1440	0	0			0
							0	0				0
15	Ц8-537-5	Командоаппарат кулачковый рег.со встр.редуктором	шт	1	581,30	23,30	581	23	379	2,000000		2
		уст.на метал.основании кол-во цепей до 2			394,00	4,50	394	5	95,00	0,026000		0
16	75-9-2.	Мотор-редуктор	шт	1	3987,00		3987	0	0			0
							0	0				0
17	1-1-778.	Цепь-звено общее 25 мм	т	0,003	193100,00		579	0	0			0
							0	0				0
18	1-1-59.	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,006	149300,00		896	0	0			0
							0	0				0
		Локальный расчет на добавляемые виды работ №2.										
9	Е15-61-3	Улучшенна штукатурка по камню и бетону стен цементно-из	м2	24,6	189,44	5,08	4660	125	3675	0,851000		21
		вестковым раствором			156,03	1,21	3838	30	95,00	0,064630		2
10	Е15-180-1	Простая окраска стен и откосов поливин.водоэмульсионными	м2	39,1	200,98	1,49	7858	58	972	0,158700		6
		составами по штукатурке и сборным констр.подг.к окр			25,62	0,56	1002	22	95,00	0,002750		0
11	Ц8-104-1	Теплообменник, мощностью отводимого тепла до 30 кВт	шкаф	3	2432,00	497,00	7296	1491	4249	9,000000		27
					1537,00	110,00	4611	330	86,00	0,644000		2
12	99-2-1	Теплофон 0,7 КВТ	шт	2	3915,00		7830	0	0			0
							0	0				0
13	99-2-2	Теплофон 0,3 КВТ	шт	1	3034,00		3034	0	0			0
							0	0				0
14	Е10-23-1	Установка блоков наружных внутренних дверных проемах	м2	3,42	9392,00	24,17	32121	83	621	0,959330		3
		в каменных стенах площ.проема до 3 м3			160,00	8,22	547	28	108,00	0,040130		0
15	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом - пеноплекс	м2	58,82	1489,13	7,88	87591	464	20	0,056000		3
					0,23	0,09	14	5	105,00	0,000400		0
16	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цем.изв раствором по камню стен	м2	58,82	184,57	1,96	10856	115	6754	0,611000		36
					108,90	0,45	6405	26	105,00	0,026200		2
17	Е12-14-2 прим	Устройствл уклона шлаком	м3	0,64	576,50	307,15	369	197	380	3,116500		2
					439,88	115,31	282	74	107,00	0,562500		0
		Локальный расчет на добавляемые виды работ №1.										
1	С143021-26	Панели град решетчатые, рельефные комбинированные	м3	6,649	13700,00		91091	0	0			0
		из тяжелого бетона класса В15					0	0				0
2	Е0107-24-1	Установка железобетонных град из панелей динной 4 м	м	612	593,64	379,53	363308	232272	250785	1,150000		704
					186,75	105,95	114291	64841	140,00	0,400000		245
3	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской диам.	м	616	687,23		423334	0	0			0

		159х4,5					0	0				0
		Итого прямые затраты по смете:					**2183836**	**144630**				**695**
		Стоимость строительно-монтажных работ					**109719**	**24094**				**95**
		Накладные расходы					2183836					
		Нормативная трудоемкость в н. р.					173587					
		Сметная заработная плата в н. р.										87
		Итого:						26038				
		Ненормируемые непредвиденные затраты 6%					2357423					
		Всего, стоимость строительно-монтажных работ					141445					
		сметная з/плата					**2498868**					
		нормативная трудоемкость						**159851**				
		Итого:										**877**
		Временные здания и сооружения 3,4%					**2498868**					
		Итого:					**84962**					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в змнее время 2,2%					**2583830**					
		Затраты на выслугу лет, 1%					56844					
		Затраты на дополнительны отпуска, 04%					**25838**					
		Сметная стоимость в базовом уровне цен 2001 года					**10335**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года					**2676848**					
		К=2,737					**7326532**					
		Налоги сборы и др.об.платежи, 2 %										
		Итого:					**146527**					
		Без НДС					**7473059**					
		Итого:					**0**					
							7473059					

Заказчик:
Директор
КГКП Психиатрическая больница пос. Шульбинск УЗ ВКО

_____ Джаксыбеков М. А.

Технический надзор
Директор
ТОО СпецСтройИнжиниринг

_____ Жаримбет С. С.

Подрядчик:
И. О. директора
ТОО B&B bilding

_____ Агеев С. Н.

Счет-фактура № 00000000019 от 03.10.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "B&B building"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:080340015315, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, ВАЛИХАНОВА, 100, 642, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: (2)

ИИК поставщика: БИК ALMNKZKA ИИК KZ21826F1KZTD2002490 АО "АТФБанк" (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №423-2 от 06 июня 2016 года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, Прибрежная , 1 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель:Коммунальное государственное казенное предприятие "Психиатрическая больница поселка Шульбинск" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970640000666, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, Прибрежная , 1 (10)

ИИК получателя: БИК HSBKKZKX ИИК KZ026010261000035648 АО "Народный Банк Казахстана" (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории Заказчика	услуга	1	3 066 771	3 066 771	Без НДС		3 066 771		
Всего по счету:					**3 066 771**			**3 066 771**		

И.о.Директора по приказу №8 от 01.08.2016 года: Агеев С. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Психиатрическая больница поселка Шульбинск" управления**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **970640000666**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "B&B building" Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А., г.Семей, ВАЛИХАНОВА, 100, 64**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080340015315

Договор (контракт) Договор №423-2 от 06 июня 2016 года

Номер документа	Дата составления
19	03.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории Заказчика			услуга	1	3 066 771,00	3 066 771,00		3 066 771,00
				Итого	1	x	3 066 771,00		3 066 771,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Алеев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / [подпись] / [подпись]
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2016

Заказчик : КГКП "Психиатрическая больница поселка Шульбинск УЗ ВКО"
Подрядчик : ТОО B&B bilding
Договор №423-2 от 06 июня 2016 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"

Ф-3

СПРАВКА

стоимости выполненых работ за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

Наименование объекта : Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП "Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО"

№ п/п	Наименование затрат	Выполнение с начала сезона, тенге	Выполнение за текущий месяц, тенге
1	2	3	4
1	Акт №3	16408199	3066771
2	Без НДС	0	0
3	Итого:	**16408199**	3066771
4	Аванс 0	0	0
5	Итого затраты подрядчика:	16408199	3066771
	Итого к оплате:	3066771	**3066771**

Заказчик:
Директор
КГКП Психиатрическая больница пос. Шульбинск УЗ ВКО

_____ Джаксыбеков М. А.

Подрядчик:
И. О. директора
ТОО B&B bilding

_____ Агеев С. Н.

Заказчик : КГКП Психиатрическая больница поселка Шульбинск УЗ ВКО **форма № 2в**

Подрядчик : ТОО B&B bilding

Договор №423-2 от 06 июня 2016 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО

Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения с устройством двух контрольно-пропускных пунктов на территории КГКП Психиатрическая больница п. Шульбинск УЗ ВКО

А к т № __3__

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2016 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость,тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих, ч/час не занят.обсл.	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.			
					Основн.з/п	в т.ч. з/п	Основн.з/п	в т.ч. з/п	%	Ед.	Всего
		Локальная смета №7--1-1. Общестроительные работы. Раздел 2 Монтажные работы									
3	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	м3	17,05	402,75		6867	0	7760	2,800000	48
					402,75		6867	0	113,00		0
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,8575	2748,77	100,89	16101	591	1120	0,850000	5
					123,75	38,25	725	224	118,00	0,180000	1
5	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,33	7292,94	95,97	9700	128	1128	4,900000	7
					771,75	36,25	1026	48	105,00	0,177100	0
6	Е6-11-6	Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона	т	0,04954	18837,97	11119,34	933	551	612	42,500000	2
					7560,00	4200,75	375	208	105,00	20,520000	1
7	8-6-79.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общ.назн прямошовные диам. 108 мм толщина стенки 4,0 мм	м	3,825	629,00		2406	0	0		0
							0	0			0
8	1-1-879.	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм нормально точности прокатки	т	0,00954	49389,00		471	0	0		0
							0	0			0
9	4-1-23.	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-111 диам. 10 мм	т	0,00076	53000,00		40	0	0		0
							0	0			0
10	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00592	81997,62	304,24	485	2	206	198,000000	1
					33075,00	114,75	196	1	105,00	0,560000	0
11	Е7-1-1	Укладка фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	шт	38	302,09	197,24	11479	7495	9170	0,652000	25
					104,85	67,51	3984	2565	140,00	0,249900	9
12	Е7-5-1	Установка стоек массой до 1 т в стаканы фундаментов зданий с глубиной заделки до 0,7 м	шт	38	1831,77	581,49	69607	22097	48505	4,140000	157
					713,25	198,49	27104	7543	140,00	0,729000	28
13	Е7-53-8	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2	шт	76	546,71	285,47	41550	21696	28440	1,010000	77
					166,50	100,79	12654	7660	140,00	0,428800	33
14	30-21-26.	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	м3	51,887	13700,00		710852	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете:					**870492**	**52559**			**321**
							52930	**18249**			**72**
		Стоимость строительно-монтажных работ					870492				
		Накладные расходы					96940				

		Нормативная трудоемкость в н. р.										48
		Сметная заработная плата в н. р.						14541				
		Итого:					967432					
		Ненормируемые непредвиденные затраты 6%					58046					
		Всего, стоимость строительно-монтажных работ					**1025477**					
		сметная з/плата						**85720**				
		нормативная трудоемкость										**442**
		Итого:					**1025477**					
		Временные здания и сооружения 3,4%					**34866**					
		Итого:					**1060344**					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%						**23328**					
		Затраты на выслугу лет, 1%					**10603**					
		Затраты на дополнительны отпуска, 04%					**4241**					
		Сметная стоимость в базовом уровне цен 2001 года					**1098516**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен 2016 года					**3006638**					
		К=2,737										
		Налоги сборы и др.об.платежи, 2 %					**60133**					
		Итого:					**3066771**					
		Без НДС					**0**					
		Итого:					**3066771**					

Заказчик:
Директор
КГКП Психиатрическая больница пос. Шульбинск УЗ ВКО

Джаксыбеков М. А.

Технический надзор
Директор
ТОО СпецСтройИнжиниринг

Жаримбет С. С.

Подрядчик:
И. О. директора
ТОО B&B bilding

Агеев С. Н.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 10 20 16 г.

Заказчик ЖГКП Поликлиническое Городищего поселка Шубаркол УЗКО
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО ПВВ bilding, директор Бородаев И.Б. ЗКО, г.Уральск, ул.Толстого 180/64,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО "ЗКОСтройИнжиниринг" директор Мухамедиев О.С.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО "Восток Инжиниринг" директор Бурмистров В.В.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт здания с уст. АСПЗ по тер. ЖГКП Поликлиника
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу ЗКО, п. Шубаркол, ул. Дружбы, 1,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего грава на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ВЗ № KZ24RDA00018963 от 12 июня 2015 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06 июня 2016 г.;

месяц, год

окончание работ 25 октября 2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3,7

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,7;

фактически, месяц: 3,7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных
четырехкомнатных
и более

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт железобетонного огражд. 624 м с устройством ворот 2 шт и 2 КПП

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 18 967,318 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 18 967,318 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18 967,318 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 18 967,318 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Кап. ремонт ограждения с устр. 2 КПП на терр. КПП ПСих. больница п. Шульбинск принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.
