Заказ № 64-26-09-2018

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

## Реконструкция и укрепление берега протоки р. Иртыш на территории «Левобережного профилактория управления делами акима ВКО» в г. Усть-Каменогорск

## **Акт технического обследования**

Алматы 2018 г.

Заказ № 64-26-09-2018

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

## Реконструкция и укрепление берега протоки р. Иртыш на территории «Левобережного профилактория управления делами акима ВКО» в г. Усть-Каменогорск

## **Акт технического обследования**

Директор
ТОО «Дирекция строящихся
Предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Жукенов Т.Т

Инженер по
техническому обследованию
ТОО «Дирекция строящихся
Предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Цимерман С.В.

Алматы 2018 г.

| | | |
|---|---|---|
| | | «Утверждаю» |
| | | Директор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»» |
| | | |
| | | «11» октября 2018 г |

# Акт обследования по объекту:

РП "Реконструкция и укрепление берега протоки р.Иртыш «Левобережного профилактория управления делами акима ВКО» в городе Усть-Каменогорск.

| Заключение по обследованию технического состояния объекта | |
|---|---|
| 1.Адрес объекта | г. Усть-Каменогорск |
| 2. Проектная организация, проектировавшая объект | ТОО «АзияИнжСтройПроект» |
| 3. Организация, проводившая обследование | ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» |
| 4. Время проведения обследования | С 10 по 12 октября 2018 года |
| 5.Описание общего состояния объекта | При обследовании существующего состояния протоки р. Иртыш выявлено:<br>- головное сооружение отсутствует, имеются две бетонные тумбы на которые опирается стойки и ригели забора<br>- существующий трубчатый переезд из 3-х труб Ø 1900 мм, находящегося в средней части территории профилактория, в удовлетворительном состоянии, требуется наращивание оголовков верхнего и нижнего бьефа трубы;<br>- имеется перекаты (в виде наносов из гравия и песка по дну на начальной части протоки), требуется очистка планировка дна;<br>- в концевой части русла протоки до выхода за заборы профилактория имеется две тумбы из монолитного ж/бетона, необходимо демонтировать и установить другие опоры под забор;<br>- древесные насаждения и кустарники в русле протоки и прибрежной зоны, которые препятствуют проведению строительных работ, корчёвка деревьев и кустарников возлагается проектной организации. |
| 6. Выводы по результатам обследования объекта | - Территория профилактория прилегающего к руслу протоки реки Иртыш в пределах 6-12 м обеих берегов подтапливается в период максимальных паводков;<br>- Произведен опрос обслуживающего персонала о горизонтах и уровня подтопления территории;<br>- Головную часть берега протоки р. Иртыш необходимо закрепить. Конструкцию возможного крепления будет выявлено в процессе проектирования на основании материалов инженерных изысканий (топографической съемки и геологии участка) с рассмотрением вариантов крепления<br>- Необходимо предусмотреть защитные сооружения выше на 0,3-0,5 м от существующей отметки диафрагмы трех очкового трубчатого переезда в средней части профилактория;<br>- Объемы работ по корчевке деревьев и кустарников из русло реки возлагается проектной организации совместно с заинтересованными организациями. |
| Приложения: | Фотографии объекта – 4 листа |

Рис.1 Головная часть Левобережной протоки р. Иртыш.

Вид с боку.

Рис.2 Головная часть Левобережной протоки р. Иртыш.

Вид с правого берега.

Рис.3 Головная часть Левобережной протоки р. Иртыш.
Вид с верхнего бъефа.

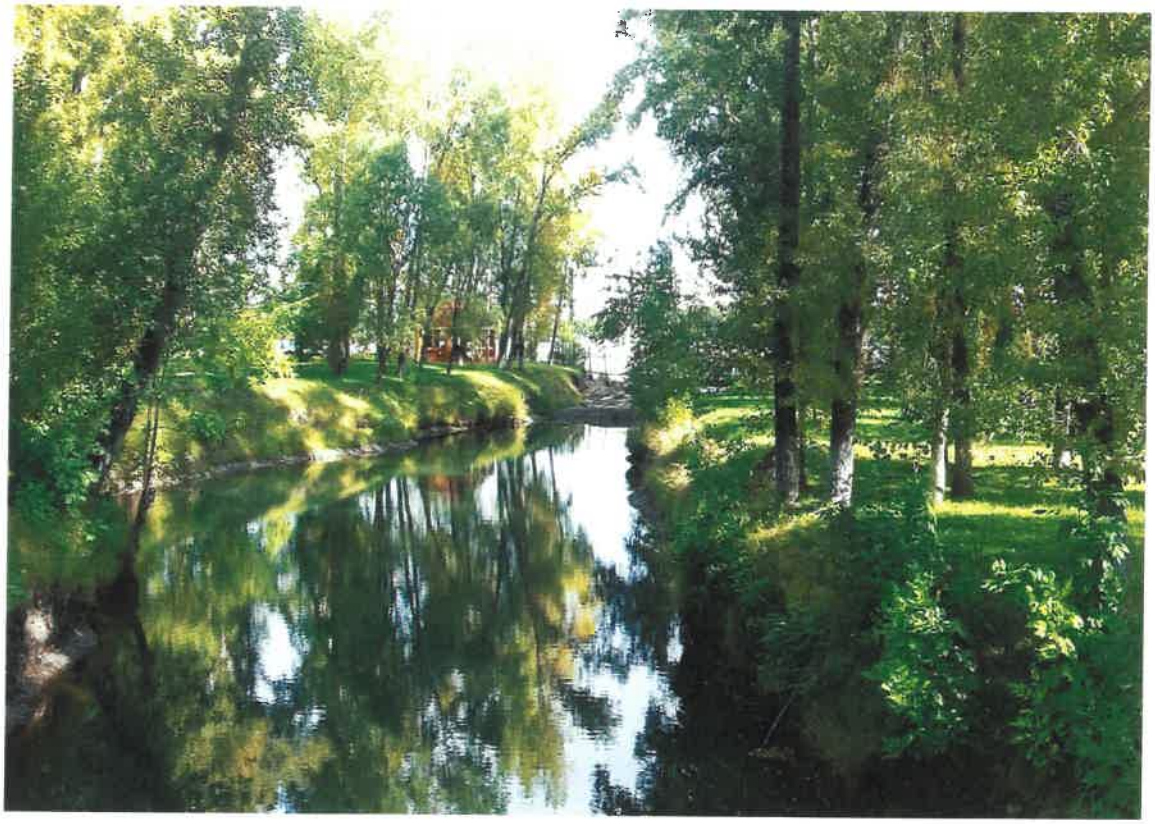

Рис.4 Левобережная протока р. Иртыш.
Русла протоки.

Рис.5 Существующий трубчатый переезд на ПК 1+03 р. Иртыш.

Рис.6 Выход из территории профилактории стойки забора.

Рис.7 Русла за пределами профилактория.

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

## АККРЕДИТАЦИЯ ТУРАЛЫ КУӘЛІК
## № 00002

Аккредиттация туралы осы куәлік
**«Құрылысшы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Тимирязев көшесі, 42 үй, корпус № 15/4**
бірінші және екінші жауапкершілік деңгейіндегі техникалық және технологиялық күрделі объектілердегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жүзеге асыру құқығына

**АККРЕДИТТЕЛДІ**
және уәкілетті органның тізіліміне енгізілді

Жарамдылық мерзімі 2020 жылғы «16» наурызға дейін.

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы**

**Астана қаласы**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
## № 00002

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано
**Товариществу с ограниченной ответственностью «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 42, корпус 15/4**
на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности

**АККРЕДИТОВАНО**
и внесен в реестр уполномоченного органа

Срок действия до «16» марта 2020 года.

**М. Жаныбетов**

**2018 жылғы «16» наурыз**

№ AZ 0000985
