Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

20__ жылғы "18" 11

Тапсырыс беруші "Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ 141200 Қазақстан, Екібастұз Қ.Ә., Энергетиктер, 62 басшы Оспанов Г.И.

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 2020 жылғы « 18 » 11 «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59» ЖШС Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, басшысы П.А. Раденков, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ-сы,Транспортная к.,1-құрылыс

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс – монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2020 жылғы « 18 » 11 , «Бестау-С» ЖШС, техникалық қадағалау сарапшысы Е.К.Шакимов, 2017 жылғы 24 ақпандағы № KZ96VJE00023301 аттестат

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2020 жылғы «18» 11 , «SOMET» ЖШС (мемлекеттік лицензия 27.06.2018 ж. № 18012798, басшысы - Р. В. Демин

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Павлодар облысы, Екібастұз қаласы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Екібастұз қаласының 9-шы шағын ауданында 9 қабатты алты тұрғын үйдің құрылысы. 10 кВ электрмен жабдықтау желілері»

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2019жылғы "06" желтоқсан№0000318«Екібастұзқаласыәкімдігініңжерқатынастарыбөлімі» ММ

жеручаскесінеқұқықтартуындайтын, өзгертілетіннемесетоқтатылатынзаңдықфактілердің (заңдыққұрамдарының) басталғанынрастайтынқұжат, оныңішіндешарттар, соттардыңшешімдері, атқарушыоргандардыңқұқықтықактілері, мұрагерліккеқұқықтуралықуәлік, меншікқұқығыменжеручаскесінеиеленгеннемесеуақытшаөтеуліжерпайдалану (жалдау) құқығынсатылғанмемлекеттікемесзаңдытұлғалардықайтаұйымдастырукезіндегітабыстауактісінемесебөлубалансыжеручаскесінеқұқықбелгілейтінқұжат

немесеқолданыстағығимараттардыңүй-жайларын (жекебөліктерін) реконструкциялау (қайтажоспарлау, қайтажабдықтау) туралы

_____

20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі;

шешімшығарғанорганныңатауы

2) қызметтінемесебелгілібіріс-қимылдыжүзегеасырабастағанынемесе тоқтатылғанытуралыхабарламанықабылдаутуралы«Павлодароблысыныңқалақұрылысыжәнежердібақылаубасқармасы» ММ 2020 жылғы 05маусымталоны;

хабарламақабылдағанұйымныңатауы, талонбергенкүні

3)«Екібастұзқаласыәкімдігініңқұрылысбөлімі» ММ 24.12.2019 жылғы №184бекітілгенжобаны

бекіткен (қайтабекіткен) ұйымныңатауыжәнебекітілгенкүні

ЖШС «SOMET», № 60-19 жоба (жобалау-сметалыққұжаттамасы) негізіндежүзегеасырылған.

жобалаушыұйымныңатауы, жобаныңнөмірі

2. Құрылыс-монтажжұмыстарымынадаймерзімдежүзегеасырылған:

жұмыстардыңбасталуы«маусым» 2020ж.;

айы, жылы

жұмыстардыңаяқталуы«қараша» 2020ж.;

айы, жылы

құрылыстыңұзақтығы, ай:

құрылыстыұйымдастырунормасыбойыншанемесежобасыбойынша1,5 ай;

нақты 6 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадайнегізгітехникалық-экономикалықкөрсеткіштерібар*(қуаттылық, өнімділік, өндірістікалаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізуқабілеттілігі, тасымалдауқабілеттілігі, жұмысорындарыныңсаныжәнесолсияқты)барлықобъектілер (тұрғынүйлерденбасқа) бойынша (нысаналыөнімдергенемесекөрсетілетінқызметтердіңнегізгітүрлерінесәйкесөлшембірліктеріментолтырылады):*

Қуаттылық, өнімділікжәнет.б.	Өлшембірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі	жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі
Общая протяженность КЛ-10кВ	м	4 600		4 600	
Общая протяженность траншеи КЛ	м	4 150		4 150	

Бастапқыкезеңдежобалыққуаттылықтардыигерунормаларынасәйкесжобадакөзделгенкөлемдеөнімшығару (қызметтеркөрсету) _____;

(көлемінкөрсетеотырып, өнімдердішығарудыңнақтыбасталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	*Жоба бойынша*	*Нақты*
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	*пәтер алаңы, $м^2$*		*пәтер саны*	*пәтер алаңы, $м^2$*	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі. төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

- Напряжение сети - 10кВ.,
- Категория надежности электроснабжения – II,
- Протяженность КЛ- 10кВ – 4,6 км.,

Выполнены работы:

-Строительство двух кабельных линий 10 кВ от сущ. ПС 35/10 кВ «Западная», «Центральная» до проектируемого пункта РП-10кВ;

-Переход методом прокола способом горизонтального бурения с устройством футляра из стальной прямошовной трубы улиц Абая, Торайгырова и т.д.;

-Монтаж соединительных и концевых муфт; - Монтаж шкафов КРУ-10 кВ (КСО-2-10);

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **72935,846** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **50864,981** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **68380,272** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **65642,261** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Екібастұздың 9-шы шағын ауданында 9 қабатты алты тұрғын үйдің құрылысы. 10 кВ электрмен жабдықтау желілері » пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші
" Екібастұз қаласы әкімдігінің
құрылыс бөлімі " ММ басшы _____ Г.И.Осپанов.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау
"Бестау - С" ЖШС
Техникалық қадағалау сарапшысы _____ Е.К.Шакимов
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау
"SOMET " ЖШС
Көшбасшы _____ Р.В.Демин
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)
"СМФ "Мехколонна № 59" ЖШС
Көшбасшы _____ П.А. Раденков
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
кабылдау актісіне
3-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеудегі әуе ӘБЖ...	километр (бұдан әрі – км)	
2	10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ...	км	
3	Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	**4,6**
4	Жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	
5	Тіректер ауданы	$м^2$	
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	
	4) темірбетон	дана	
	5) сымарканды аспалар	дана	
7	Сымдар:		
	1) мыс	км	
	2) алюминий	км	
	3) құрыш алюминий	км	
8	Шырактар үшін кронштейндер:		
	1) темірбетон	дана	
	2) металл	дана	
9	Көше жарығы арматурасы:		
	1) қызудыру шамы бар шырағданы	дана	
	2) сынап шамыды шырағданы	дана	
	3) люминесцентті шамдары бар шырағданы	дана	

10	Кәбілдер:		
	1) ААБл-10 кернеулі маркілер 10кВ	км	**4,6**
	2) ...кернеулі маркілер...	км	
11	Біріктіретін жалғастырғыштар	дана	**21**
12	Соңғы жалғастырғыштар	дана	**4**
13	Жерге қосу сұлбасы	дана	
14	Найзағайдан қорғау құрылғысы	дана	
15	Кәбіл желілерінің жол жабыны:		
	1) асфальтбетон	м ^{2}	
	2) жұмыр тас	м ^{2}	
	3) жаяужолдар	м ^{2}	
16	BB / TEL автоматты сөндіргішімен шығатын желілердің КРУ-10 кВ шкафы. ток күші 630 А, үзіліс тогы 25 кА. КСО-2-10	жабдық	**2**

Тапсырыс беруші
" Екібастұз қаласы әкімдігінің
құрылыс бөлімі " ММ басшы _____Г.И Оспанов.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау
"SOMET " ЖШС
Көшбасшы _____Р.В.Демин
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

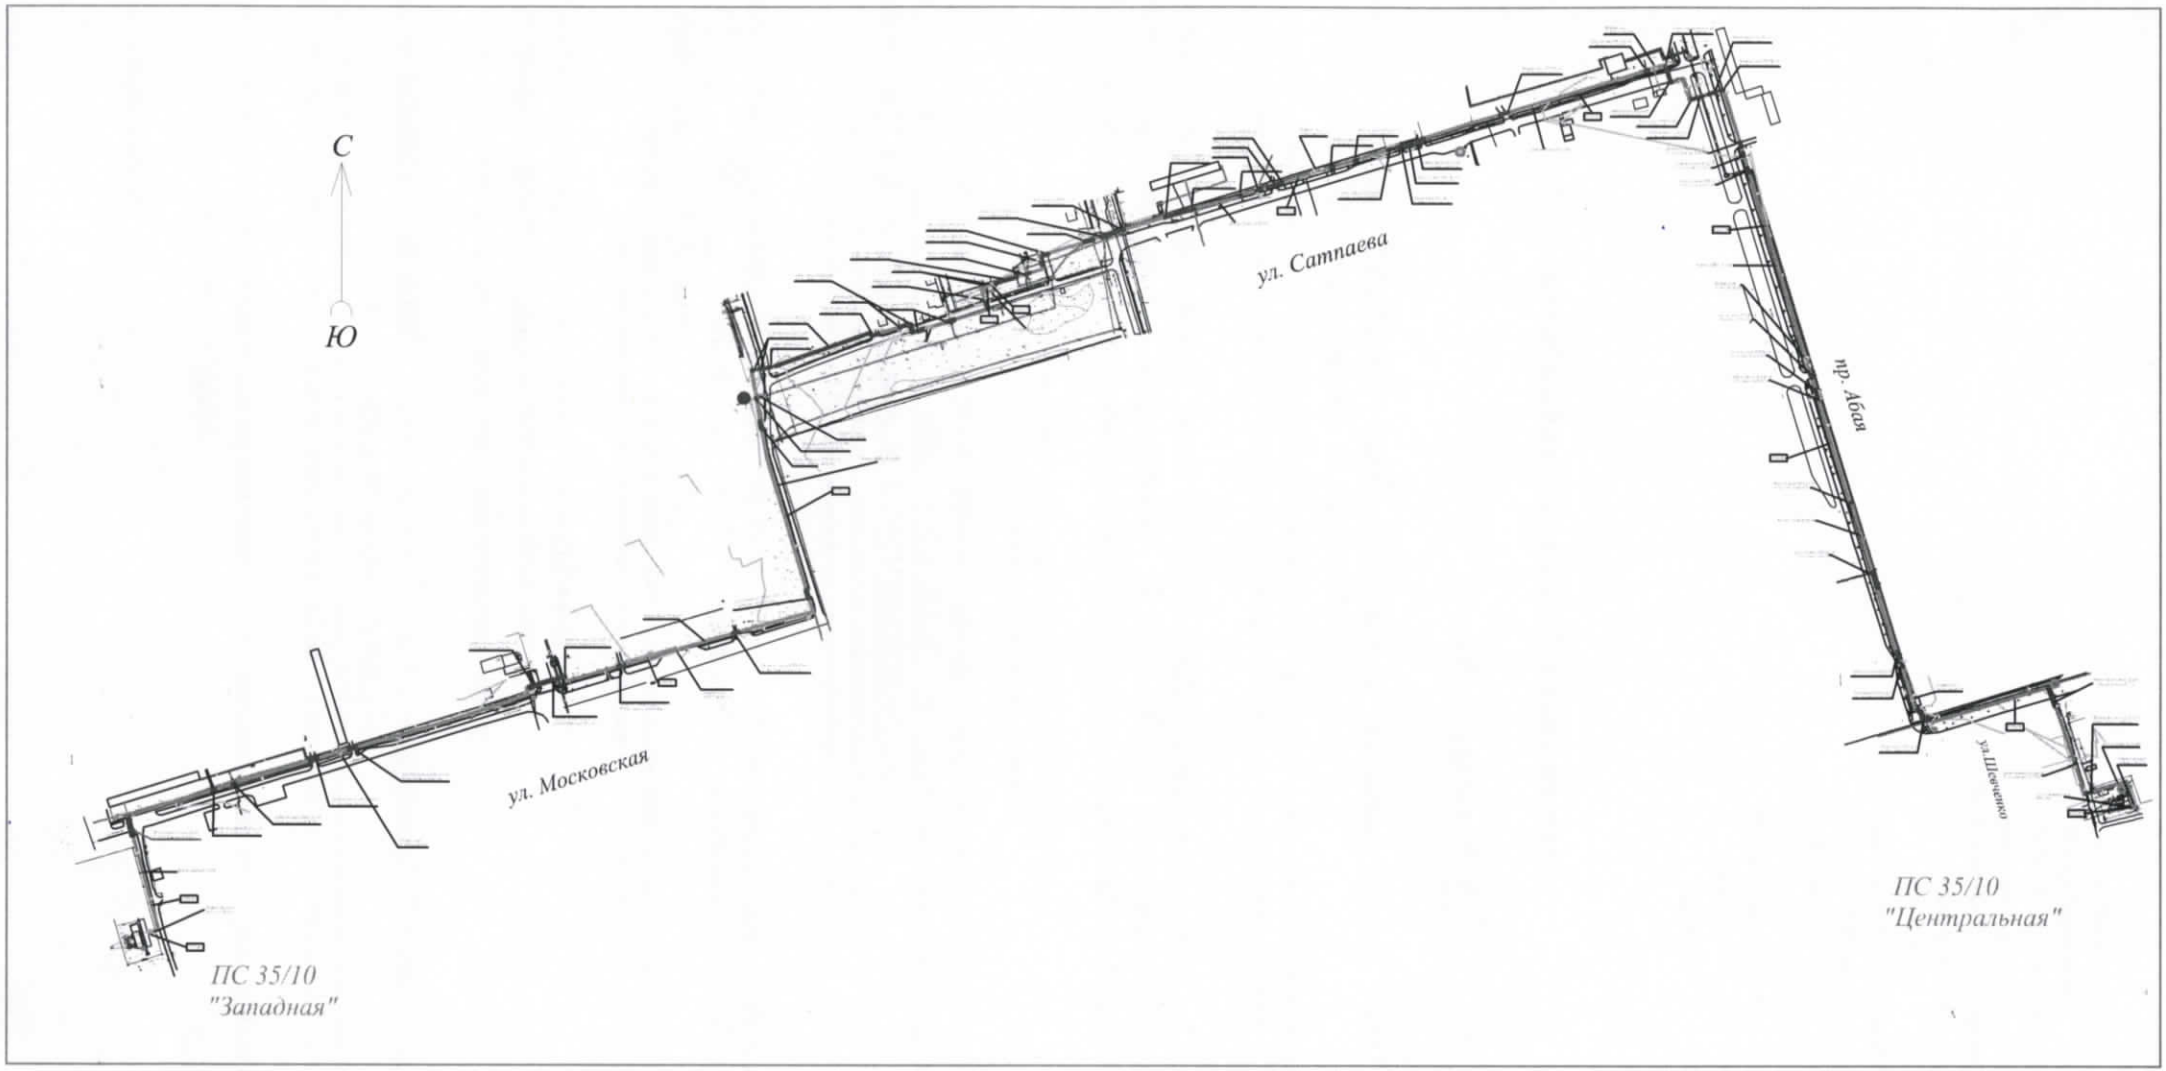
С
Ю
ул. Сатпаева
пр. Абая
ул. Шевченко
ул. Московская
ПС 35/10
"Центральная"
ПС 35/10
"Западная"

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" 11 20__ года.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" 141200 Казахстан, Экибастуз Г.А.,Экибастуз Г.А., Энергетиктер, 62 руководитель Оспанов Г.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «18» 11 2020 года, ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59 », руководитель П.А. Раденков, Республика Казахстан, Павлодарская область,г. Павлодар, ул.Транспортная, строение 1,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «18» 11 2020 года, ТОО "Бестау - С", эксперт технического надзора Е.К.Шакимов, аттестат № KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «18» 11 2020 года, ТОО "SOMET" (государственная лицензия от 27.06.2018г. № 18012798, Директор - Р.В.Демин,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне города Экибастуза. Сети электроснабжения 10 кВ»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, г. Экибастуз,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "6" декабря 2020 года №0000318 ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Экибастуза»

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты

исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупившихправо временного возмездногоземлепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области» KZ16REA00177897 от 05.06.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «SOMET», Проект № 60-19

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» № 184 от 24.12.2019 год;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «Июнь» 2020 года;

месяц, год

окончание работ: «Ноябрь» 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 мес.;

фактически, месяц: 6 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность КЛ-10кВ	м	4 600		4 600	
Общая протяженность траншеи КЛ	м	4 150		4 150	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	*Площадь квартир, м2*		*Число квартир*	*Площадь квартир, м2*	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- Напряжение сети - 10кВ.,
- Категория надежности электроснабжения – II,
- Протяженность КЛ- 10кВ – 4,6 км.,

Выполнены работы:

-Строительство двух кабельных линий 10 кВ от сущ. ПС 35/10 кВ «Западная», «Центральная» до проектируемого пункта РП-10кВ;

-Переход методом прокола способом горизонтального бурения с устройством футляра из стальной прямошовной трубы улиц Абая, Торайгырова и т.д.;

-Монтаж соединительных и концевых муфт; - Монтаж шкафов КРУ-10 кВ (КСО-2-10).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **72935,846** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **50864,981** тысяч тенге.

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **68380,272** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **65642,261** тысяч тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г. Экибастуза. Сети электроснабжения 10 кВ » **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" _____Г.И Оспанов.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор.
ТОО "Бестау - С"
Эксперт технического надзора _____Е.К.Шакимов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "SOMET "
Директор _____Р.В.Демин
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "СМФ "Мехколонна № 59"
Генеральный директор _____П.А. Раденков
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	*Наименование*	*Единица измерения*	*Количество*
1	*2*	*3*	*4*
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	**4,6**
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		

	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки ААБл-10 напряжением 10кВ	км	**4,6**
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные ЗСТП-10-70/120(Б)	шт	**21**
12	Муфты концевые 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт	**4**
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	
16	Шкаф КРУ-10 кВ отходящих линий с выключателем ВВ/TEL на ном. ток 630 А, ток отключения 25 кА. КСО-2-10.	компл	**2**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства
акимата города Экибастуза"
Руководитель отдела _____ Г.И. Оспанов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "SOMET "
Директор _____ Р.В.Демин
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

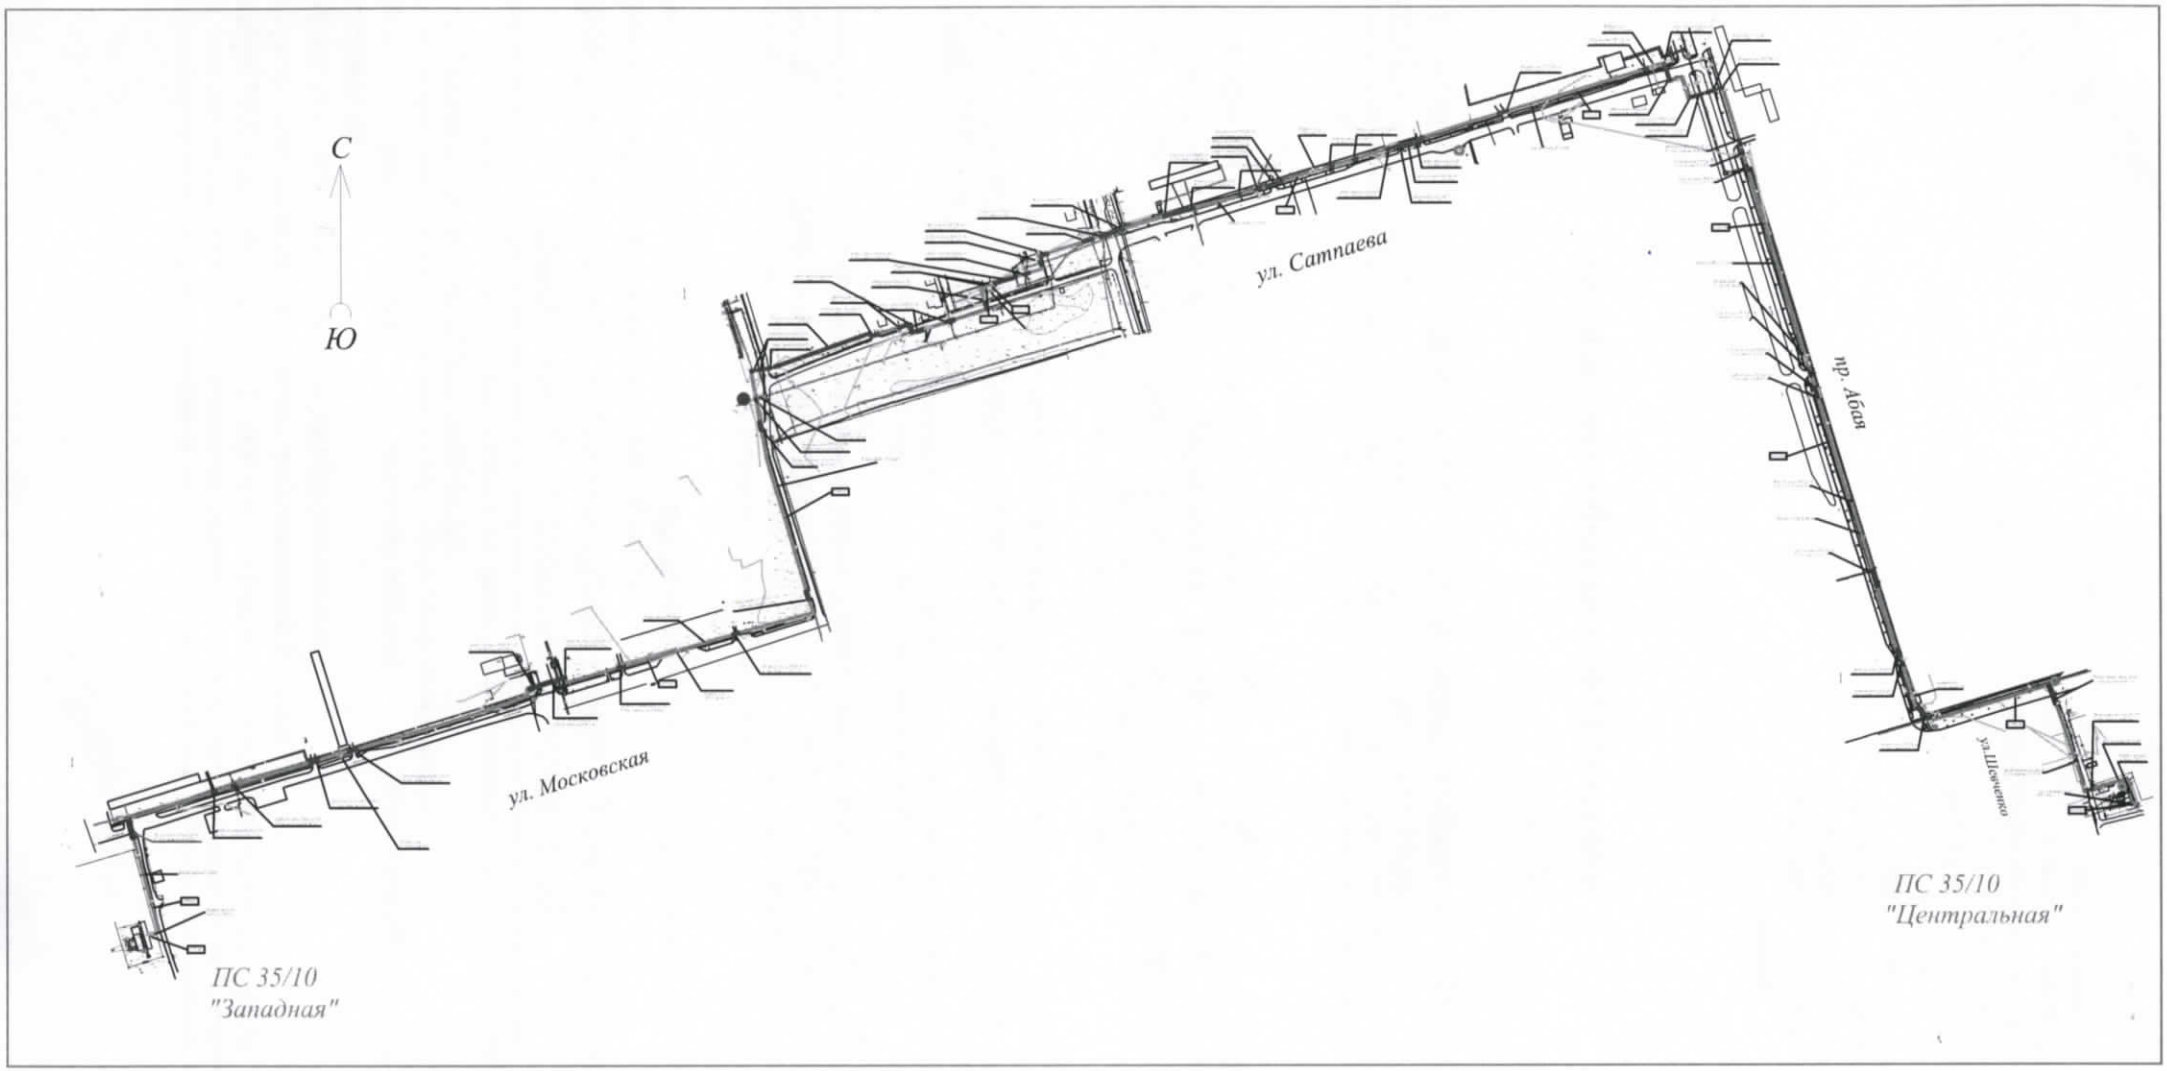
С
Ю
ул. Сатпаева
пр. Абая
ул. Московская
ул. Шевченко
ПС 35/10
"Западная"
ПС 35/10
"Центральная"

«ЖКМТ» АЖ ЖҰТПАҒАН

Орындаушы Костюк Е.В
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2020 ж. «25» ноября

( ) парақта тігілген
Нөмірленген, мөрмен бекітілді
Қолы
Прошито, пронумеровано скреплено
Печатью ( ) листа
Подпись

Жер учаскесінің
сервитуты

Өтініш № 00220128551 2
14:219:012:432:5
Кадастрлық № Тіркелген уақыты 14:59
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы
г. Жибек Жолы

Тіркеуші (маман) Сунейменова К.С
Бөлім басшысы Шикенов К.Е

14/16/95510
