«Еңбекшіқазақ ауданының сәулет және қалақұрылысы бөлімі» ММ
АРНАЙЫ ТІРКЕУГЕ АЛЫНДЫ

Государственное учреждение
«Отдел архитектуры и градостроительства
Енбекшиказахского района»
ВЗЯТ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ
« 20 » 10 20 20 ж.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 42

" 08 " октября 2020года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« 06 » октября 2020г. ТОО «Компания АлматыДорСтрой» в лице Генерального директора Абдыгапарова Эрика Алмабековича г.Алматы, ул. Коммунальная, 12**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« 08 » октября 2020г. ТОО « Инженерно-производственный центр «Альянс» в лице тех.надзора Базарбаева Нуртая Токтаркановича № KZ25VJE00029235 от 01.08.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« 08 » октября 2020г. ТОО «Алматы жоба» в лице авторского надзора Юрова Павла Яковлевича КДСиЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт

по адресу **Алматинская область, Енбекшиказахский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "31 декабря 2010 № 1231;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ02REA00167964 от 07.04.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алматы жоба»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 18-0085/18 от 21.05.2018г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Февраль 2020г. ;**
месяц, год

окончание работ **Октябрь 2020г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев ;**
фактически, месяц: **7 месяцев ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пешеходный переход а/д «Есик-Александровка », км 6	м	67,36		67,36	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Ширина между перилами	м	2,25	2,25
Ширина тротуаров	м	2	2
Высота моста	м	5,5	5,5
Высота пролетного строения	м	1,67	1,67
Длина пролетного строения	и	27	27
Ширина пролетного строения	м	2,9	2,9
Количество бетонируемых опор и лестничных сходов	шт	10	10
Бетонирование монолитного фундамента	м3	100,6	100,6
Бетонирование стоек Ск-575, СМ-480, СМ-280	м3	25,64	25,64
Бетонирование ригеля	м3	2,4	2,4
Бетонирование подферменников ПМ-1 и МП-3	м3	1,8	1,8
Лестничные сходы	м/шт	35,34/2	35,34/2
Установка светодиодных светильников	шт	16	16
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Пешеходный переход расположен севернее г.Есик, западнее садоводческого товарищества, восточнее музея, Енбекшиказахского района Алматинской области от автотрассы Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос(Кульджинка) до г.Есик на 6км. а/д областного значения А-2. Схема моста - 1х27,0м; Пешеходный мост общей длиной – 67,36м; Длина моста 32,02м; Конструкция пешеходного моста представляет собой сварную ферму. Ферма опирается на тангенциальные опорные части установленные на ригель опоры. Конструкция пролетного строения моста состоит из металлических ферм, объеденных поперечными балками и укладкой металлического листа в качестве металлической ортотропной плиты (настил). Ширина пешеходной части моста - 2,25м. По краям пролетного строения предусмотрены лестничные сходы 17,67м х 2шт. с пандусами. Сверху лестничные сходы закрыты от дождя и снега прозрачной кровлей из поликарбоната. Пешеходная часть на пролетных строениях и лестничных сходах ограждается перильным ограждением. Прохожая часть моста выполняется с использованием оклеечной рулонной гидроизоляции. Покрытие прохожей части пролетного строения выполняется из горячего м/з асфальтобетона Тип Б., также предусматриваются деформационные швы индивидуального типа. Предусмотрены тротуары с установкой бортовых камней. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматривается установка дорожных знаков, дорожная разметка проезжей части и барьерное ограждение**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего _144909,74204 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ

__142696,519 тысяч тенге, авторский надзор 285,3928 технический надзор __1927,83024 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __138501,62083 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _136577,57232 тысяч тенге; авторский надзор _285,39281 тысяч тенге; технический надзор _1638,65570 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области» принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Самуратов С.З.

Начальник отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Аппаков А.

Технический надзор:
ТОО « Инженерно-производственный центр «Альянс»» — Базарбаев Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО «Алматы жоба» — Юров П.Я.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» — Абдыгапаров Э.А.

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» — Алипбаев М.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1.	Дорожное покрытие тротуаров	м2	122,8	Устройство основания из щебня Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
2.	Дорожное покрытие тротуаров	м2	1117	Устройство основания из ПГС Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
3.	Дорожные знаки	шт	4	Установка знаков на стойках	
4.	Поребрик	м	1459,7	Бетонное основание	
5.	Барьерное ограждение	м	388		

Заказчик _____ Аппаков А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Юров П.Я.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик _____ Самуратов С.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Провода:		
	1) алюминиевые	км	0,06
	2) медные	км	0,23364
2	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	16
3	Кабели:		
	1) силовые ВВГ	км	0,235
	2) силовые АВБбШвнг	км	0,245

Заказчик _____ Аппаков А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Юров П.Я
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик _____ Самуратов С.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Ширина между перилами	м	2,25		
2	Ширина тротуаров	м	2		
3	Высота моста	м	5,5		
4	Высота пролетного строения	м	1,67		
5	Длина пролетного строения	м	27		
6	Ширина пролетного строения	м	2,9		
7	Светильник светодиодный	шт	16		
8	Дорожное покрытие на мосту	м2	65,8		

Заказчик _____Аппаков А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____Юров П.Я

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик _____Самуратов С.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 06 » октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания АлматыДорСтрой» г.Алматы, ул. Коммунальная, 12**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Абдыгапарова Эрика Алмабековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ДСУ-13»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алматы жоба»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 18-0085/18 от 21.05.2018г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
а/д «Есик-Александровка », км 6	м	67,36		67,36	

«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Ширина между перилами	м	2,25	2,25
Ширина тротуаров	м	2	2
Высота моста	м	5,5	5,5
Высота пролетного строения	м	1,67	1,67
Длина пролетного строения	и	27	27
Ширина пролетного строения	м	2,9	2,9
Количество бетонируемых опор и лестничных сходов	шт	10	10
Бетонирование монолитного фундамента	м3	100,6	100,6
Бетонирование стоек Ск-575, СМ-480, СМ-280	м3	25,64	25,64
Бетонирование ригеля	м3	2,4	2,4
Бетонирование подферменников ПМ-1 и МП-3	м3	1,8	1,8
Лестничные сходы	м/шт	35,34/2	35,34/2
Установка светодиодных светильников	шт	16	16
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Пешеходный переход расположен севернее г.Есик, западнее садоводческого товарищества, восточнее музея, Енбекшиказахского района Алматинской области от автотрассы Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос(Кульджинка) до г.Есик на 6км. а/д областного значения А-2. Схема моста - 1х27,0м; Пешеходный мост общей длиной – 67,36м; Длина моста 32,02м; Конструкция пешеходного моста представляет собой сварную ферму. Ферма опирается на тангенциальные опорные части установленные на ригель опоры. Конструкция пролетного строения моста состоит из металлических ферм, объеденных поперечными балками и укладкой металлического листа в качестве металлической ортотропной плиты (настил). Ширина пешеходной части моста - 2,25м. По краям пролетного строения предусмотрены лестничные сходы 17,67м х 2шт. с пандусами. Сверху лестничные сходы закрыты от дождя и снега прозрачной кровлей из поликарбоната. Пешеходная часть на пролетных строениях и лестничных сходах ограждается перильным ограждением. Прохожая часть моста выполняется с использованием оклеечной рулонной гидроизоляции. Покрытие прохожей части пролетного строения выполняется из горячего м/з асфальтобетона Тип Б., также предусматриваются деформационные швы индивидуального типа. Предусмотрены тротуары с установкой бортовых камней. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматривается установка дорожных знаков, дорожная разметка проезжей части и барьерное ограждение**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Февраль 2020г.** ;
месяц, год
окончание работ **Октябрь 2020г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев** ;
фактически, месяц: **7 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Гл. инж. ЕРТР
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата 06.10.20г.
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. Гл. спец. об Есикане КО
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата 06.10.20г.
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 5 (пять) лет в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» _____ 06.10.21 **Абдыгапаров Э.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата

Субподрядная организация
Директор
ТОО «ДСУ-13» _____ 06.10.21 **Кошелев М.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НА А/Д "ЕСИК-АЛЕКСАНДРОВКА" КМ 6 ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА

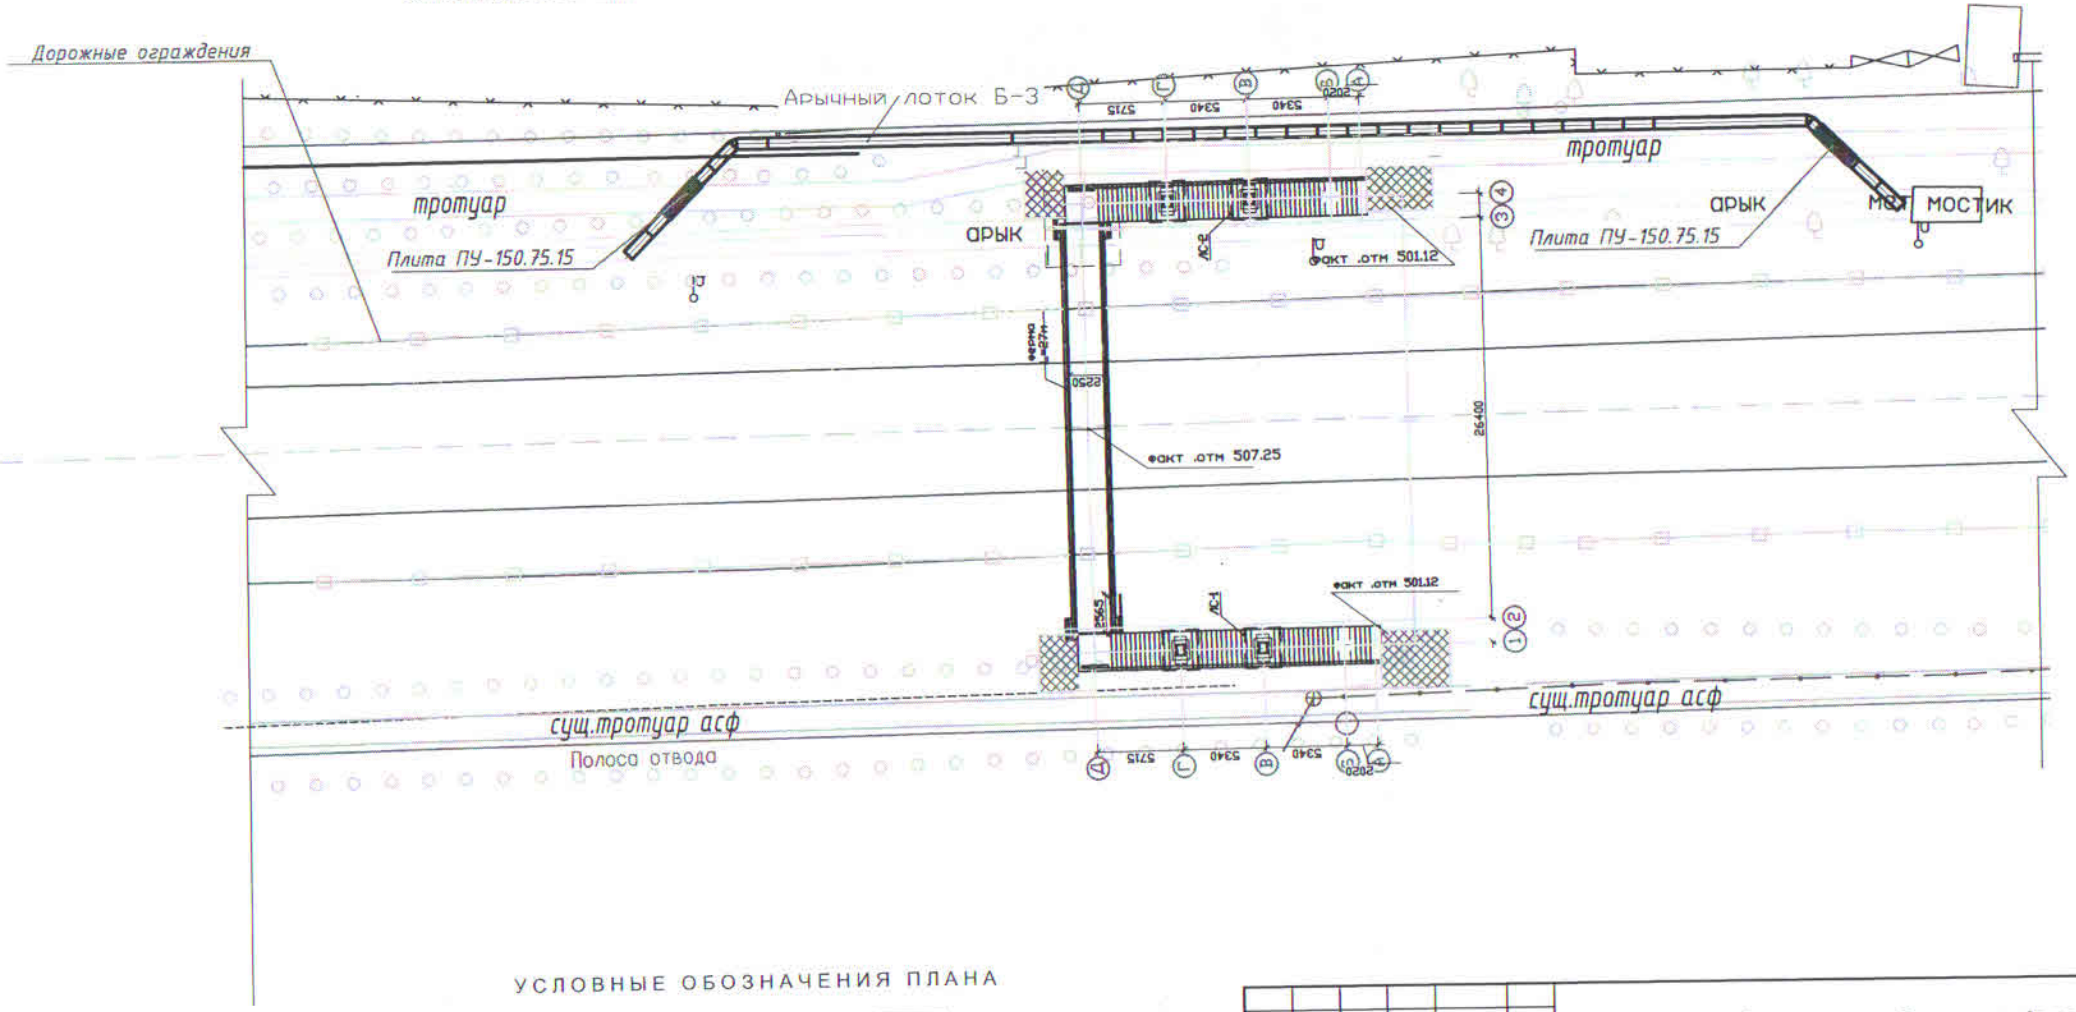

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЛАНА

- сущест. ось улицы
- край сущ. проезжей части и обочины
- проектный тротуар
- сущест. тротуар
- В — сущ. водопровод
- сущ. ЛЭП 0.4 Кв.
- сущ. ЛЭП 10
- сущ. кабель
- репер
- сущ. ограждения

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	Строительство надземного пешеходного перехода на а/д "Есик-Александровка" км 6 Енбекшиказахского района		
Исполнил		Моор З.В.				Исполнительная съемка	Лист 1	Листов 1
						Общий вид	АО "ДСУ-13" г.Алматы	

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 08 » октября **2020 г.**

Технический надзор **ТОО « Инженерно-производственный центр «Альянс» Директор Базарбаев Нуртай Токтарканович г.Алматы, ул.Гоголя, 86 г.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице **тех.надзора Базарбаева Нуртая Токтаркановича № KZ25VJE00029235 от 01.08.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора № 70 от 06.04.20г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Компания АлматыДорСтрой» ГСЛ № 07460 от 12.04.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Абдыгапарова Эрика Алмабековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Февраль 2020г. ;**
месяц, год
окончание работ **Октябрь 2020г. ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **8 месяцев** ;
фактически **7 месяцев ;**
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 144909,74204 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 142696,519 тысяч тенге, авторский надзор 285,3928 тысяч тенге; технический надзор 1927,83024 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 138501,62083 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 136577,57232 тысяч тенге; авторский надзор 285,39281 тысяч тенге; технический надзор 1638,65570 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Алматы жоба»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 18-0085/18 от 21.05.2018г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО « Инженерно-производственный центр «Альянс» Директор Базарбаев Нуртай Токтарканович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П. 08.10.20..

эксперт(ы) технического надзора **Базарбаев Нуртай Токтарканович №KZ25VJE00029235 от 01.08.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П. 08.10.20..

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 08 » октября 2020г.

Авторский надзор **ТОО «Алматы жоба» Директор Ергалиев Сарсен Дусенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора Юрова Павла Яковлевича КДСиЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 38 от 13.03.2020г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Компания АлматыДорСтрой» ГСЛ № 07460 от 12.04.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Генерального директора Абдыгапарова Эрика Алмабековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Февраль 2020г.;**
месяц, год
окончание работ **Октябрь 2020г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **8 месяцев**;
фактически **7 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Алматы жоба»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 18-0085/18 от 21.05.2018г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация **ТОО «Алматы жоба» Директор Ергалиев Сарсен Дусенович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П. 08.10.20г.

эксперт(ы) авторского надзора **Юров Павел Яковлевич КДСиЖКХ № 06787 от 04.03.2014г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П. 08.10.20г.

Пронумеровано

Прошнуровано

18 листов

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
Казахстан город Алматы
Компания "АлматыДорСтрой"
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Общество с ограниченной ответственностью
