«ТАЛҒАР АУДАНЫ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛАҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 212
«27» 01 2020.

Руководителю отдела Талгарского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан» по Алматинской области Усербаеву А.Б.

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района» сообщает следующее.

В соответствии с Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», акт приемки объекта в эксплуатацию блочно-модульная котельная (№5 Блок) г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области» расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, улица Ахметова, №29/1 учтен от 27 января 2020 года №70, заказчик ТОО «Orkeniet Construction»

Архитектурно-планировочное задание на проектирование выдано 15 ноября 2019 года, номер: KZ14VUA00138634.

Руководитель **Ж.Ауелбаев**

Исп.Мұқанов Д.
Тел.8(72774)2-01-36

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№70 "27" 01 2020 года

Заказчик ТОО «Orkeniet Construction» в лице директора Амренова Б.У, Алматинская область, город Талгар, улица Ахметова, участок № 29/1.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 27.01.2020 года, ТОО «Orkeniet Construction», расположенного по адресу: г.Алматы, улица Абилова, 29, в лице директора Амренов Б.У.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27.01.2020 года, ТОО «Исаев Л.Т» расположенного по адресу: город Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар 9, в лице директора Исаева Л.Т. эксперт Исаев Л.Т. KZ27VJE00044428 от 11.02.2019 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.01.2020 года, ТОО «Aktilek Construction», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыр, Батталханова 7, в лице директора Абдулина З.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Блочно-модульная котельная (блок №5), расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар, улица Ахметова, участок № 29/1

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Алматинская область, город Талгар, улица Ахметова, участок № 29/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "13" ноября 2019 года № 03-057-011-975; Площадь земельного участка: 0.0210 га

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

Распоряжение акимата города Талгар № 11-495 Ѳ от 05 ноября 2019 года;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ67REA00159713 от 20.01.2020 г. ГУ «Управление ГАСК Алматинской области».

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СтройИндустрия» ГСЛ – 005362 от 18.06.2001 года, в лице директора Паненкова Е.Г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Orkeniet Construction» в лице директора Амренова Б.У.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 22.01.2020 года;

месяц, год

окончание работ 01.02.2020 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица Измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная котельная (блок №5)	Гкал в час			2,063629	
Площадь котельной	$м^2$			46	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Блочно-модульная котельная имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	46	
Число этажей	этаж	-	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	
В том числе подземной части	м3	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число Квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Габаритные размеры котельной ДхШхВ (без учета фундаментов) – 9,2х5х2,7(Н) м
3,5х2,5х2,7 м помещение для топливной емкости
Полезная тепловая мощность котельной - 2400 кВт
Допустимая температура подающей магистрали - 95 °С
Допустимое избыточное рабочее давление - 6 бар

Контур отопления:
Номинальная тепловая мощность - 2280 кВт
Проектная нагрузка с учетом теплопотерь и собственных нужд котельной -2280 кВт
Расход газа на проектную нагрузку – 245 м3/час
Присоединительные патрубки - PN6 Ду125 (Т1, Т2)
Отопительный график - 95/70 °С

Контур горячего водоснабжения:
Номинальная тепловая мощность - 240 кВт
Проектная нагрузка -240кВт 4
Расход теплоносителя на проектную нагрузку – 26 м3/час
Присоединительные патрубки - PN6 Ду32 (Т3, Т4)
Температурный график - 65/5 °С

Электроснабжение – 380/220 В
Предварительная эл. нагрузка Рр= 28,3 кВт, Ру= 37,6 кВт
Расход природного газа на общую проектную нагрузку 2400 кВт составит 260 м3/ч
Расход дизельного топлива на общую проектную нагрузку 2400кВт составит 205 кг/ч
Средняя температура отходящих газов - 190 °С

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 170 372 508 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 150 372 508 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 20 000 000 млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 170 372 508 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 150 372 508тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 20 000 000 млн тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Блочно-модульная котельная (блок №5) принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

1) Заказчик
ТОО «Orkeniet Construction» Амренов Б.У
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

2) Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Orkeniet Construction» Амренов Б.У
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

3) Технический надзор
ТОО «Исаев Л.Т» Исаев Л.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

4) Авторский надзор
ТОО «Aktilek Construction» Абдулина З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

	Приложение 1 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	262	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	17	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	245	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	5	
3	Количество компенсаторов	шт	4	
4	Количество вводов	шт	6	
5	Количество задвижек	шт	16	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Трубопровод ст.		Сталь	32	255	
2	Трубопровод ст.		Сталь	40	255	
3	Трубопровод ст.		Сталь	57	51	
4	Трубопровод ст.		Сталь	57	3	
5	Трубопровод ст. в ППУ ПЭ		Сталь	89	210	
6	Трубопровод ст. в ППУ ПЭ		Сталь	108	300	
7	Трубопровод ст. в ППУ ПЭ		Сталь	133	48	
8	Трубопровод ст. в ППУ ПЭ		Сталь	159	6	

1) Заказчик
ТОО «Orkeniet Construction» Амренов Б.У

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

2) Авторский надзор
ТОО «Aktilek Construction» Абдулина З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"27" 01 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Orkeniet Construction», расположенного по адресу: г.Алматы, улица Абилова, 29,
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Амренов Б.У. .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Блочно-модульная котельная (блок №5)» расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар, улица Ахметова, участок № 29/1.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Orkeniet Construction» в лице директора Амренова Б.У
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СтройИндустрия», ГСЛ – 005362 от 18.06.2001 года, в лице директора Паненкова Е.Г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Orkeniet Construction» в лице директора Амренова Б.У;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица Измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная котельная (блок №5)	Гкал в час			2,063629	
Площадь котельной	$м^2$			46	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Блочно-модульная котельная имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	46	
Число этажей	этаж	-	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	
В том числе подземной части	м3	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число Квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Габаритные размеры котельной ДхШхВ (без учета фундаментов) – 9,2х5х2,7(Н) м
3,5х2,5х2,7 м помещение для топливной емкости
Полезная тепловая мощность котельной - 2400 кВт
Допустимая температура подающей магистрали - 95 °С
Допустимое избыточное рабочее давление - 6 бар
Контур отопления:
Номинальная тепловая мощность - 2280 кВт
Проектная нагрузка с учетом теплопотерь и собственных нужд котельной -2280 кВт
Расход газа на проектную нагрузку – 245 м3/час
Присоединительные патрубки - PN6 Ду125 (Т1, Т2)
Отопительный график - 95/70 °С
Контур горячего водоснабжения:
Номинальная тепловая мощность - 240 кВт
Проектная нагрузка -240кВт 4
Расход теплоносителя на проектную нагрузку – 26 м3/час
Присоединительные патрубки - PN6 Ду32 (Т3, Т4)
Температурный график - 65/5 °С
Электроснабжение – 380/220 В
Предварительная эл. нагрузка Рр= 28,3 кВт, Ру= 37,6 кВт
Расход природного газа на общую проектную нагрузку 2400 кВт составит 260 м3/ч
Расход дизельного топлива на общую проектную нагрузку 2400кВт составит 205 кг/ч
Средняя температура отходящих газов - 190 °С

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 22.01.2020;
месяц, год
окончание работ 01.02.2020;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарык Компаниясы»
наименование организации, фамилия, имя отчество (при наличии)

27.01.20
подпись руководителя, дата М.П.

Жетысуский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак»
наименование организации, фамилия, имя отчество (при наличии)

27.01.20
подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПВХ «Талгар Су»
наименование организации, фамилия, имя отчество (при наличии)

27.01.20
подпись руководителя, дата М.П.

Сұралып отырған жер учаскесі бас жоспардан көшірме
Масштаб 1:2000

Объект салу үшін жер учаскесін таңдау актісіне қосымша

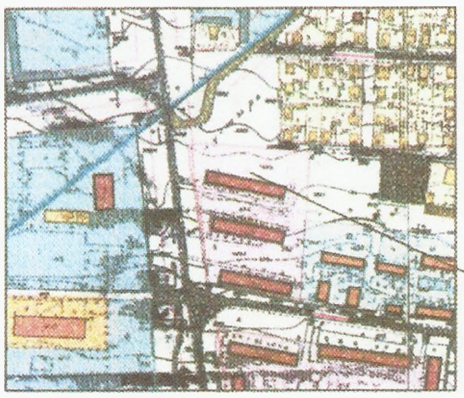

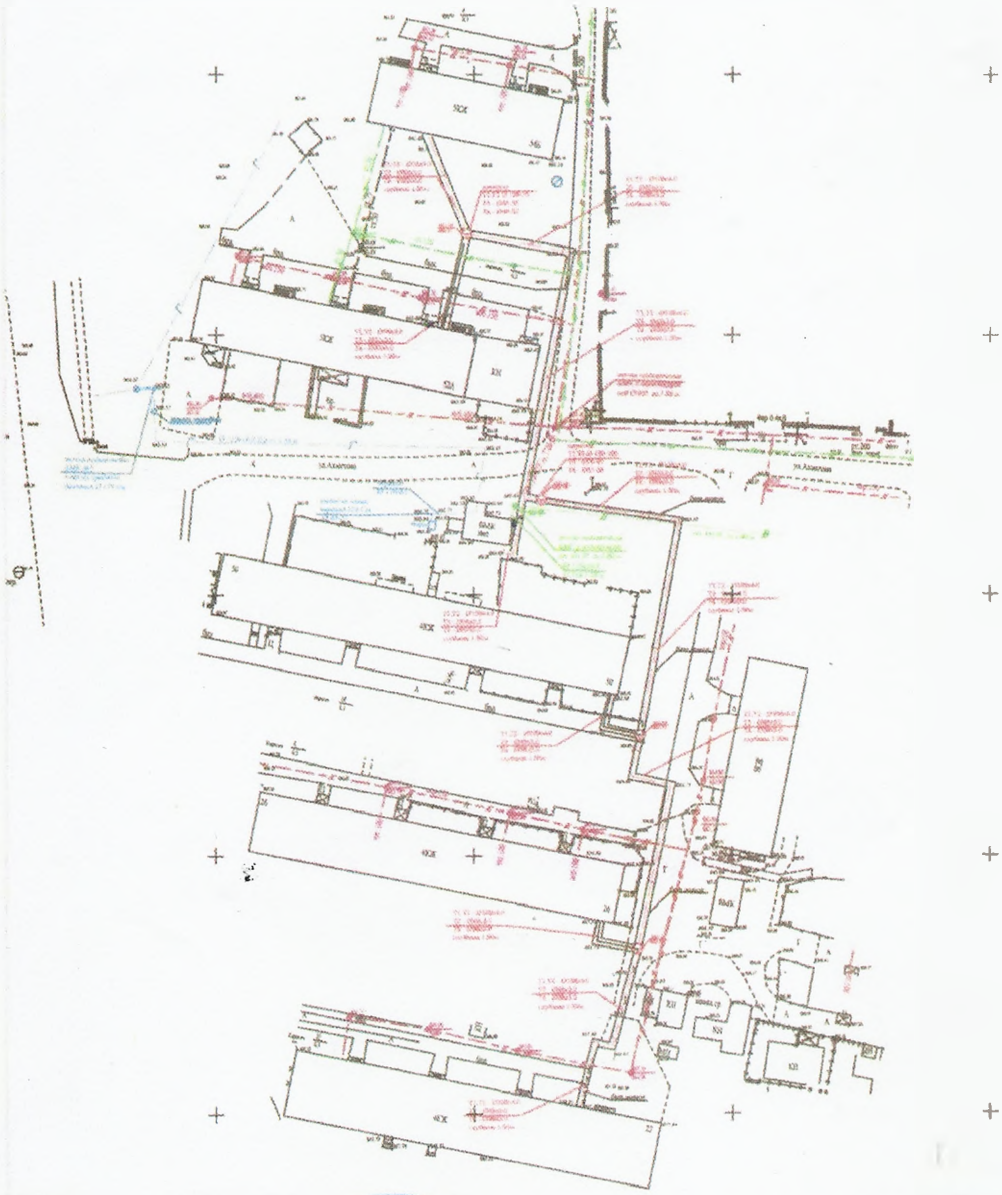

Жер учаскесінің пішіні

Орындаушы _____ байланыс деректері
(орындаушы мамандығы, аты-жөні)

—Т— 0,296км жылу жүйесі
—Г— 0,090км Газ
—В— 0,056км Су құбыры
—К— 0,090км Кәріз
ЛЭП 10 кВ 0,030км Электр желісі

БМК №5
ул. Ахметово 29/1.

эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Блочно-модульная котельная (блок №5) готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Orkeniet Construction»
наименование организации
Амренов Б.У.
_____
фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, подпись
«27» _____ 2020 г.
М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«27» 01 2020 года

Авторский надзор ТОО «Aktilek Construction», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыр, Батталханова 7
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице директора Абдулина З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №35/А от 03.12.2019 года
№ договора и дата

по объекту: «Блочно-модульная котельная (блок №5)», расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар, улица Ахметова, участок № 29/1.
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «Orkeniet Construction» в лице директора Амренова Б.У.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Orkeniet Construction» № 15002189 от 02.02.2015 г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Амренова Б.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями а) ТОО «ЕвроТехСистемс», Государственная лицензия № 19013300 от 20.06.2019 года, Сертификат о происхождении товара № KZ910500389 от 03.07.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Исмаилова Д. К. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) ТОО «CHCBilding», Государственная лицензия № 13017785 от 30.10.2013 года ;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Кокорева С. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) ТОО «Алматы Production Construction & Invest», Государственная лицензия № 00168 от 10.06.2010 года ;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Садырбая К. К. ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
г) ТОО «Талас-Курылыс», Государственная лицензия № 14013400 от 08.09.2014 года ;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Нурмашева Е. Т. ;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 22.01.2020 г ;
месяц, год
окончание работ 01.02.2020 г;
месяц, год

при продолжительности строительства, 1 месяц: по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;

фактически 1 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «СтройИндустрия», ГСЛ – 005362 от 18.06.2001 года, в лице директора Паненкова Е.Г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ТОО «Orkeniet Construction» в лице директора Амренова Б.У
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «Aktilek Construction»
наименование организации

Абдулина З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«27» 04 2020г.

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» 01 2020 года

Технический надзор ТОО «Исаев Л.Т» расположенного по адресу: город Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар 9, в лице директора Исаева Л.Т. эксперт Исаев Л.Т. KZ27VJE00044428 от 11.02.2019 года.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адресфамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 24/09-003 от 24.09.2019 года

№ договора и дата

по обьекту: «Блочно-модульная котельная (блок №5)», расположенного по адресу: Алматинская область, город Талгар, улица Ахметова, участок № 29/1..

Наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «Orkeniet Construction» в лице директора Амренова Б.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Orkeniet Construction» № 15002189 от 02.02.2015 г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Амренова Б.У.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями а) ТОО «ЕвроТехСистемс», Государственная лицензия № 19013300 от 20.06.2019 года, Сертификат о происхождении товара № KZ910500389 от 03.07.2019 года

наименование организации, № лицензии и дата получения,

в лице Исмаилова Д. К. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) ТОО «CHCBilding», Государственная лицензия № 13017785 от 30.10.2013 года ;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Кокорева С. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) ТОО «Алматы Production Construction & Invest», Государственная лицензия № 00168 от 10.06.2010 года :

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Садырбая К. К. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) ТОО «Талас-Курылыс», Государственная лицензия № 14013400 от 08.09.2014 года ;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Нурмашева Е. Т. ;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 22.01.2020 г;

месяц, год

окончание работ 01.02.2020 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 месяц;
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически 1 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 170 372 508 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 150 372 508 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 20 000 000 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 170 372 508 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 150 372 508 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 20 000 000 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «СтройИндустрия», ГСЛ – 005362 от 18.06.2001 года, в лице директора Паненкова Е.Г.
наименование проектной организации, номер проекта

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Исаев Л.Т»
наименование организации

Исаев Л.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«27» 07 2020 г.

М.П.
