Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"7" 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква», 010000 Республика Казахстан, г.Астана ул. Жамбыла д. 15а, государственная лицензия ГСЛ№ 18012450 от 22.06.2018 г**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **директора НуралинаРахимбекаКалымжановича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза»,**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" Руководитель Оспанов Газиз Исатаевич**

(наименование организации,фамилия,имя,отчество(при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Астана-Аманат»,**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "KazСтройПроект " проект 33-2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдела строительства города Экибастуз", приказ №156, от 24 июля 2018 года;**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция I подъема	шт	3		3	
Насосная станция II подъема	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По	Факти-

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)
Число этажей	этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)
В том числе подземной части	м3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводные сети:а) *Водопроводные сети из труб полиэтиленовых питьевых общей* протяженностью 6782 м, в том числе:

-диаметром PE 100 SDR 21 - 125х6,0 мм , протяженностью 3784,4 м;

-диаметром PE 100 SDR 21 - 110х5,3 мм; протяженностью 693,8 м;

-диаметром PE 100 SDR 21 - 50х2,4 мм; протяженностью 32,7 м;

-диаметром PE 100 SDR 21 - 32х2,0 мм; протяженностью 2271,1 м;

б) Колодцы водопроводные 77 штук, в том числе:

- диаметром 1,5 м- 35шт,
- диаметром 2,0 м- 42шт,
- пожарные гидранты - 17шт;

в) *Площадка водопроводных сооружений в составе:*

• насосная станция Iподъема (3 шт.)с установкойнасосных станций над артскважинами -3 шт.

•насосная станция 2-го подъема на хоз.питьевые-противопожарные нужды с установкойоборудования: насосная станция на базе 2-х насосов производительностью 30м3/ч, напором 44м и мощностью 7,5 кВт в комплекте-1 шт.

-насосная станция на базе 2-х насосов производительностью 58,6м3/ч, напором 61,21м и мощностью 15 кВт в комплекте-1 шт.

-установка ультрафиолетового обеззараживания производительностью 50м3/ч УУФОВ-50-2 шт.

-насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10м3/ч, напор 10м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин-2шт.

•резервуар полиэтиленовый для питьевой воды V=80м3-3 шт.

•установка очистки воды комбинированной серии ДВУ производительностью 10,5 м3/час-1 шт.

• резервуар для сбросных вод емкостью 50м3 железобетонный;

•дизель-генераторная электростанция, 400В, 88кВт в комплекте с кожухом-1шт.

• трансформаторная станция;

Внутриплощадочные сети в том числе:водопровод протяженностью 333,8 м, канализация К0протяженностью 120,6 м, К1протяженностью 28,0 м, К3протяженностью 10,0 м,

Колодцы водопроводные диаметром 1,5 м 6 штуки,диаметром 2,0 м 2 штуки,Колодцы канализационные диаметром 1,5 м 3 штуки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: 15 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Председатель Правления ТОО «Горэлектросеть» Ордабаев М.А.

Гл. инженер Даниленко А.С. 04.11.2020

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» г. Экибастуз

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись)руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза)**»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «Евростандарт Аква» Нуралин Рахимбек Калымжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)
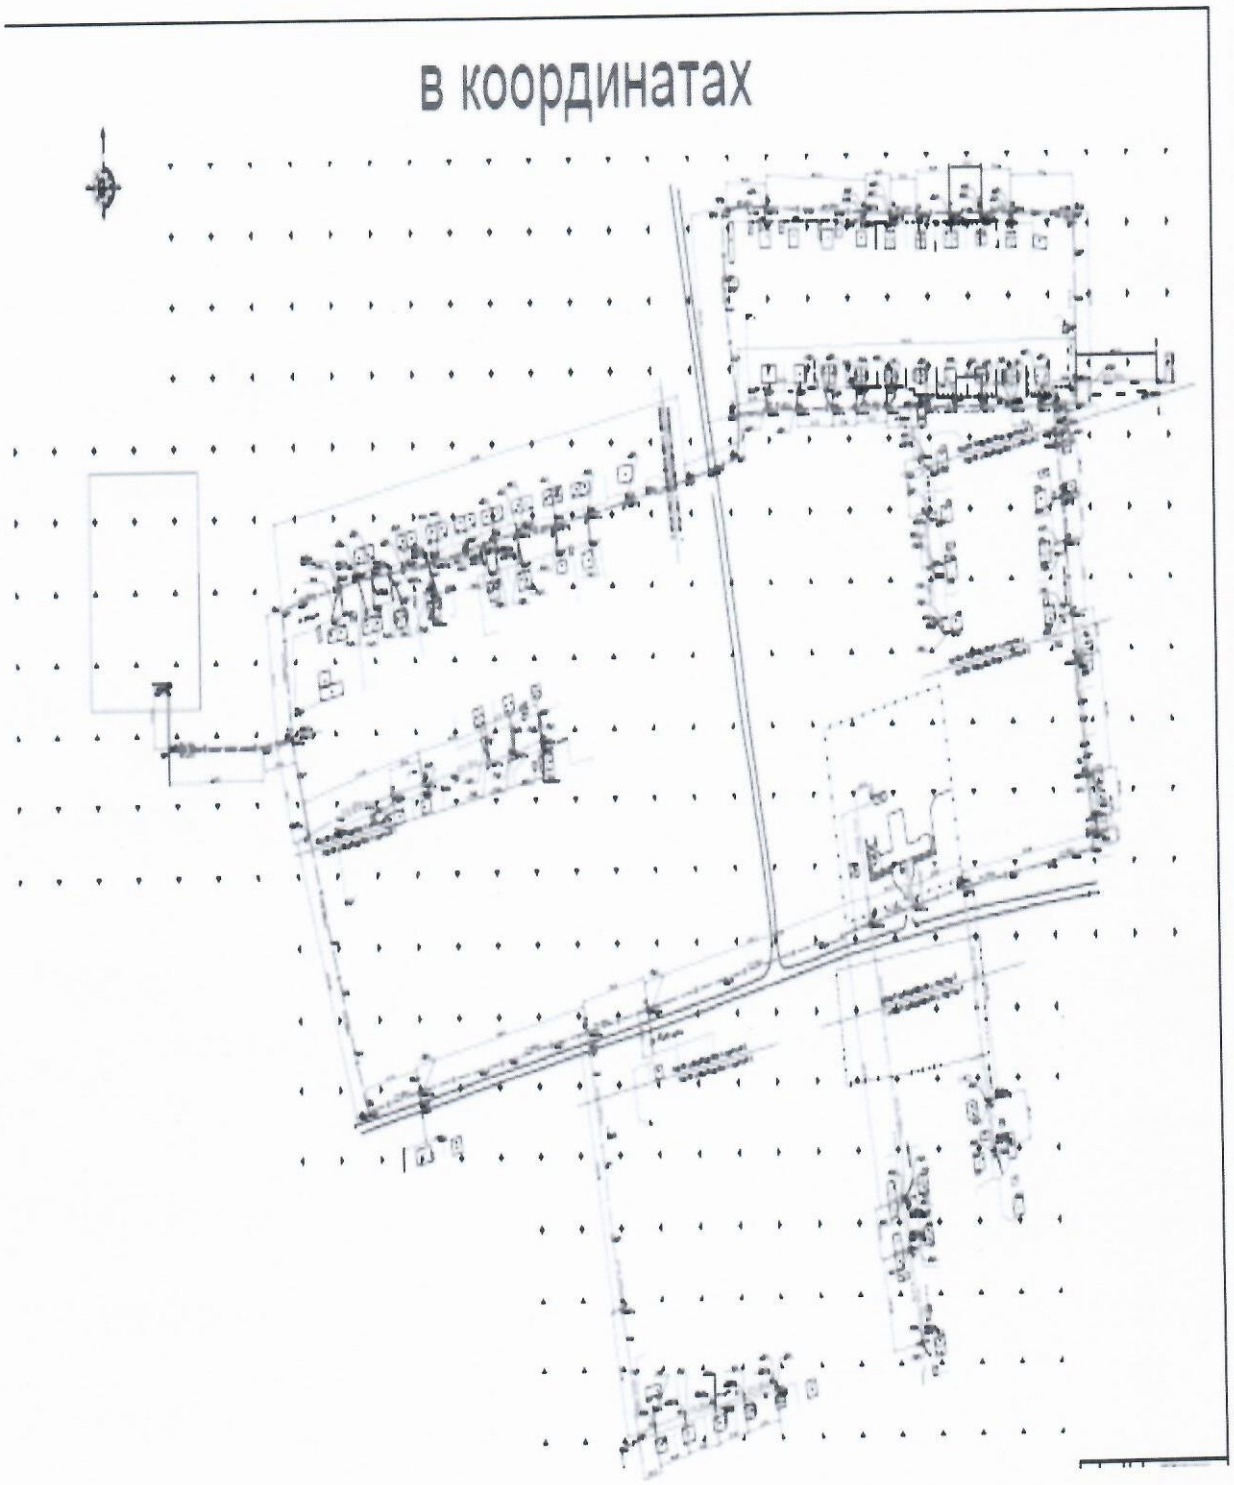
п. 10. Исполнительная геодезическая съемка положения подземных инженерных сетей
