Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» декабря 2020 года
приказ КВР №29-3/4

Заказчик **Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», Заместитель Председателя Аяшев Максат Темирбекович** __
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается)_ «_____» **октябрь 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», генеральный директор Мыханов Бердибек Сартаевич, г. Кызылорда поселок Тасбугет ул. М. Шокая 18**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«_____» октябрь 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «MSK Engineering», Акнуров Нурлан Айтмухамбетович, Аттестат №KZ87VJE00026470 от 23.05.2017 г., №KZ43VJE00037932 от 18.05.2018 г., №KZ70VJE00037931 от 18.05.2018 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
«_____» октябрь 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ», директор Абдиров Ерлан Максутович,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водоснабжения с. Жымпиты Сырымского района ЗКО из месторождения подземных вод Кенащы»**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу **Жымпитинский аульный округ, Сырымский район, Западно-Казахстанская область**, _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «____» _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации

негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
от «11» октября 2017 года
решение № 119, ГУ «Аппарат акима Жымпитинского аульного округа» ;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», 12.11.2019 г., KZ31REA00151825**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **10** ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10** ;
фактически, месяц: **10** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR11-75x6,8 питьевая	п.м.	75	75	75	75
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR11-280x25,4 питьевая	п.м.	77 022	77 022	77 367	77 367
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR 11 - 225x13,4 питьевая	п.м.	661,5	661,5	661,5	661,5
Трубопровод из труб ПЭ 100 SDR 26 - 110x4,2 техническая	п.м	88,2	88,2	88,2	88,2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительством предусмотрено водоснабжение населенных пунктов с. Жымпиты, п. Уленты, п. Шагырлой, п. Булан, п. Жамбыл, п. Кособа, п. Жыракудык Сырымского района Западно-Казахстанской области.

Система водоснабжения принята хозяйствено-питьевого назначения.

В состав строительства входят:

1. Подводящий водовод

1.1. Водовод от Головного водозабора до здания для установки очистки воды «ДВУ-100-56» из труб ПЭ 100 SDR 11 - 75х6,8 мм, протяженность L= 0,075 км, водовод из труб ПЭ 100 SDR 11 Ø280х25,4 мм, протяженность L= 77,367 км, в том числе, водопроводных колодцев Ø2000 мм – 41 шт, в том числе дренажных колодцев Ø2000 мм – 14 шт, колодцев Ø1500 мм – 14 шт;

1.2. Водовод от здания для установки очистки воды «ДВУ-100-56» до существующего колодца 3А из труб ПЭ100 SDR 11 - 225х13,4 мм, протяженность L= 662,0 м.

2. Площадка головного водозабора

2.1. Площадь участка Головного водозабора F= 7200 м2, протяженность сетчатого ограждения территории – 360 п.м. (Н=2,0 м), площадь покрытий дорог и площадок – 1336 м2 (щебеночное толщ. 7,0 см., обработанное битумом, основание ПГС – 5,0 см), озеленение: посев травы – 4490 м2., посадка деревьев – 59 шт., кустарников (живая изгородь) – 257 п.м.

2.2. На площадке расположены три водозаборных скважин с насосными камерами подземного типа со сборными стенами из железобетонных колец диаметром 2,0 м, глубина каждой скважин – 80 м, скважинные насосы Lowara Z631 13-L6W ELP 380-415 50 с электродвигателем L6W185T405/B, напор Н=140,0 м, подача воды – 30,0 м3/час;

2.3. На площадке располагается Здание для установки электрооборудования - кирпичное здание с размерами в плане 3,0х3,0 м высотой помещения 2,5 м.

3. Площадка для здания для установки очистки воды ДВУ-100-56

3.1.Площадь участка для здания установки очистки воды F= 1755 м2, протяженность глухого ограждения из проф. листов – 168 п.м (Н=2,2 м), покрытия дорог и площадок участка для здания установки очистки воды – 210 м2 (щебеночное с толщ. 7,0 см., обработанное битумом, ПГС – 7,0 см); площадь покрытия подъездной дороги – 468,5 м2 (щебеночное с толщ. 7,0 см., обработанное битумом, ПГС – 7,0 см) , озеленение: посев травы – 1352 м2., кустарников (живая изгородь) – 116 п.м.;
3.2. Здание для установки очистки воды ДВУ100-56 с насосами - кирпичное здание с размерами в плане 6,0х15,0 м. высотой помещения - 3,0 м.
3.2. Установка обеззараживания воды серии ДВУ-100-56, подача воды потребителю - 55,3 м3/час, напор Н= 71,5 м.

4. Площадка естественных испарителей – промывные воды от установки очистки воды по канализации сбрасываются в выгреб, из выгреба по канализационному коллектору сбрасываются на естественные испарители.
4.1. Общая площадь площадки естественных испарителей -972 м2., протяженность сетчатого ограждения территории –126 п.м. (Н=2,0 м);
4.2. Естественные испарители - две карты с размером в плане 6,5х5,5 м, глубиной 1,5 м каждая, дно и откосы защищены полиэтиленовой пленкой;
4.3. Сбросная канализационная линия из труб ПЭ 100 SDR 26 - 110х4,2 мм, общей протяженностью L=88,2 м;
4.4. Выгреб емкостью V= 14 м3 - бетонная сборная конструкция из колодцев диаметром 2,0 м.

5. Линия электропередачи ВЛ-10 кВ /0,4кВ
5.1. Линии электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Конур» до Головного водозабора, протяженность L= 17,807 км., стоек СВ105-342 шт, СНВ-7-13 – 5 шт, Провод 3АС50/0,8, - 53 421 м, кабель АСБ-10-3х50 – 133 м;
5.2. Сети 0,4 кВ площадки Головного водозабора - установка КТПН 10/0,4кВ–63 кВА – 1комплект, опоры СВ95-2а – 19 шт, самонесущий провод 2х25 мм2 СИП -2 - 320 п.м., светильники ЖКУ-06-250 – 13 шт, провод ПВС-3х2,5 мм2 – 50,0 м, кабельная линия – 110 м, кабель ВББГ 5х6 мм2;
5.3. Сети 0,4 кВ Площадки для здания очистки воды ДВУ-100-56, Стойки СВ95-2а – 23 шт, самонесущий провод 2х25 мм2 СИП -2 - 280 п.м. , светильников, тип ЖКУ-06-250 - 7 шт, провод ПВС 3х2,5 мм2 – 40 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **2 364 115,79** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 835 311,56** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **528 804,231** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области

архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водоснабжения с. Жымпиты Сырымского района ЗКО из месторождения подземных вод Кенащы»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Аяшев Максат Темирбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор **Акнуров Нурлан Айтмухамбетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Абдиров Ерлан Максутович**
фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Мыханов Бердибек Сартаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_____» _____2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) __**ТОО «Мелиоратор» Республика Казахстан, г.Кызылорда поселок Тасбугет ул. М.Шокая 18**__
наименование организации, юридический адрес
в лице _**генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича**_
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:_ **«Строительство водоснабжения с. Жымпиты Сырымского района ЗКО из месторождения подземных вод Кенащы», Западно-Казахстанская область, Сырымский район район** _____
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является _**Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», Заместитель Председателя Аяшев Максат Темирбекович** __
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации
_____
3. Проект (проектно-сметная документация)__**ТОО «КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ»**_____
_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_____
_____;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, бъем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR11-75x6,8 питьевая	п.м.	75	75	75	75
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR11-280x25,4 питьевая	п.м.	77 022	77 022	77 367	77 367
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR 11 - 225x13,4 питьевая	п.м.	661,5	661,5	661,5	661,5
Трубопровод из труб ПЭ 100 SDR 26 - 110x4,2 техническая	п.м	88,2	88,2	88,2	88,2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительством предусмотрено водоснабжение населенных пунктов с. Жымпиты, п. Уленты, п. Шагырлой, п. Булан, п. Жамбыл, п. Кособа, п. Жыракудык Сырымского района Западно Казахстанской области.

Система водоснабжения принята хозяйствено-питьевого назначения.

В состав строительства входят:

1. Подводящий водовод

1.1. Водовод от Головного водозабора до здания для установки очистки воды «ДВУ-100-56» из труб ПЭ 100 SDR 11 - 75х6,8 мм, протяженность L= 0,075 км, водовод из труб ПЭ 100 SDR 11 Ø280х25,4 мм, протяженность L= 77,367 км, в том числе, водопроводных колодцев Ø2000 мм – 41 шт, в том числе дренажных колодцев Ø2000 мм – 14 шт, колодцев Ø1500 мм – 14 шт;

1.2. Водовод от здания для установки очистки воды «ДВУ-100-56» до существующего колодца 3А из труб ПЭ100 SDR 11 - 225х13,4 мм, протяженность L= 662,0 м.

2. Площадка головного водозабора

2.1. Площадь участка Головного водозабора F= 7200 м2, протяженность сетчатого ограждения территории – 360 п.м. (Н=2,0 м), площадь покрытий дорог и площадок – 1336 м2 (щебеночное толщ. 7,0 см., обработанное битумом, основание ПГС – 5,0 см), озеленение: посев травы – 4490 м2., посадка деревьев – 59 шт., кустарников (живая изгородь) – 257 п.м.

2.2. На площадке расположены три водозаборных скважин с насосными камерами подземного типа со сборными стенами из железобетонных колец диаметром 2,0 м, глубина каждой скважин – 80 м, скважинные насосы Lowara Z631 13-L6W ELP 380-415 50 с электродвигателем L6W185T405/B, напор Н=140,0 м, подача воды – 30,0 м3/час

2.3. На площадке располагается Здание для установки электрооборудования - кирпичное здание с размерами в плане 3,0х3,0 м выстой помещения 2,5 м.

3. Площадка для здания для установки очистки воды ДВУ-100-56

3.1.Площадь участка для здания установки очистки воды F= 1755 м2, протяженность глухого ограждения из проф. листов – 168 п.м (Н=2,2 м), покрытия дорог и площадок участка для здания установки очистки воды – 210 м2 (щебеночное с толщ. 7,0 см., обработанное битумом, ПГС – 7,0 см); площадь покрытия подъездной дороги – 468,5 м2 (щебеночное с толщ. 7,0 см., обработанное битумом, ПГС – 7,0 см) , озеленение: посев травы – 1352 м2., кустарников (живая изгородь) – 116 п.м.;

3.2. Здание для установки очистки воды ДВУ100-56 с насосами - кирпичное здание с размерами в плане 6,0х15,0 м. выстой помещения - 3,0 м.

3.2. Установка обеззараживания воды серии ДВУ-100-56, подача воды потребителю - 55,3 м3/час, напор Н= 71,5 м.

4. Площадка естественных испарителей – промывные воды от установки очистки воды по канализации сбрасываются в выгреб, из выгреба по канализационному коллектору сбрасываются на естественные испарители.

4.1. Общая площадь площадки естественных испарителей -972 м2., протяженность сетчатого ограждения территории –126 п.м. (Н=2,0 м);

4.2. Естественные испарители - две карты с размером в плане 6,5х5,5 м, глубиной 1,5 м каждая, дно и откосы защищены полиэтиленовой пленкой;

4.3. Сбросная канализационная линия из труб ПЭ 100 SDR 26 - 110х4,2 мм, общей протяженностью L=88,2 м;

4.4. Выгреб емкостью V= 14 м3 - бетонная сборная конструкция из колодцев диаметром 2,0 м.

5. Линия электропередачи ВЛ-10 кВ /0,4кВ

5.1. Линии электроснабжения ВЛ-10 кВ Головного водозабора, протяженность L= 17,807 км., стоек СВ105-342 шт, СНВ-7-13 – 5 шт, Провод ЗАС50/0,8, - 53 421 м, кабель АСБ-10-3х50 – 133 м;

5.2. Сети 0,4 кВ площадки Головного водозабора - установка КТПН 10/0,4кВ–63 кВА – 1комплект, опоры СВ95-2а – 19 шт, самонесущий провод 2х25 мм2 СИП -2 - 320 п.м., светильники ЖКУ-06-250, провод ПВС-3х2,5 мм2 – 50,0 м, кабельная линия – 110 м, кабель АВББ;

5.3. Сети 0,4 кВ Площадки для здания очистки воды ДВУ-100-56, Стойки СВ95-2а – 23 шт, самонесущий провод 2х25 мм2 СИП -2 - 280 п.м. , светильников, тип ЖКУ-06-250 - 7 шт, провод ПВС 3х2,5 мм2 – 40 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2019 г.**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**;

фактически, месяц: **10**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водоснабжения с. Жымпиты Сырымского района ЗКО из месторождения подземных вод Кенаши»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мыханов Бердибек Сартаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати
(при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«_____» _____2020 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «MSK Engineering», Манкеев Жомарт Нуркисаевич , г.Алматы, Айтеке Би, 134/1, 28**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Акнурова Нурлана Айтмухамбетовича, аттестат №KZ87VJE00026470 от 23.05.2017 г., №KZ43VJE00037932 от 18.05.2018 г., №KZ70VJE00037931 от 18.05.2018 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора о государственных закупках услуг №47 от 19.10. 2019**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство водоснабжения с. Жымпиты Сырымского района ЗКО из месторождения подземных вод Кенащы»** ,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», Заместитель Председателя Аяшев Максат Темирбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2019 г.**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц **10**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**;

фактически, месяц: **10**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **2 364 115,79** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 835 311,56** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **528 804,231** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой)_____
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «MSK Engineering»**
наименование организации
эксперт(ы) по техническому надзору
Акнуров Нурлан Айтмухамбетович, аттестат №KZ87VJE00026470 от 23.05.2017 г., №KZ43VJE00037932 от 18.05.2018 г., №KZ70VJE00037931 от 18.05.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов
_____
подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____»_____2020 года

Авторский надзор__**Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэкология жобалау», директор Абдиров Ерлан Максутович** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице__**Абдирова Ерлана Максутовича** _____

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании _**договора о государственных закупках услуг №34 от 11.11.2019**_____

№ договора и дата

по объекту: _**«Строительство водоснабжения с. Жымпиты Сырымского района ЗКО из месторождения подземных вод Кенащы»** ,_____

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является _**Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», Заместитель Председателя Аяшев Максат Темирбекович** ___

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)__**Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001 г.**_

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице___**генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича** _

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

начало работ _____**ноябрь 2019 г.**;_____

месяц, год

окончание работ _____**октябрь 2020 г.**;_____

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:___**10**___ ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____**10**_____;

фактически, месяц: ___**10**___;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ»,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой)_____
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор **Абдиров Ерлан Максутович**
фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись эксперта
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Лебедева
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	киломерт (далее – км)	575,3
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	19,207
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	105,31
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	391
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,155
	2) алюминиевые	км	58,221
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	20
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	20
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		

	1) марки... напряжением 10кВ	км	0,133
	2) марки... напряжением 0,66/1 кВ	км	0,295
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	1
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	
	4) щебеночное	м2	120

Заказчик **Аяшев Максат Темирбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя

Место печати
(при наличии)

Авторский надзор **Абдиров Ерлан Максутович**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	78 028,5	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) полиэтиленовых труб Ø280х25,4 мм	м	77 367	
	5) полиэтиленовых труб Ø225х13,4 мм	м	661,5	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	44	
	Задвижка d-300 мм	шт	43	
	" d- 200 мм	шт	1	
	" d- 100 мм	шт	18	
	" d- 80 мм	шт	1	
	" Вантуз В-6-100	шт	15	
	" Вантуз В-6-50	шт	1	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		

	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	44	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб Ø110х4,2 мм	м	44	
2	**Канализационная сеть (общая протяженность)**	м	44,2	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб Ø110х4,2 мм	м	44,2	
3	Прочие устройства			
	Выгреб 14,0 м3	шт	1	
	Смотровой колодец	шт	2	
	Выпуск	шт	2	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____
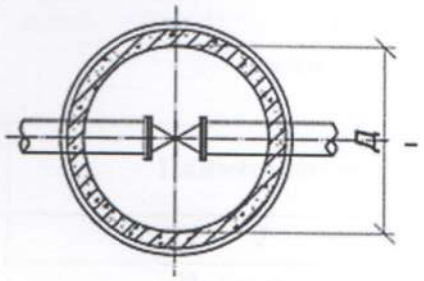	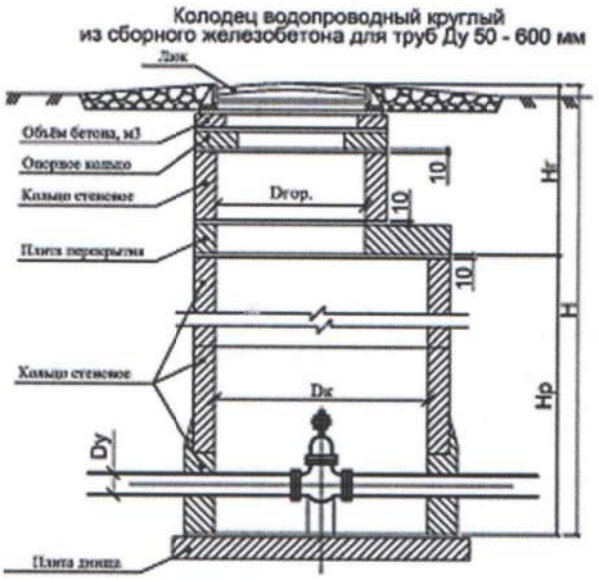

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Колодец смотровой	В-1	Сборные ж/б конструкции	Ø2000 мм	19	
2	Колодец поглощающий (дренажный)	В-1	Сборные ж/б конструкции	Ø2000 мм	14	
3	Колодец смотровой	В-1	Сборные ж/б конструкции	Ø1500 мм	13	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Аяшев Максат Темирбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя

Место печати
(при наличии)

Авторский надзор **Абдиров Ерлан Максутович**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта

Место печати
(при наличии)
