Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат на 19 декабря 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		243	15.08.2019						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**83 120 554**	**6 900 279**							**828 033**	**7 728 312**

Заказчик: ГУ "отдел строительства города Кокшетау"

Зам.руководителя _____ Оспанов Р.С.

Подрядчик: "ТОО "АсарСтройСервис"

Генеральный директор _____ Оразахынов Б.С.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание пристройки

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243 от 15.08.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4 от 19 декабря 2019 года

за декабрь 2019 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
25	**Е11-060701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство**		24	32390,81	4521,74	777379	108522	473432	195201	1050386
			м3		8142,75	795	195426	19080		77806	
26	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		1,342	211555		283907		283907		306619
			т							22713	
27	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,41178	270167,7	2096,1	111250	863	87882	21155	142997
			т металлических изделий		54651,6	590,76	22504	243		10592	
28	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,41178	211555		87114		87114		94083
			т							6969	
29	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,11565	270167,7	2096,1	31245	242	24682	5942	40161
			т металлических изделий		54651,6	590,76	6320	68		2975	
30	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,1079	191399		20652		20652		22304
			т							1652	
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ									1311546,81
		Раздел: СТЕНЫ									
80	**Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**		45	31685,3	2024,05	1425839	91082	1024065	304968	1869271
			м3 кладки		6904,26	382,9	310692	17231		138465	
81	**Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка**		58	27000,19	2024,05	1566011	117395	1225839	227836	1937355
			м3 кладки		3840,98	382,9	222777	22208		143508	
83	**Стоимость по коммерческому предложению ТОО "УОпТЕМ УАРi.Kz"**	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OLE-120 мм**		40	32559,82		1302393		1302393		1406584
			м3							104191	
		Итого по разделу: СТЕНЫ									4294242,67

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**5605790**	**318104**	**4529966**	**755102**	**6869760**
							757719	**58829**		**508871**	
		В том числе :									
		Накладные расходы									**755101**
		Сметная прибыль									**508871**
		Итого с временными			**1,5 %**				**103 046**		**6 972 808**
		Итого с зимними удорожаниями			**2,772 %**				**193 286**		**7 166 094**
										508 871	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**7 523 654**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**7 666 976**
		Итого с НДС			**12 %**				**920 037**		**8 587 013**
		тендерная скидка 10%									**858 701**
		итого к оплате									**7 728 312**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Зам.руководителя :
Оспанов Р.С.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт
Жабагин З.К.

Авторский Надзор:
ТОО "КӨКШЕ-ҚҰРЫЛЫС-Р"
Эксперт
Грот С.В.
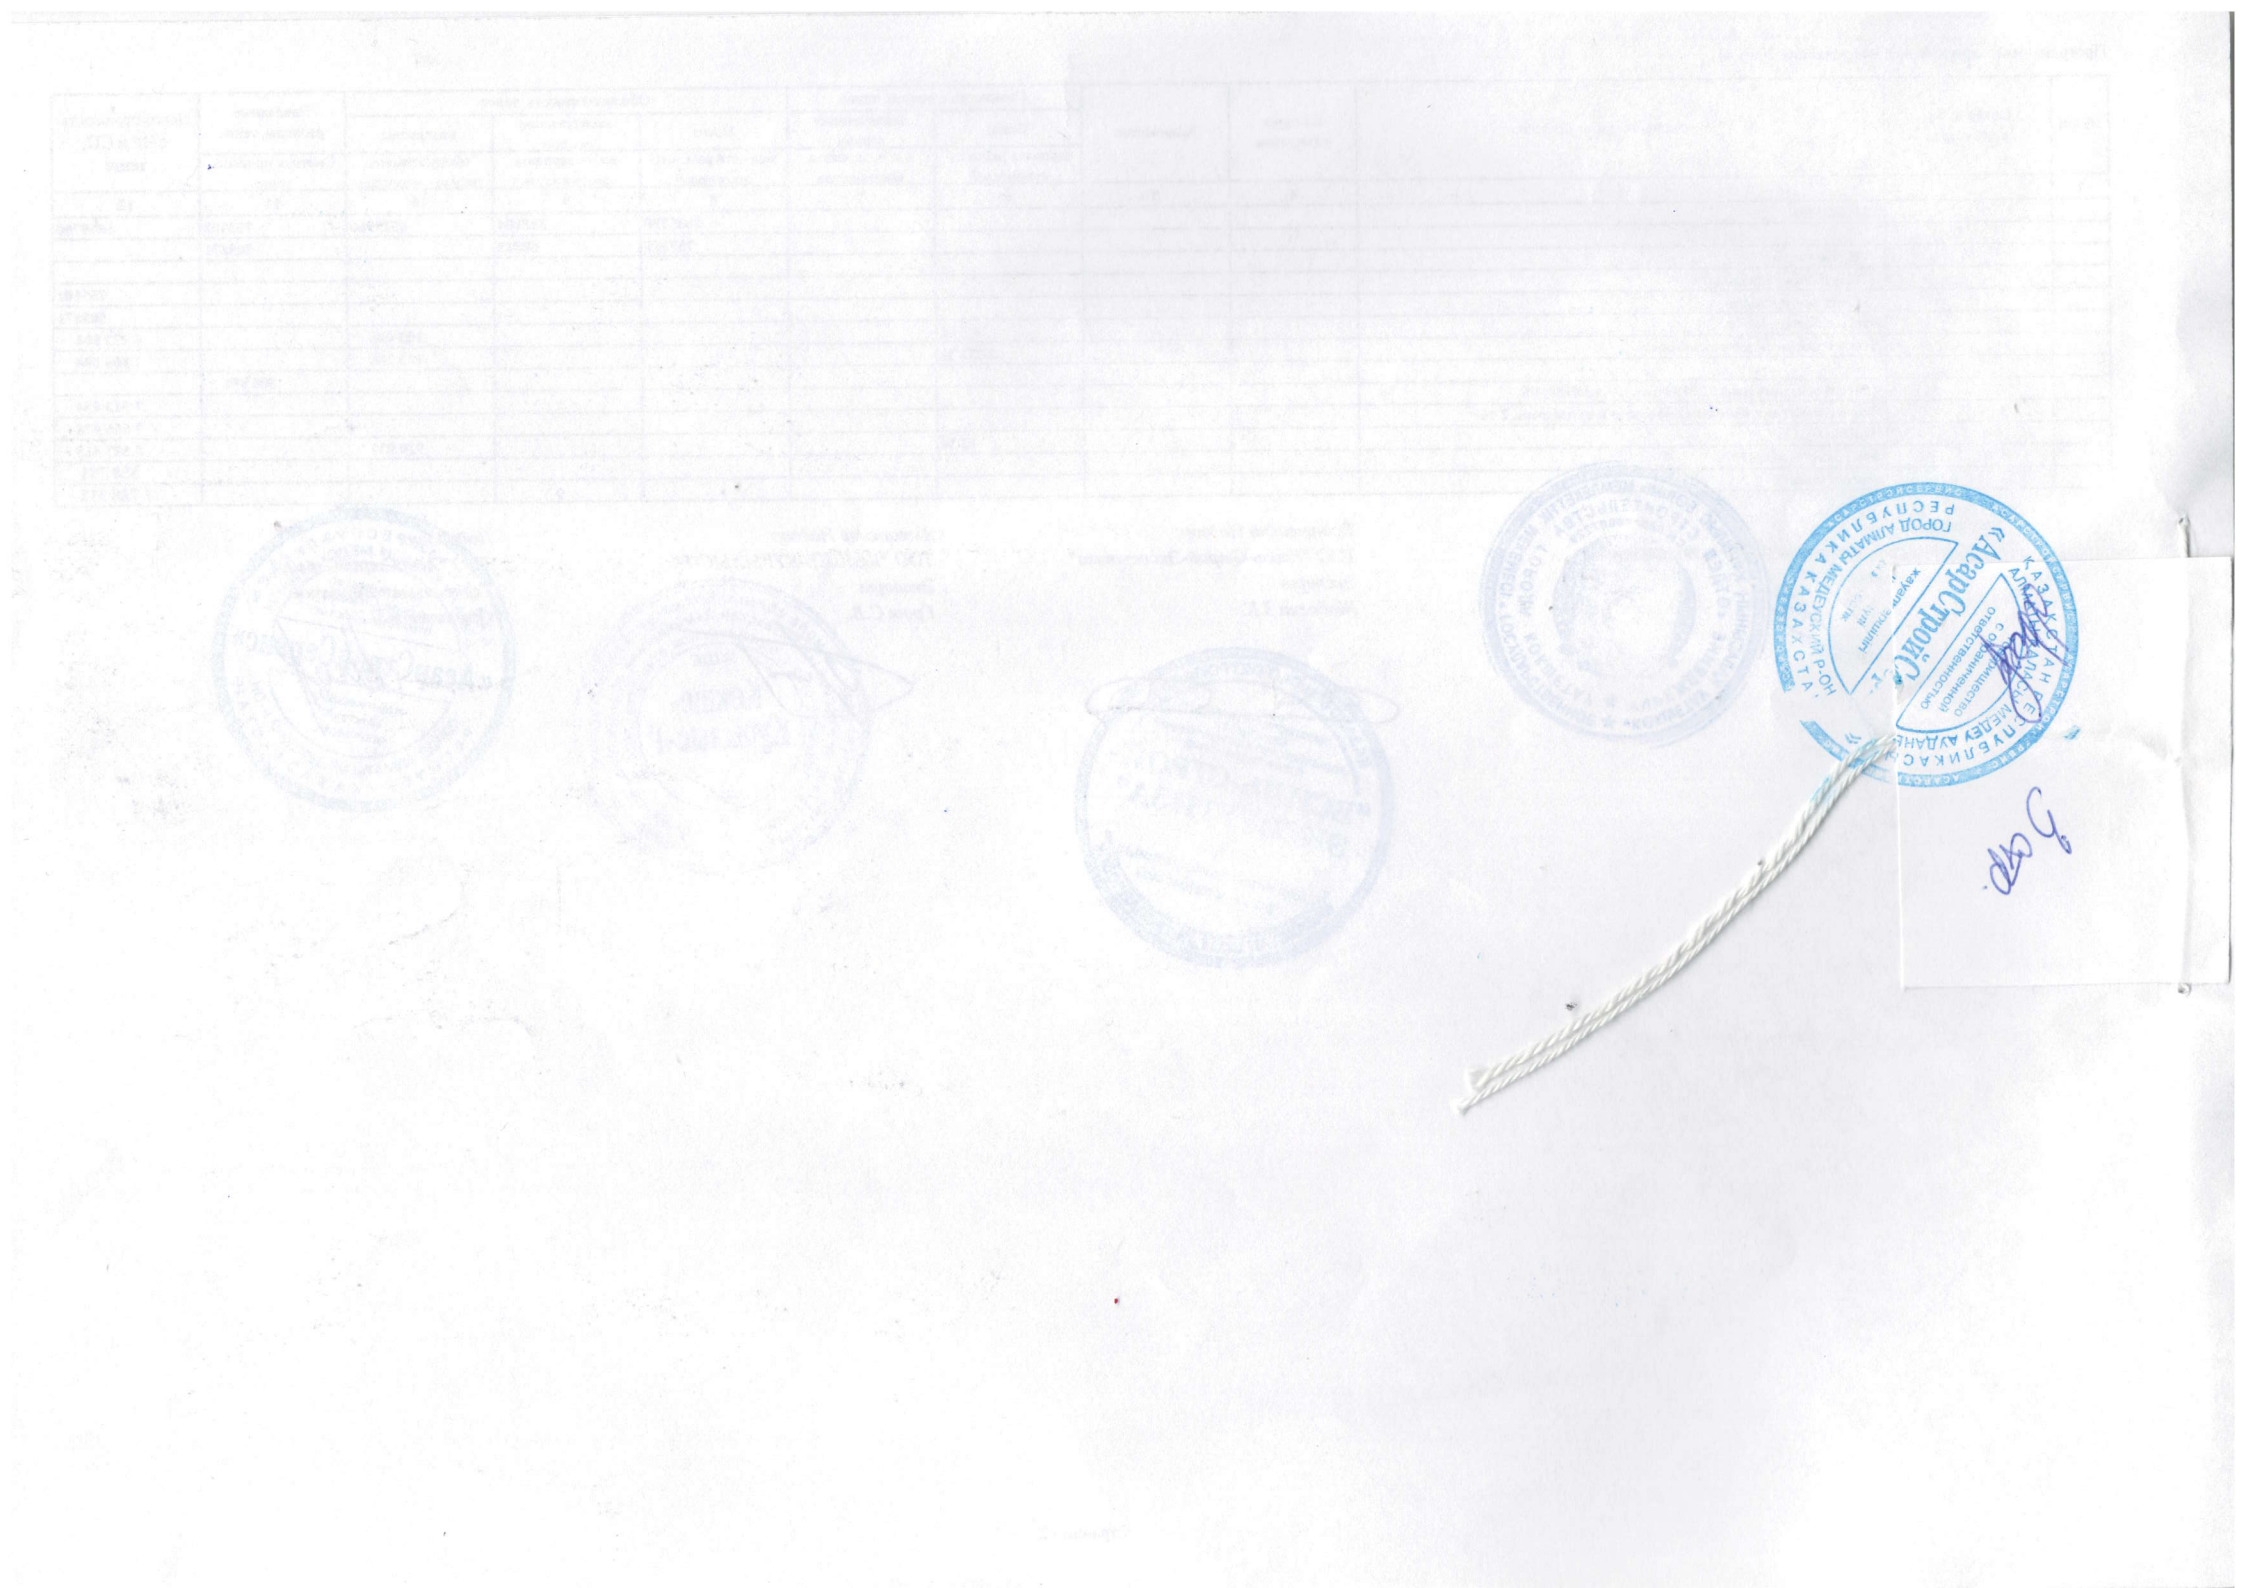
Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.
