Генпроектировщик

ТОО "СанжарПроектСервис"

Субпроектировщик

ТОО "ПроектГруппСервис"

ЗАКАЗ: №30-05/20
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство сетей электроснабжения для индивидуальных жилищных строительств в г.Зайсан ВКО»

Том 6

30-05/20 - АС

Архитектурно-строительные часть
КТПН

Директор ТОО «Санжар Проект Сервис»: Абдуллаева А.С.

Главный инженер проекта: Дюсен О.

Схема расположения элементов фундамента

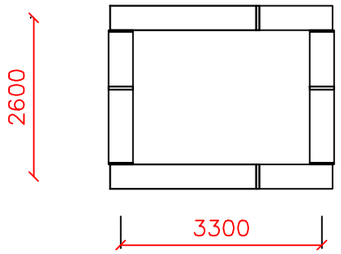





Экспликация сооружений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2.	Кат. помещения
1	Блочно–модульное здание КТПГ	8.25	Д

Спецификация расхода материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание
		Блочно–модульное здание КРУН		
1	ГОСТ 13579–78	ФБС 24.4.6	2	1300
2	ГОСТ 13579–78	ФБС 12.4.6	4	640
3	ГОСТ 13579–78	ФБС 9.4.6	2	470
		Щебень	1.8 м3	
		Бетон кл. В7.5	0.80 м3	

Примечания:

1. Под подошвой фундаментов выполнить подготовку из щебня толщиной 100мм, пропитанную битумом до полного насыщения.
2. Бетонные боковые поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.
3. По верху фундаментных блоков выполнить выравнивающую подливку из цементно песчанного раствора м100 толщиной 20мм.
4. Отмостку выполнить после подводки и прокладки кабелей.
5. Расположение фундамента под оборудование смотреть совместно с электрической частью проекта.
6. Монолитные заделки между блоками выполнить из бетона кл. В7.5 на сульфатостойком портландцементе.
7. Спецификация дана для одного КТПГ, а всего:
   - КТПГ–100/10/0,4кВ – 2шт;
   - КТПГ–160/10/0,4кВ – 2шт;
   - КТПГ–250/10/0,4кВ – 3шт;
   - КТПГ–400/10/0,4кВ – 3шт;

изм.	кол.	лист	№док.	подпись	дата
ГИП		Дюсен О.			11.20
Разраб.		Каражан Н.			11.20
Проверил		Аханова А.			11.20
Нор. контр		Аханова А.			11.20

«Строительство сетей электроснабжения для индивидуальных жилищных строительств в г. Зайсан»

Архитектурно–строительные решения сооружений подстанции	Стадия	Лист	Листов
	РП	5	

КТПГ. Схема расположения элементов фундамента. Разрез 1–1, 2–2.

ТОО "СанжарПроектСервис" Кызылорда 2020г.

ФОРМАТ А3

Схема расположения элементов фундамента

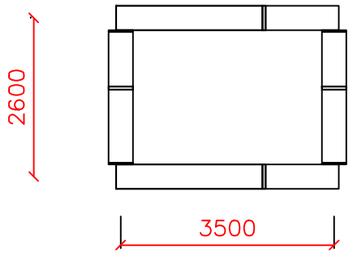





Экспликация сооружений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2.	Кат. помещения
1	Блочно–модульное здание КТПГ	8.75	Д

Спецификация расхода материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание
		Блочно–модульное здание КРУН		
1	ГОСТ 13579–78	ФБС 24.4.6	2	1300
2	ГОСТ 13579–78	ФБС 12.4.6	4	640
3	ГОСТ 13579–78	ФБС 9.4.6	2	470
		Щебень	1.8 м3	
		Бетон кл. В7.5	0.80 м3	

Примечания:

1. Под подошвой фундаментов выполнить подготовку из щебня толщиной 100мм, пропитанную битумом до полного насыщения.
2. Бетонные боковые поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.
3. По верху фундаментных блоков выполнить выравнивающую подливку из цементно песчанного раствора м100 толщиной 20мм.
4. Отмостку выполнить после подводки и прокладки кабелей.
5. Расположение фундамента под оборудование смотреть совместно с электрической частью проекта.
6. Монолитные заделки между блоками выполнить из бетона кл. В7.5 на сульфатостойком портландцементе.
7. Спецификация дана для одного КТПГ, а всего:
   – КТПГ–1000/10/0,4кВ – 3шт

изм.	кол.	лист	№док.	подпись	дата	«Строительство сетей электроснабжения для индивидуальных жилищных строительств в г.Зайсан»			
ГИП		Дюсен О.			11.20	Архитектурно–строительные решения сооружений подстанции	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Каражан Н.			11.20		РП	6	
Проверил		Аханова А.			11.20				
						КТПГ. Схема расположения элементов фундамента. Разрез 1–1, 2–2.	ТОО "СанжарПроектСервис" Кызылорда 2020г.		
Нор. контр		Аханова А.			11.20				
