Акт приемки сдач

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздан
№632 бұйрығына
№1 Қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
нысан

**Объектіні пайдалануға қабылдау актісі**

2020 жылғы "15" 12

Тапсырыс беруші «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ 141200, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Энергетиктер көшесі, 62, басшысы Газиз Исатаевич Оспанов
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы,
пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат(стационарлық үй-жайлар) нөмірі

негізінде

Сәйкестік туралы декларация 2020ж.«15» 12 , «Горэлектросеть» ЖШС, Басқарма Төрайымы Майгуль Аскаровна Олжабаева, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 12
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса жіберілді) 2020ж.«15» 12 , «Атлантис-ПВ» ЖШС, Тудахун Турсунович Турсунов, № KZ 84VJE00043887 21.01.2019 ж-дан
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса жіберілді) 2020ж.«15» 12 , «ES-ПРОЕКТ» ЖШС, Бахытгул Нурмухановна Кабдышева
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің
аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күнімердігердің (бас мердігердің)

жобаны пайдалануға қабылдау үшін мердігер (бас мердігер) ұсынған объектінің дайын екендігін тексеруді:**«Екібастұз қаласының солтүстік бөлігіндегі жарықтандыру желілерінің құрылысы»** .
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау,
техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

мекенжайы бойынша Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, солтүстік бөлігі
облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) жер теліміне құқық белгілейтін құжат 2018 жылғы «12» шілдеден №99
(жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)
туралы_____,
шешім шығарған органның атауы)

_____20___жылғы «___» _____ № __шешімі.

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы «Павлодар облысының мемлекеттік және жерді бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 23.07.2020 года №KZ75REA00184498, 21.09.2020 года №KZ05REA00191966, 19.11.2020 года №KZ47REA00200425 ж-дан талоны
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ, 2018 жылғы 19 қыркүйектен №181 бұйрығымен__ бекітілген жобаны (бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні)
«ES-ПРОЕКТ» ЖШС
(жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі)
жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы_2020ж. шілде___ ;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы _2020ж. желтоқсан__;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша __2__ ай;
нақты _5_ ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| Желі кернеулігі | кВ | 380 | | 380 | |
| Электр берілісінің жоғары вольтты желілер тірегіне арналған дірілмен нығыздалған темір-бетон тағандар, маркасы | дана | 621 | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СВ 110-3,5 | | | | | |
| Дірілмен нығыздалған темір-бетон тағандар, маркасы СВ 105 | дана | 0 | | 502 | |
| Электр берілісінің әуе желісіне арналған оқшауланған өзін көтеруші сым ӨОС-4 4*25-0,6/1,0 | км | 14,512 | | 16,385 | |
| Электр берілісінің әуе желісіне арналған оқшауланған өзін көтеруші сым ӨОС-4 4*16-0,6/1,0 | км | 0,28 | | 0,28 | |
| Жарық диодты көше шамы, маркасы PROLED SL-72, қуаты 92Вт | дана | 486 | | 519 | |
| Күштік кәбілдер АВВГнг(В)-LS 4*25(ок)-1 | км | 0,2 | | 0,19 | |
| Күштік кәбілдер АВБбШв 4*25(ок)-1 | км | 1,3545 | | 0,9822 | |
| Прожекторлық діңгегі ПМО-18 | дана | 4 | | 4 | |
| Arena Megaliht NEW 600/5000 IP65 прожекторы | дана | 0 | | 12 | |
| Бұранды жалғағышты rek-1КнТ-16/50-В-М типті үзілмелі бастиекті 1кВ кернеулі төрт тінді кәбілге арналған шеткі муфталар | дана | 48 | | 26 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ULS 1000 прожекторы | дана | 12 | | 0 | |
| ПР 8503-1004-54УХЛ2 тарату пункті | дана | 1 | | 1 | |
| Меркурий 233 ART2-03 RKG санауышы бар ИП Бк 100-07/14 сыртқы жарықтандыруды басқаратын шкаф, ФР-7 фоторелесі | дана | 6 | | 6 | |
| SEC STPi36 қуат реттегіші | дана | 6 | | 0 | |
| SEC STPi36 жарықтандыруды сымсыз басқару шкаф | дана | 0 | | 6 | |

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Көшелердің сыртқы жарықтандыруы СВ-105 маркалы темір бетон тіректерінде СИП-4 маркалы өзін көтеруші оқшауланған сыммен орындалған, SL-72 маркалы жарықдиодты шамдар, қосылым нүктесінен жеткізу желісі АВБбШв-1кВ кәбілімен орындалған;

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 211 366,95 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 199738,726 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 190 192,732мың теңге,оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 179 568,656 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

**«Екібастұз қаласының солтүстік бөлігіндегі жарықтандыру желілерінің құрылысы»** объектінің (кешеннің) атауы
пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші _____Оспанов Газиз Исатаевич_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау_____Турсунов Тудахун Турсунович_____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау _____Кабдышева Бахытгул Нурмухановна_____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) _____Олжабаева МайгульАскаровна_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

север

| | |
|---|---|
| | Объектіні пайдалануға<br>қабылдау актісіне<br>3-қосымша |
| | нысан |

**Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)**

| № р/с | Атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | 0,4кВ төмен кернеудегі әуе ӘБЖ... | Километр (бұдан әрі – км) | 16,665 |
| 2 | 35, 10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ... | км | 0 |
| 3 | Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ... | км | 1,1722 |
| 4 | Жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ... | км | 0 |
| 5 | Тіректер ауданы | $м^2$ | |
| 6 | Тіректер: | | |
| | 1) металл | дана | 0 |
| | 2) ағаш тіреуі бар ағаш | дана | 0 |
| | 3) темірбетон тіреуі бар ағаш | дана | 0 |
| | 4) темірбетон | дана | 502 |
| | 5) сымарканды аспалар | дана | 0 |
| 7 | Сымдар: | | |
| | 1) мыс | км | 0 |
| | 2) алюминий | км | 0 |
| | 3) құрыш алюминий | км | 0 |
| | 4) өзін көтергіш оқшауланған сым ӨКОС | км | 16,665 |
| 8 | Шырақтар үшін кронштейндер: | | |
| | 1) темірбетон | дана | 0 |
| | 2) металл | дана | 519 |
| 9 | Көше жарығы арматурасы: | | |
| | 1) қызу шамы бар шырағданы | дана | 0 |
| | 2) сынап шамы бар шырағданы | дана | 0 |
| | 3) люминесцентті шамдары бар шырағданы | дана | 0 |
| | 4) жарықдиодты энергия үнемдейтін шырақтар | дана | 519 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Кәбілдер: | | |
| | 1) 0,4кВ кернеулі АВВГ маркалы 4*25 | км | 0,19 |
| | 2) 0,4кВ кернеулі АВБбШв маркалы 4*25 | км | 0,9822 |
| 11 | Біріктіретін жалғастырғыштар | дана | 0 |
| 12 | Соңғы жалғастырғыштар | дана | 26 |
| 13 | Жерге қосу сұлбасы | дана | 502 |
| 14 | Найзағайдан қорғау құрылғысы | км | 0 |
| 15 | Кәбіл желілерін жол жабыны: | | |
| | 1) асфальтбетон | $м^2$ | 0 |
| | 2) жұмыр тас | $м^2$ | 0 |
| | 3) жаяужолдар | $м^2$ | 0 |

Тапсырыс беруші _____Газиз Исатаевич Оспанов_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөр орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау_____Бакытгул Нурмухановна Кабдышева_____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөр орны (болған жағдайда)

ЖШС "ES-ПРОЕКТ" ТОО

п. 10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

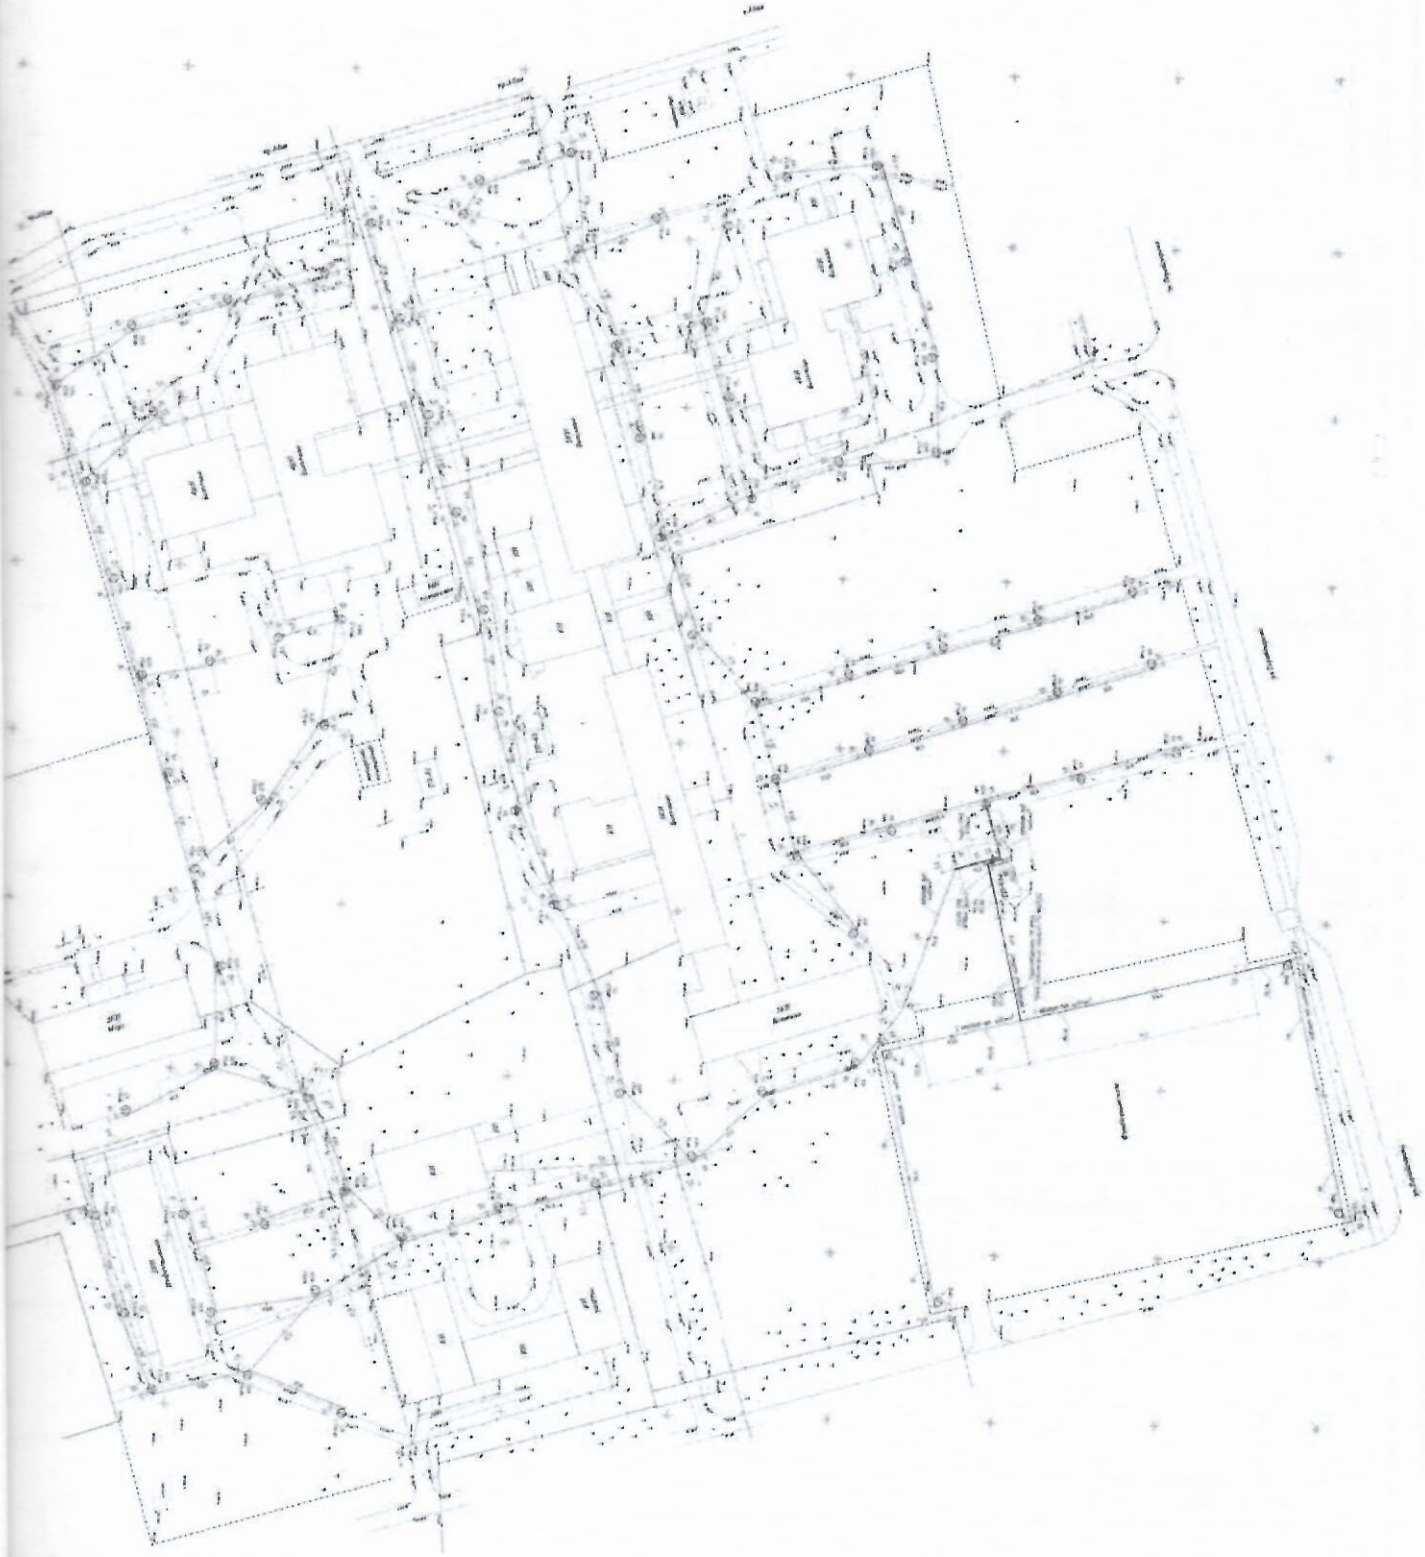

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического ложения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) полнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

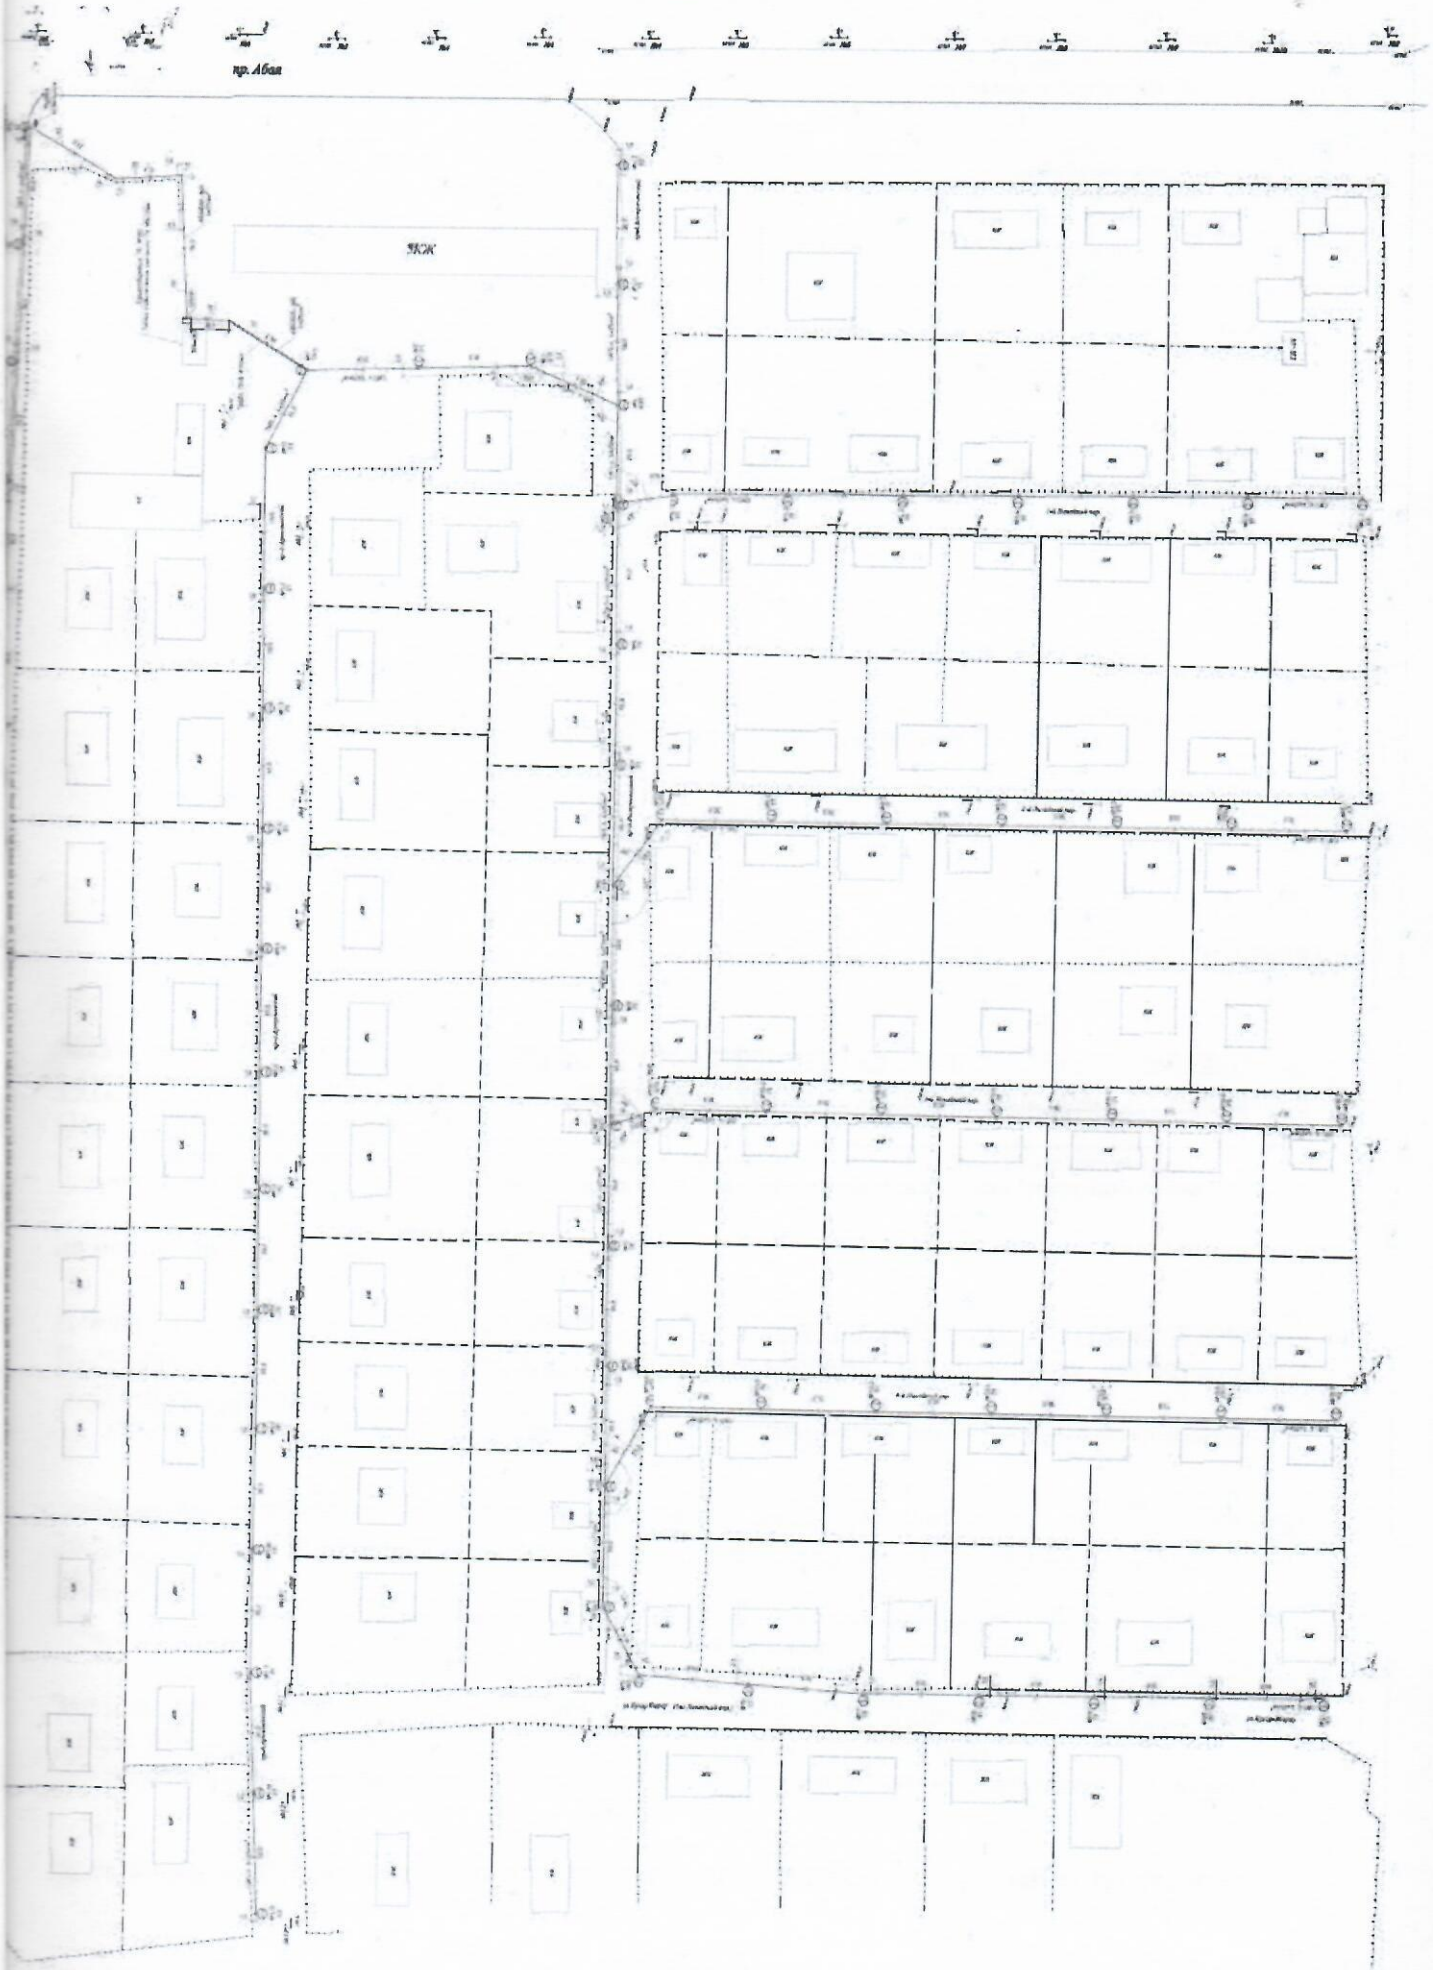

| | |
|---|---|
| | Приложение 1<br>к приказу Министра<br>индустрии и инфраструктурного развития<br>Республики Казахстан<br>от 9 августа 2019 года № 632 |
| | |
| | Утвержден<br>приказом Министра<br>по инвестициям и развитию<br>Республики Казахстан<br>от 24 апреля 2017 года № 234 |
| | форма |

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«15» декабря 2020года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», 141200, Павлодарская обл.,город Экибастуз, улица Энергетиктер, 62, руководитель Оспанов Газиз Исатаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 15 декабря 2020г., ТОО «Горэлектросеть», Председатель Правления Олжабаева Майгуль Аскаровна, Павлодарская область, город Экибастуз, Ауэзова, 12

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 15 декабря 2020г., ТОО «Атлантис-ПВ», Турсунов Тудахун Турсунович № KZ84VJE00043887 от 21.01.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 15 декабря 2020г., ТОО «ES-ПРОЕКТ», Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к

приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство линии освещения в северной части города Экибастуза»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, город Экибастуз, северная часть

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)Правоустанавливающего документа на земельный участок от 12.07.2018года №99

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменения или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных бридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного и земельного контроля Павлодарской области», 23.07.2020 года №KZ75REA00184498, 21.09.2020 года №KZ05REA00191966, 19.11.2020 года №KZ47REA00200425.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ES-ПРОЕКТ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ №181 от 19.09.2018 год

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2020г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Напряжение сети | В | 380 | | 380 | |
| Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ-110-3,5 | шт | 621 | | 0 | |
| Стойки железобетонные вибрированные, марка СВ-105 | шт | 0 | | 502 | |
| Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*25 - 0,6/1,0 | км | 14,512 | | 16,385 | |
| Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*16 - 0,6/1,0 | км | 0,28 | | 0,28 | |
| Светильник уличный светодиодный, марки PROLED SL-72, мощность 92Вт | шт | 486 | | 519 | |
| Кабели силовые АВВГнг(В)- LS 4*25(ок)-1 | км | 0,2 | | 0,19 | |
| Кабели силовые АВБбШв 4*25(ок)-1 | км | 1,3545 | | 0,9822 | |
| Мачта прожекторная ПМО-18 | шт | 4 | | 4 | |
| Прожекторы марки Arena Megaliht NEW 600/5000 IP65 | шт | 0 | | 12 | |
| Муфты концевые для четырехжильного кабеля на напряжение 1кВ, с болтовым соединителями, со срывными головками типа rek-1КнТ-4-16/50-В-М | шт | 48 | | 26 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прожектор ULS 1000 | шт | 12 | | 0 | |
| Пункт распределительный ПР 8503-1004-54УХЛ2 | шт | 1 | | 1 | |
| Шкаф управления наружным освещением ИП Бк 100-07/14 со счетчиком Меркурий 233 ART2-03 RKG, фотореле ФР-7 | шт | 6 | | 6 | |
| Регулятор мощности SEC STPi 36 | шт | 6 | | 0 | |
| Шкаф беспроводного управления освещением ШУРНО SEC STPi 36 | шт | 0 | | 6 | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: наружное освещение улиц выполнено самонесущим изолированным проводом марки СИП-4 на железобетонных опорах марки СВ-105, светильники светодиодные марка SL-72, питающая линия от точки подключения выполнена кабелем АВБбШв-1кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 211 366,95 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 199 738,726 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 190 192,732 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 179 568,656 тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство линии освещения в северной части города Экибастуза»**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Оспанов Газиз Исатаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Турсунов Тудахун Турсунович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик)_____ Олжабаева Майгуль Аскаровна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

п. 10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

п. 10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

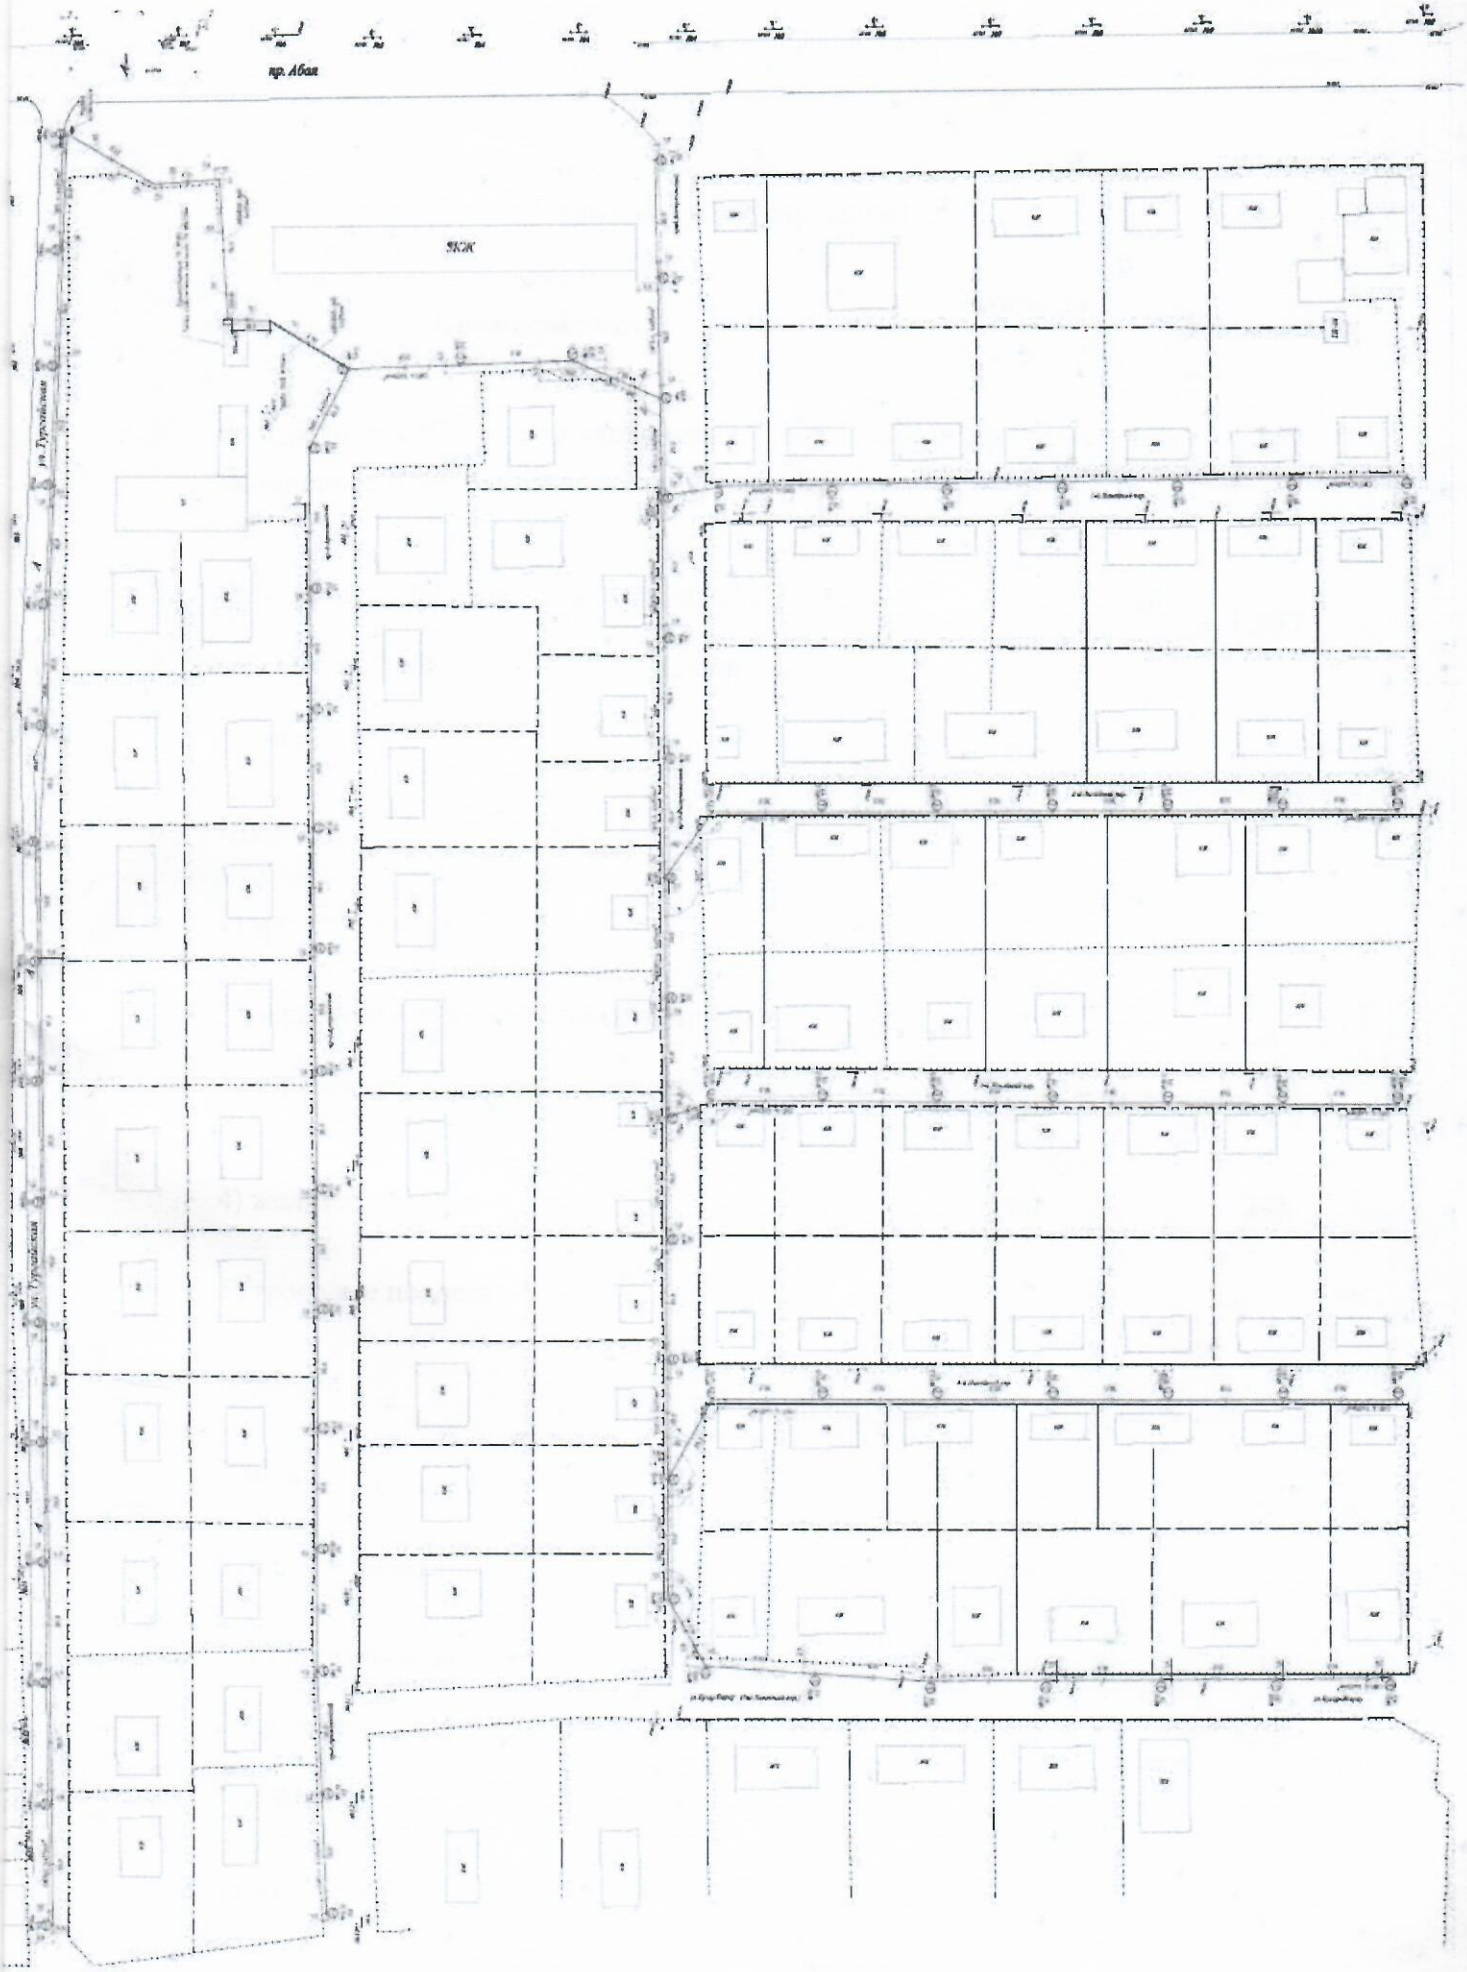

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта**
**(линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ | километр (далее – км) | 5,809 |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35кВ, 10 кВ | км | 0 |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км | 0,077 |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км | 0 |
| 5 | Площадь опор | м 2 | |
| 6 | Опоры: | | |
| | 1) металлические | штук (далее – шт) | 0 |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | 0 |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | 0 |
| | 4) железобетонные | шт | 248 |
| | 5) тросовые подвесы | шт | 0 |
| 7 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | 0 |
| | 2) алюминиевые | км | 0 |
| | 3) сталеалюминиевые | км | 0 |
| | 4) самонесущий изолированный провод СИП | км | 5,809 |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2) металлические | шт | 519 |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | 0 |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | 0 |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | 0 |
| | 4) светодиодные энергосберегающие светильники | шт | 519 |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) марки АВВГ 4*25 напряжением 0,4кВ | км | 0,19 |
| | 2) марки АВБбШв 4*25 напряжением 0,4кВ | км | 0,9822 |
| 11 | Муфты соединительные... | шт | 0 |
| 12 | Муфты концевые | шт | 26 |
| 13 | Контуры заземления | шт | 502 |
| 14 | Устройства грозозащиты | км | 0 |
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | $м^2$ | 0 |
| | 2) булыжные | $м^2$ | 0 |
| | 3) тротуары | $м^2$ | 0 |

Заказчик_____Оспанов Газиз Исатаевич_____

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя* *М.П.(при наличии)*

Авторский надзор_____Кабдышева Бакытгул Нурмухановна_____

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* *М.П.(при наличии)*

14:219:070:601

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Рустембекова
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2021 ж. «06» 01.

Регистрация прилегающих земельных участков

Екібастұз қалалық тіркеу және жер кадастры бөлімі

Өтініш 00221504485 1416/96967
21.01.2021
14:219:070:601:1 10117

1. Екібастұз

Тіркеуші Нуртаева

Бөлім бастығы Сагинов Қолы

Жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Екібастұз қаласының бөлімі

Өтініш № 00220491535 1416/96967
26.01.21
Кадастрлық № 14:219:070:601:1 10126

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
ул. Жетысова

Тіркеуші (маман) Дмитриева

Бөлім бастығы Сагинов Қолы

Получено, мерзім белгіленді
Қолы
Прошито, пронумеровано, скреплено ___ парақта
Печать
Подпись
