ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

24
КІРІС № 19. 08 2021 ж.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

пос.Шиели. от «19» августа 2021 года

Заказчик: **Шалбаев Ғалым Серікұлы - И.о Руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от«18» августа 2021 года **ТОО «Транс Азия Констракшн» Генеральный директор Атаниязов Сулеймен Кошниязович. город Кызылорда ул.Кошербева 94.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «____»_____ 2021 года **ТОО «АскарТау-2016» Технический надзор Ысқақов Мейірбек Әбсалұлы №KZ67VJE00066309, KZ40VJE00066310, KZ94VJE00066308. от 21.06.2021г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о качестве строительно-монтажных работот «18» августа 2021 года **ТОО «ДосСтройПроект» Ахметов Аманкелди Байдуллаевич – инженер проектировщик, №00638 от 19.10.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Кызылординская область, Шиелийский район, пос. Н.Бекежанов.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона начале строительно-монтажных работ: о приеме уведомления о **KZ37REA00204873 от 25.12.2020г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «ДосСтройПроек» №70-2018**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «26» декабрь 2020 года;

месяц, год

окончание работ: «16» августа 2021 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 8 месяц;

фактически 7 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области» имеет следующие показатели**:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь територии под газопроводом и ГРПШ	га	3,24	3,24
Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором давления РДГ-50/30,РДНК-1000, с измерительным комплексом RVG G160(1:160) с корректором ЕК-280, с обогревом	комп	2	2
Протяженность газопровода: ГВД=0,6МПа	м	364,5	1026
Протяженность газопровода: ГНД=0,003МПа от ГРПШ-1	м	15223,2	15 295,2
Протяженность газопровода: ГНД=0,003МПа от ГРПШ-2	м	13759,5	14 103,5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**Целью настоящего проекта является газификация населения, коммунально-бытовых и социальных предприятий села Н.Бекежанова,Керделинского аульного округа,Шиелийского района Кызылординской области.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытэлектроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **416 291,014-00** тысяч тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ **364 579,624-00** тысяч тенге без НДС, оборудования, инструмента и инвентаря **7 108,781-00** тысяч тенге без НДС;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **416 291,014-00** тысяч тенге с НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных **работ 364 579,624-00** тысяч тенге без НДС;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7 108,781-00** тысяч тенге без НДС;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»**принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ғ. С. Шалбаев**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (для юр.лиц – М.П.)

Технадзор **М.Ә. Ысқақов**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **А. Б. Ахметов**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) **С. К. Атаниязов**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»

№ п.п.	Наименование	Единицы измерения	Количество	Примечание
1	**Протяженность газопровода: ГВД=0,6МПа в том числе;**	м	1026	
2	Труба ПЭ 100 SDR11D-110x10	м	61.5	
3	Труба ПЭ 100 SDR11D-90x8.2	м	964.5	
4	**Протяженность газопровода: ГНД=0,003МПа в том числе;**	м	29 398,4	
5	Труба ПЭ 100 SDR11D-225x13,4	м	655,5	
6	Труба ПЭ 100 SDR11D-160x9,5	м	2 932,3	
7	Труба ПЭ 100 SDR11D-110x6,6	м	976,2	
8	Труба ПЭ 100 SDR11D-90x5,6	м	5 456	
9	Труба ПЭ 100 SDR11D-63x3,8	м	14 514,4	
10	Труба ПЭ 100 SDR11D-32x3	м	4 864	
11	Количество крановой узел: ГВД ГНД	шт	669	
12	Молниеприемник МО1 L=9м.	комп.	2	

Заказчик

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта)

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 19
24 08 2021 ж.

Приложение 2
к приказу Министра о инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

от «18» августа **2021 года**

Авторский надзор **ТОО «ДосСтройПроект»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **директора К. Мырзаев.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **лицензий**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области».**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Ғ.Шалбаев.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (ген. подрядчиком) ТОО «ТрансАзияКонстракшн» ГСЛ №003161 от 20.02.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Атаниязов С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: ТОО «АЭS and Limited» №20001456 от 27.01.2020г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директор - Рахатұлы Ұ.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «26» декабря **2020 г.;**
месяц, год

окончание работ: «16» августа **2021 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства месяц;
фактически месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства - **нет**;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ДосСтройПроект» №70-2018**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района".**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «ДосСтройПроект» Мырзаев К. -директор**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **А. Ахметов. №00638 от 19.10.2018г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 24
19. 08 20 21 ж.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 08.02.2021 г)

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« *18* » августа 2021 года.

Технический надзор:
ТОО «Аскартау-2016»,
Әли Б.А.– директор,
город Кызылорда, улица Ахмеджана Нурекеева, дом № 9, БИН 160540023276,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, юридический адрес

в лице:
Ысқақов Мейірбек – технический надзор:
-аттестат KZ67VJE00066309 от 21.06.2021 года, аттестат KZ40VJE00066310 от 21.06.2021 года, аттестат KZ94VJE00066308 от 21.06.2021 года,

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: договора № 1905046 от 22.05.2019 г.

№ договора и дата

по объекту:
«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области».
по адресу: Республика Казахстан, Кызылординская область, Шиелийского района.

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**
Шалбаев Ғ. С. – И.о Руководителя

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «Транс Азия Констракшн» Лицензия ГСЛ № 18022466 выдана 13 декабря 2018 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: Атаниязов С.К. – директор;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «АЭS and Limited», Лицензия 20001456 выдана 20 января 2020 года,

наименование организации, № лицензии, и дата получения

в лице: Рахатұлы Ұлан – директор.

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области».

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь 2020 года,
месяц, год
окончание работ: август 2021 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
-по норме или по проекту организации строительства, месяц:
-фактически, месяц: .

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

№ п/п	Объект строительства	Стоимость, тенге	В том числе, тенге:		
			СМР	Оборудование	Прочие
1	Всего	416 291 014	408 329 179	7 961 835	

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

№ п/п	Объект строительства	Стоимость, тенге	В том числе, тенге:		
			СМР	Оборудование	прочие
1	Всего	416 291 014	408 329 179	7 961 835	

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), разработанным проектной группой ТОО «ДосСтройПроект»:
- проект №70-2018 ТОО «ДосСтройПроект»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" приказ №527 от 23. 03 2019 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государствнных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

6.1. Доля местного содержания строительства предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация:
ТОО «Аскартау-2016»,
Әли Б.А.– директор:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:
Ысқақов Мейірбек Әбсалұлы – технический надзор:
-аттестат KZ67VJE00066309 от 21.06.2021 года,
-аттестат KZ40VJE00066310 от 21.06.2021 года
- аттестат KZ94VJE00066308 от 21.06.2021 года,

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, дата получения, подпись

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 24
«19» 08 2021 ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«18» август 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Транс Азия Констракшн», город Кызылорда 120016,ул Кошербаева дом №94
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Атаниязов Сулейман Кошниязович – генеральный директор**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Н.Бекежанов. Керделинского аульного округа,Шиелийского района Кызылординской области»
По адресу: Село Н.Бекежанов. Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района». Шалбаев Г.С.- И.о Руководителя**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АЭS and Limited»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ДосСтройПроект». Проект №70-2018.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района».**
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая площадь территории под газопровода и ГРПШ	г	3,24	-	3,24	-
Протяженность газопровода высокого давления 0,6МПа DN 110-90мм.	м	364,5	-	1 026	-
Протяженность газопровода низкого давления от ГРПШ-1 DN 225-32мм.	м	15 223,2	-	15 295,2	-
Протяженность газопровода низкого давления от ГРПШ-2 DN 225-32мм.	м	13 759,5	-	14 103,5	-
Надземный газопровод Ø57мм низкого давления от ГРПШ-2	м	826	-	736	-
Надземный газопровод Ø25мм низкого давления	м	2224,6	-	2224,6	-
Оборудования ГРПШ	комп	2	-	2	-
Крановых узлов: В том чилсе: ГВД и ГНД	шт	617	-	669	-
Молниеприемник L=9м.	шт	2	-	2	-
Опознавательный знаков	шт.	268	-	268	-
Ограждение территории 18х2м.	п.м.	36	-	36	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Цель проекта- газификация населения, коммунально-бытовых и социальных предприятий села Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа,Шиелийского района, Кызылординской области» Для газоснабжения природным газом села Н.Бекежанов,Керделинского аульного округа Шиелийского района Кызылординской области предусмотрен подводящий газопровод высокого давления (Р=0,6МПа) и внутриквартальные газораспределительные сети низкого давления (Р=0,003МПа)

Точка подключения газопровода высокого давления к ГПРШ-1 от перспективного газопровода- отвода высокого давления PN-0.6 МПа Д-110мм проложенного по ул.Н.Бекежанов северном направлении к проектируемого ГРПШ-1. Врезка в сущ. Газопровода диаметром 110мм выполнено муфтой, далее газопровод прокладывается подземно диаметром 110мм.

Точка подключения газопровода высокого давления к ГРПШ-2 подключено в линию газопровода ГРПШ-1 план трассы согласована в технического совещание от 18.марта 2021года. Соединено выполнено через переходной тройник 110х90мм, далее газопровод прокладывается подземное диаметром 90мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт шкафной- 2 комп.

б) Полиэтиленовые подземные шаровой краны Д225-63мм-52шт.

в) Молниеприемник L=9м.-2ед.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: **декабрь 2020 года;**
месяц, год
Окончание работ: **июль 2021 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;
фактически, месяц: **7**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации ____% и фактический применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
до Пенсионного управления ... Чеченов Б.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Шиелі ЖЭТК басшысы ... Мусыкаев А.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ПТСЖ Д.Б. Басенов ... Арсенбаев Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); - **Не требуется**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется**;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бекежанов Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызыординского области» №70-2018 готовым к приемке в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн»

Атаниязов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Исполнительная схема газопровода высокого давления от точки подключения до ГРПШ–1, ГРПШ–2.

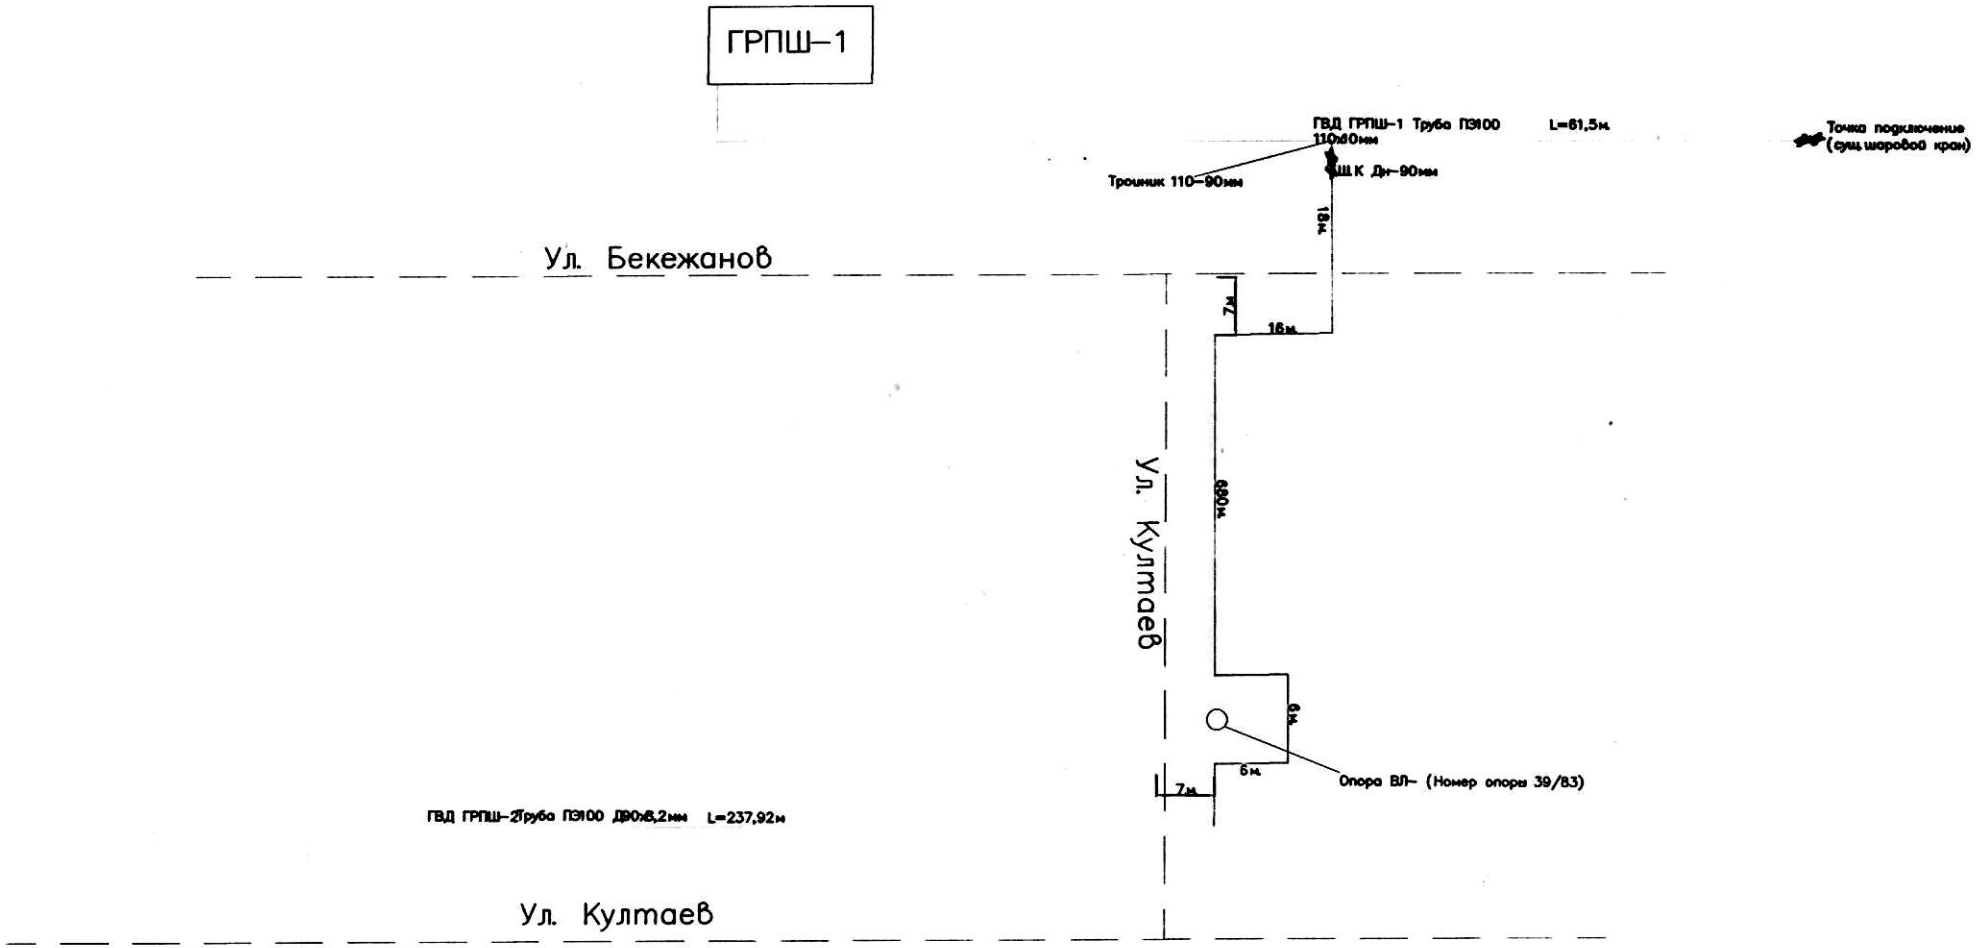

ГРПШ–2

			70–2018 ГСН
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Н.Бекежанов, Керделинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординской области "
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода до ГРПШ-1,ГРПШ-2
Тех.надзор ТОО "Аскартау–2016	Ыскаков М.		
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.		
Автор.надзор ТОО "ДосСтройПроект"	Ахметов А.		

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 2 до узла 45.

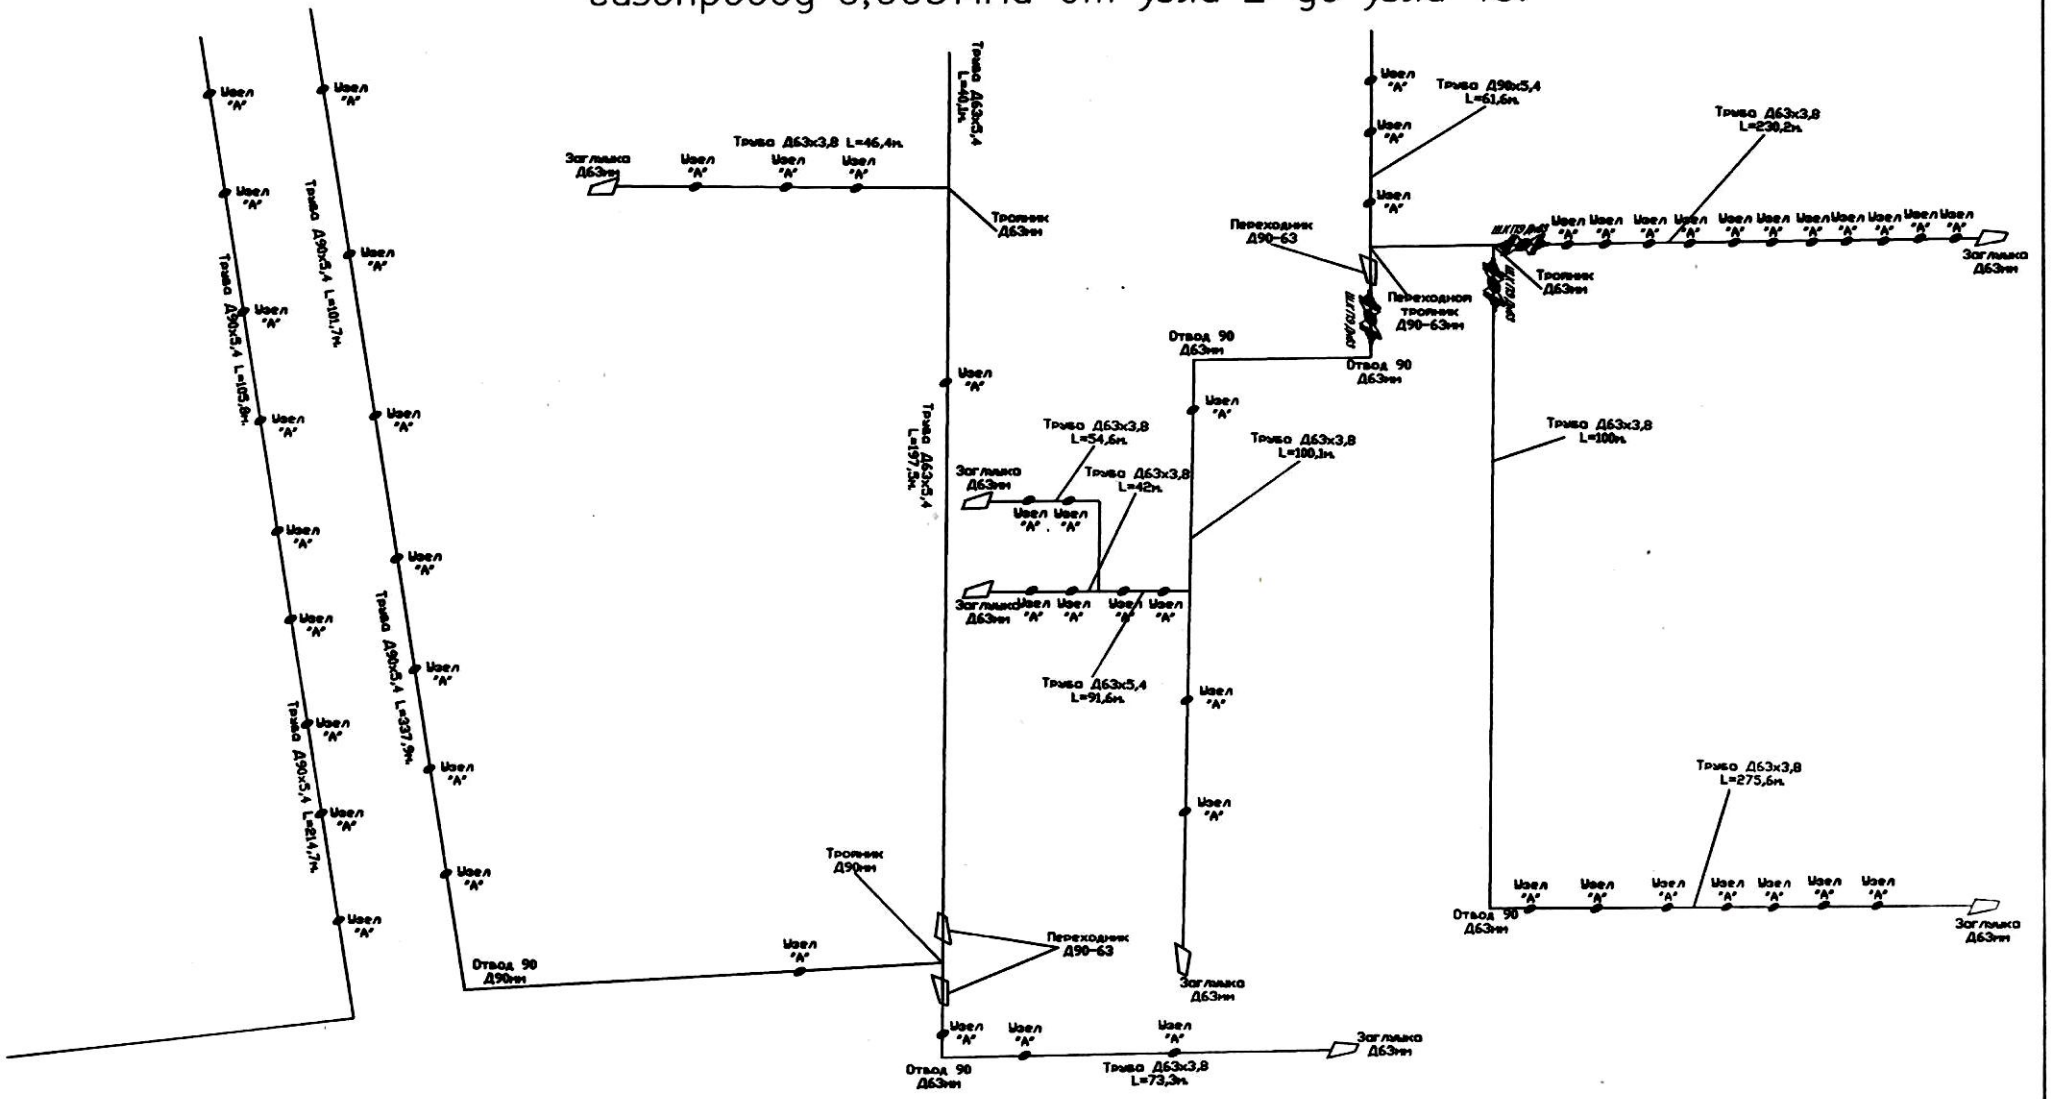

			70-2018 ГСН
			Объект "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Н.Бекажанов, Керделинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординского области"
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-2 — лист 15
Тех.надзор ТОО "Аскартау-2016"	Ыскаков М.		
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.		
Автор.надзор ТОО "ДосСтроиПроект"	Ахметов А.		

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 27 до узла 71.

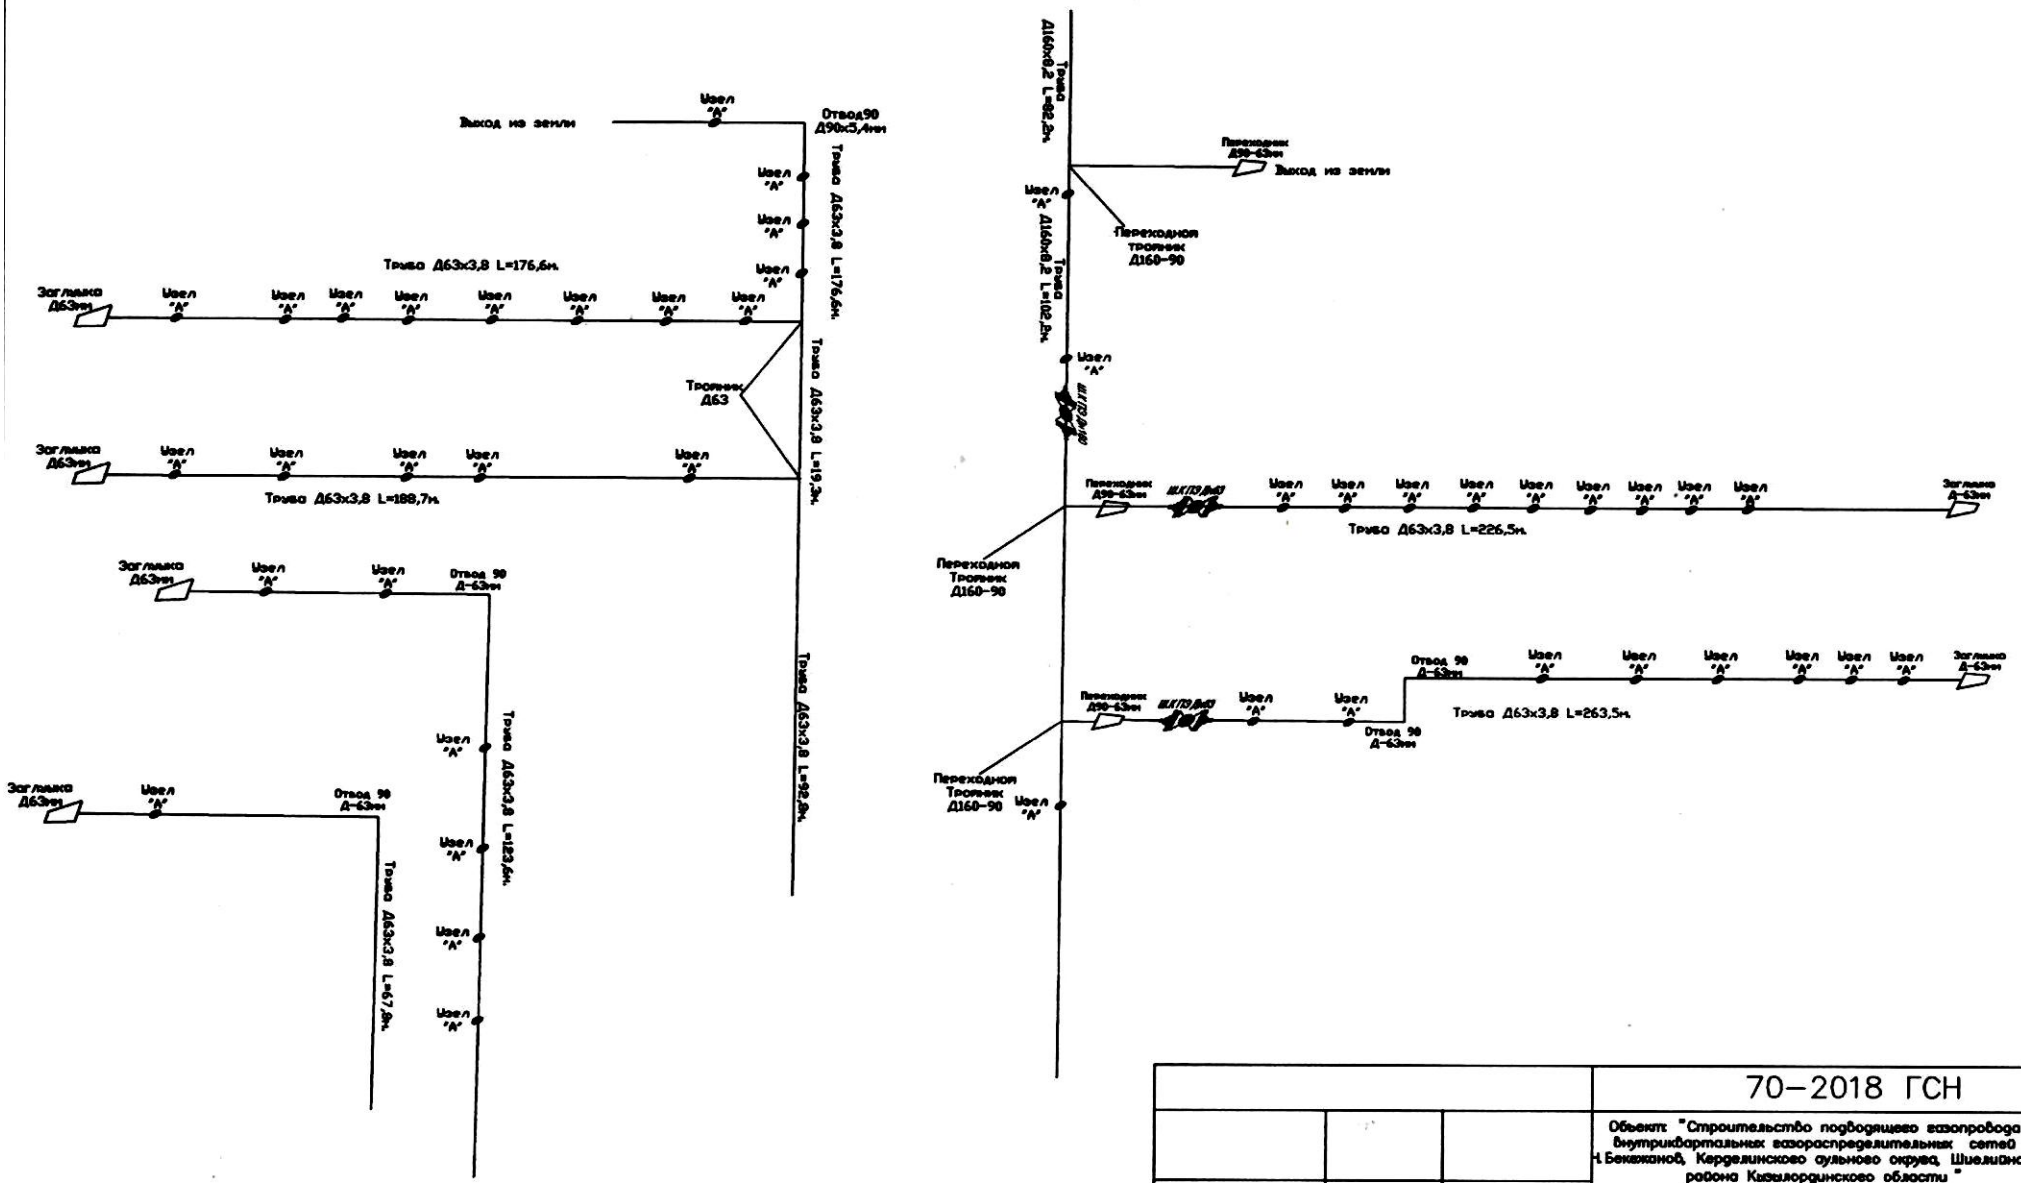

			70–2018 ГСН
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Бекежанов, Керделинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординского области"
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-2 — лист 17
Тех.надзор ТОО "Аскартау–2016"	Ыскаков М.		
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.		
Автор.надзор ТОО "ДосСтройПроект"	Ахметов А.		

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 45 до узла 56.

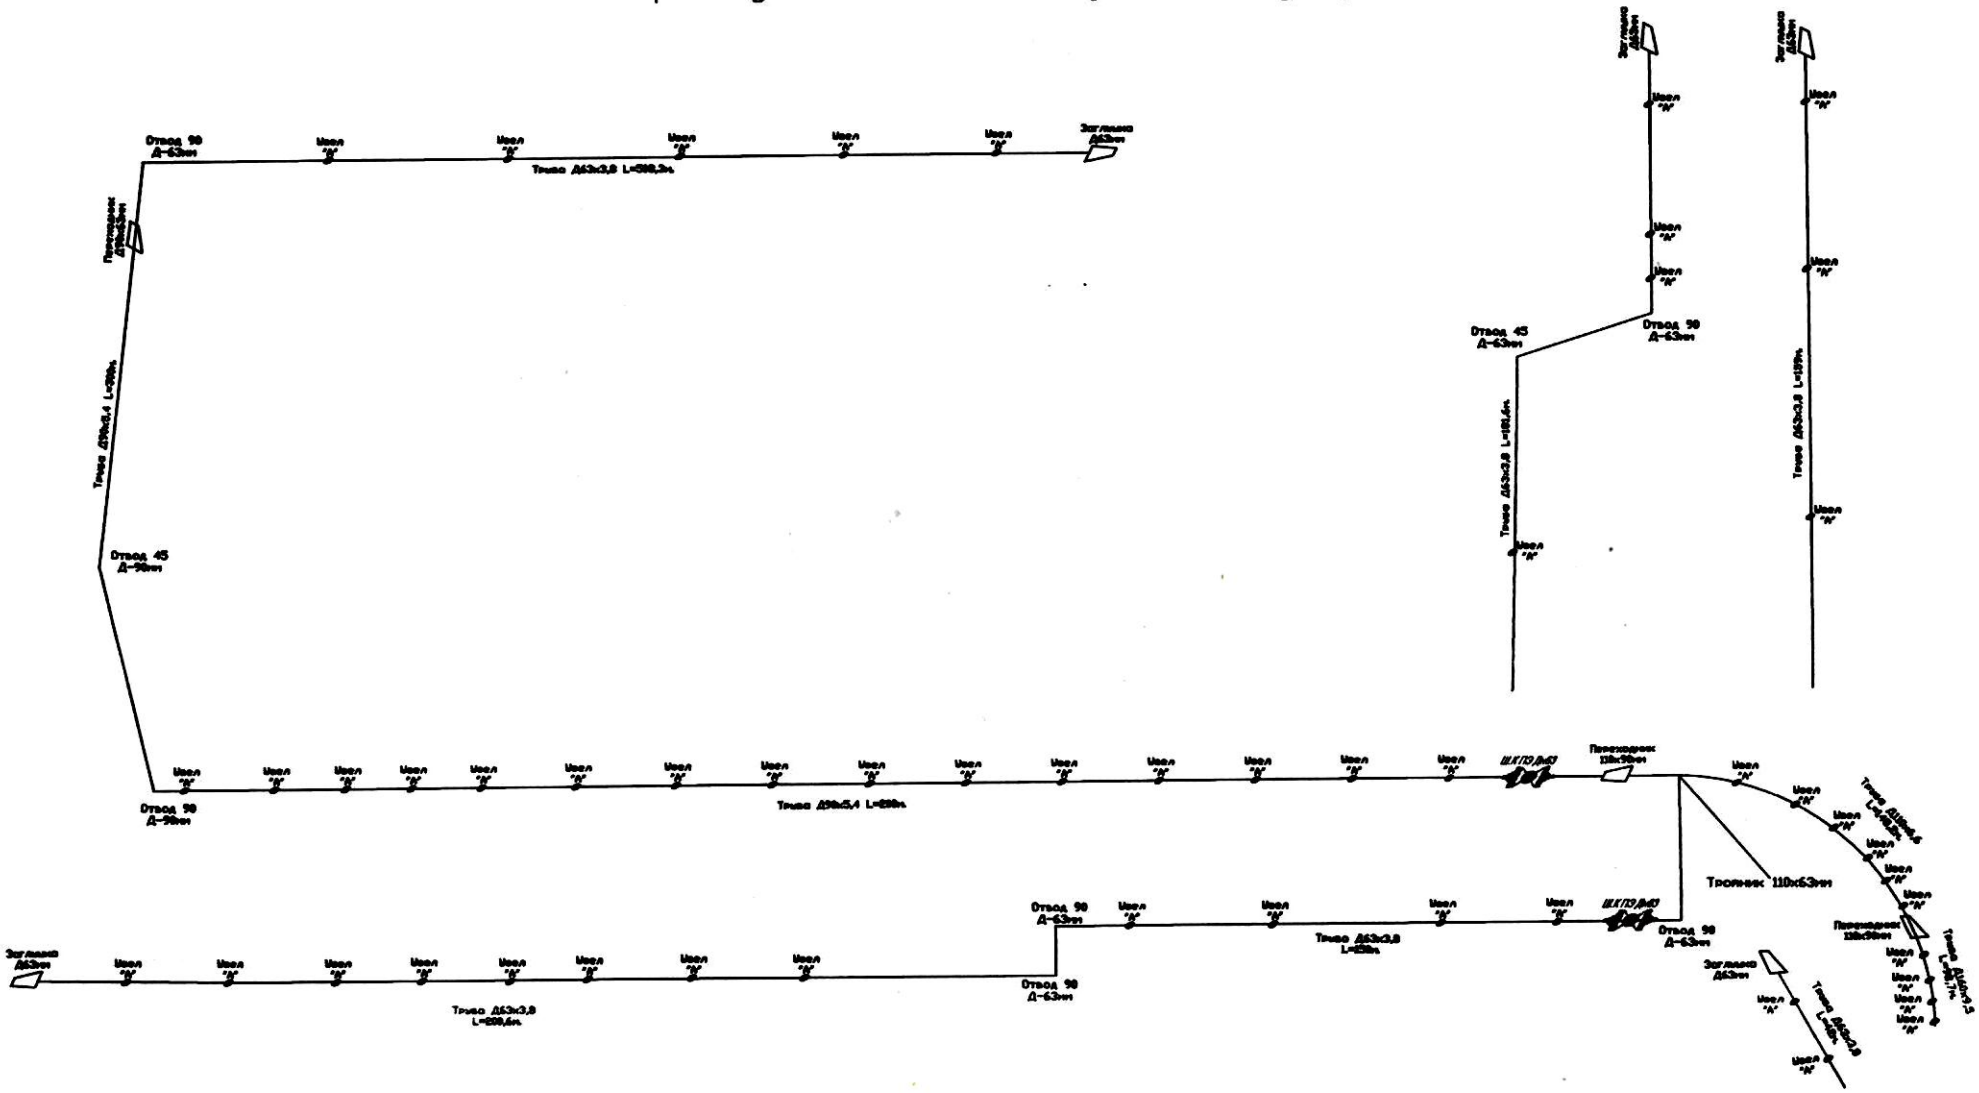

			70–2018 ГСН
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Бекежанов, Кердалинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординской области"
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-1 — лист 10
Тех.надзор ТОО "Аскартау–2016"	Ыскаков М.		
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.		
Автор.надзор ТОО "ДосСтройПроект"	Ахметов А.		

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 29 до узла 38.

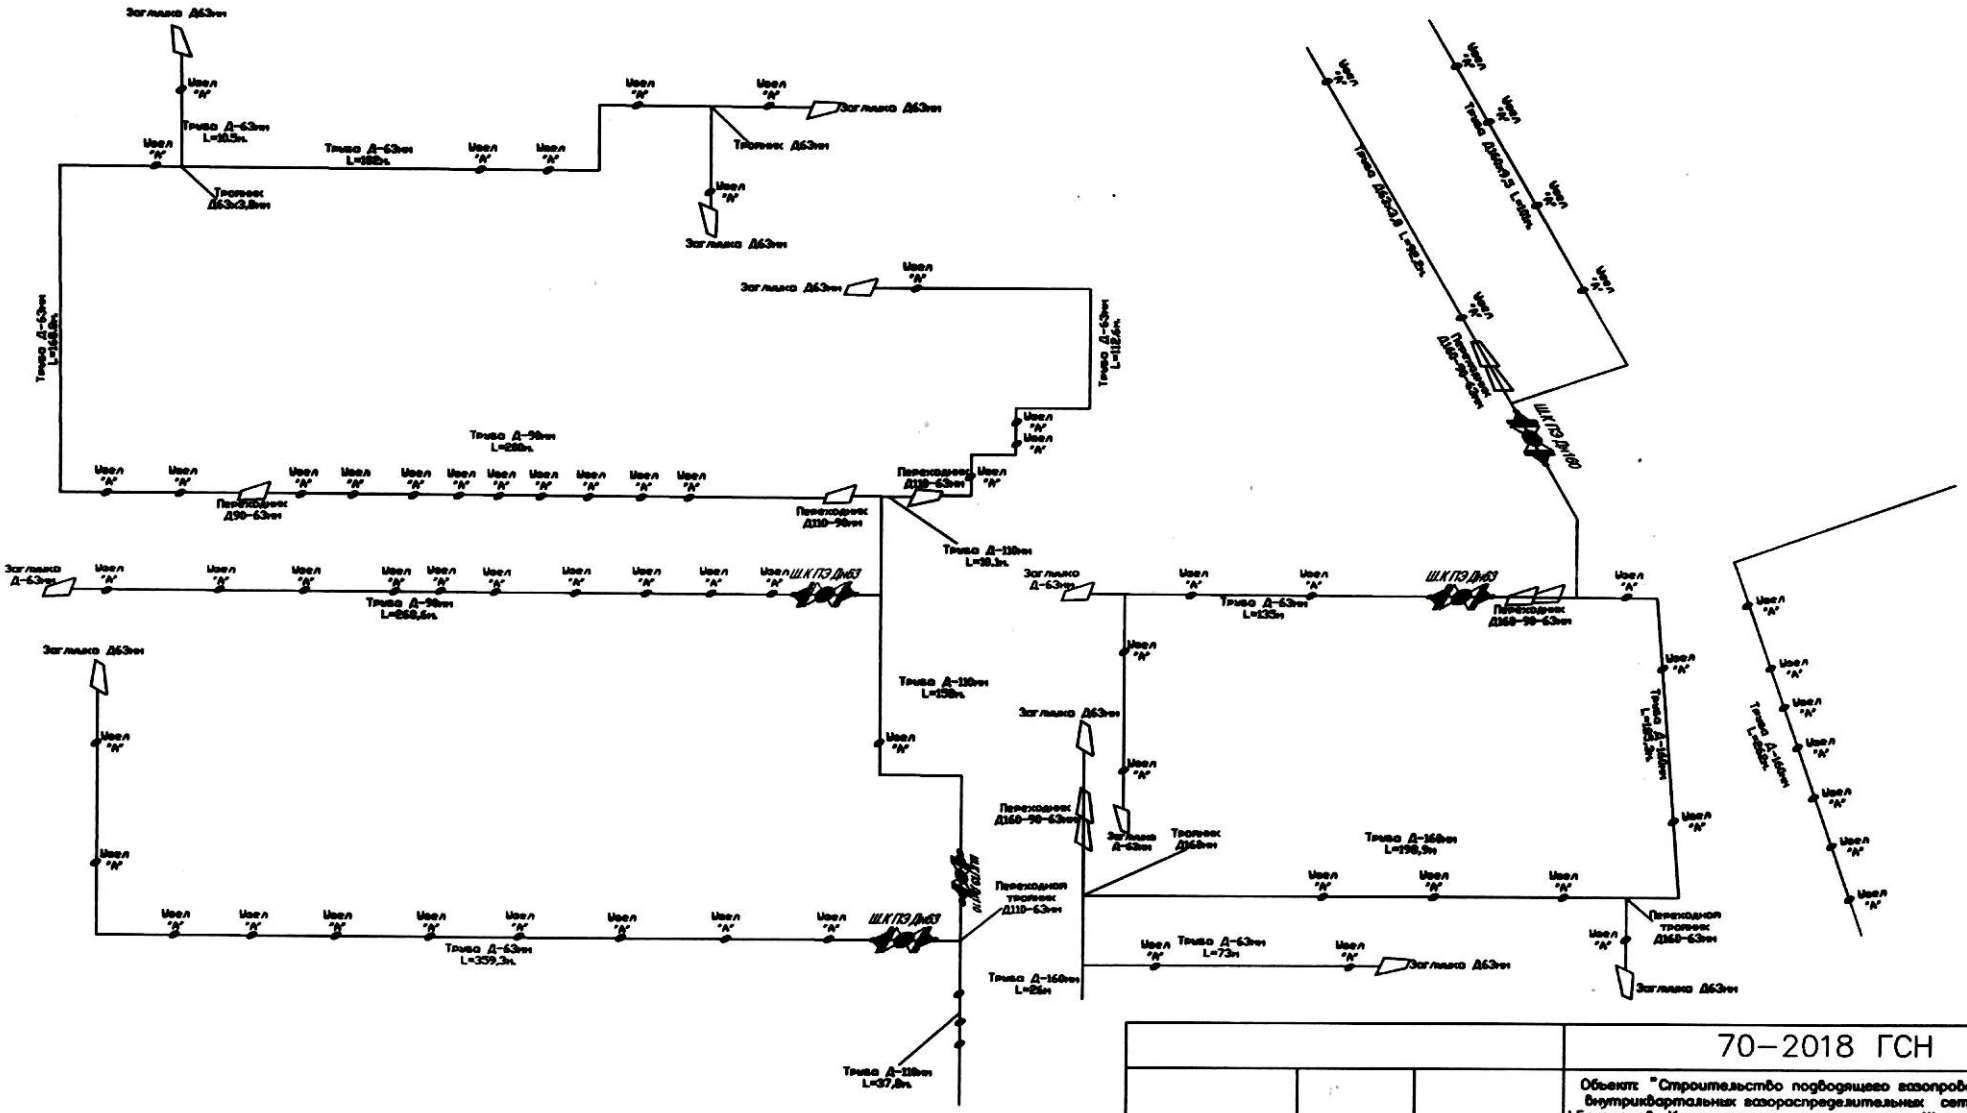

			70–2018 ГСН
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Н.Бекежанов, Карделинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординской области "
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-1 — лист 9
Тех.надзор ТОО "Аскартау–2016"	Ыскаков М.		
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.		
Автор.надзор ТОО "ДосСтройПроект"	Ахметов А.		

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 0 до узла 28

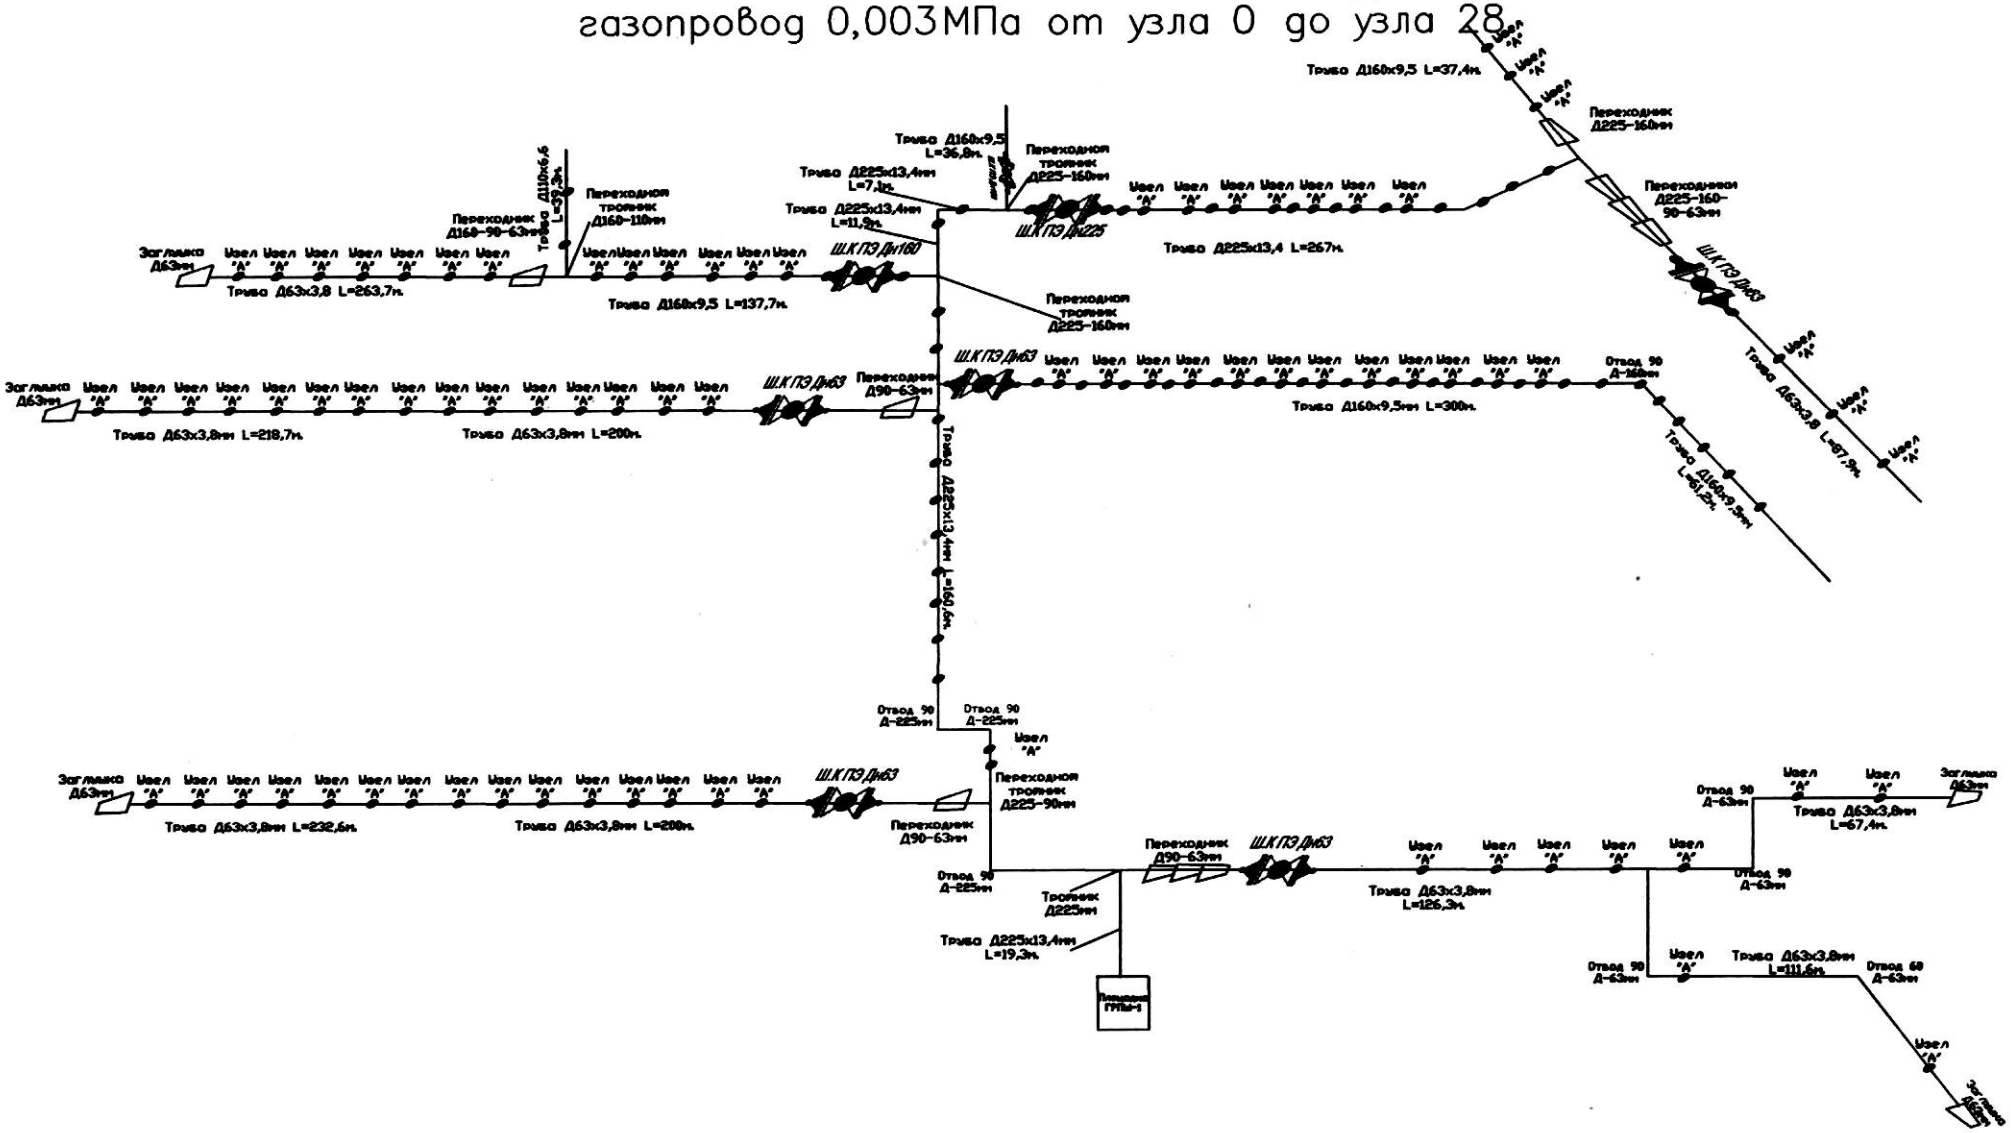

			70–2018 ГСН
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Н.Бекежанов, Керделинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординской области "
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-1 — лист 8
Тех.надзор ТОО "Аскартау–2016	Ыскаков М.		
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.		
Автор.надзор ТОО "ДосСтроиПроект"	Ахметов А.		

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 0 до узла 65.

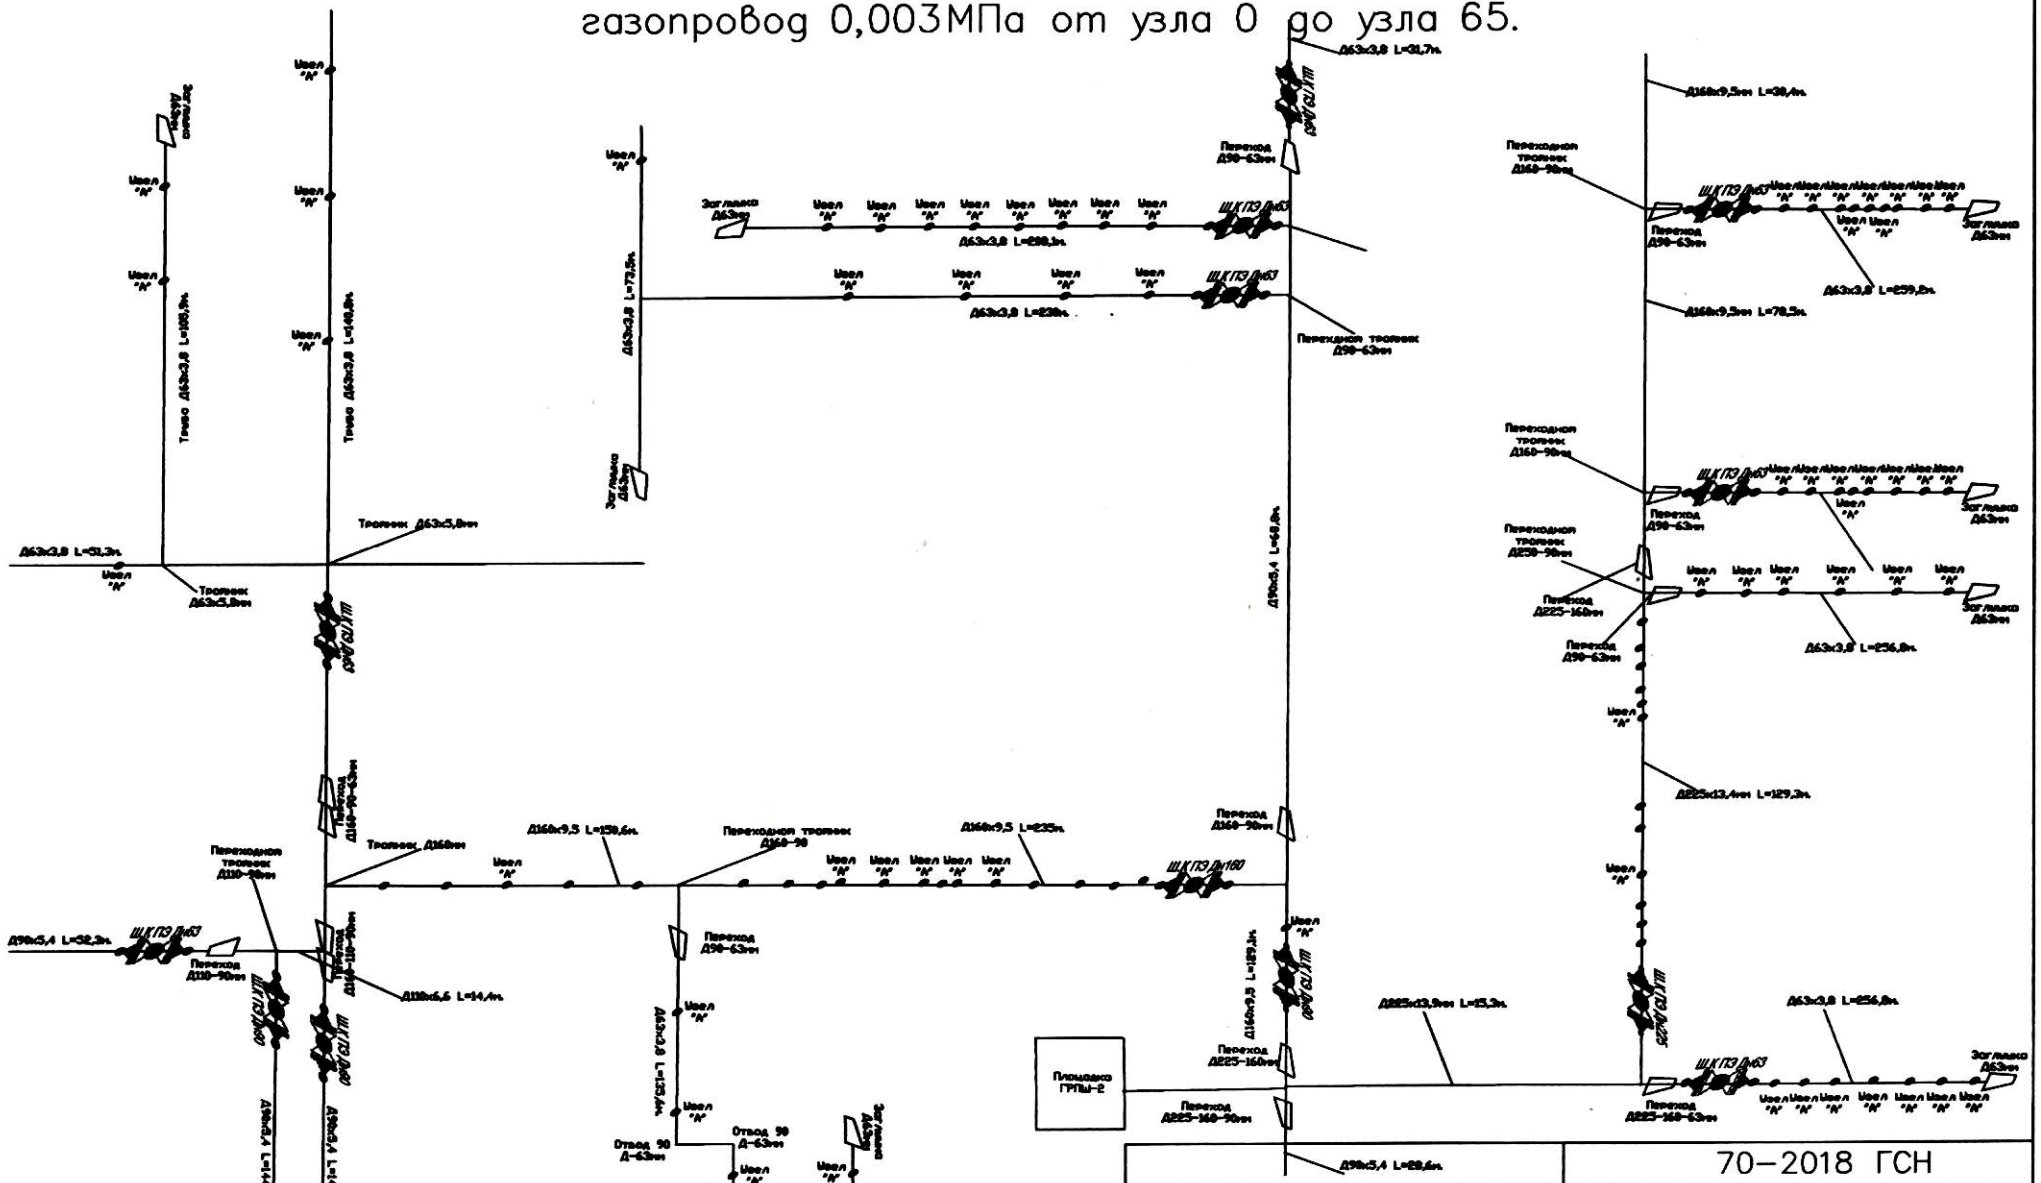

			70–2018 ГСН
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Н.Бекежанов, Керделинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области "
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-2 — лист 14
Тех.надзор ТОО "Аскартау–2016	Ыскаков М.		
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.		
Автор.надзор ТОО "ДосСтроиПроект"	Ахметов А.		

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 70 до узла72.

			70–2018 ГСН	
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Бенаксаной, Кердельинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординского области "	
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-2	лист 18
Тех надзор ТОО "Аскартау–2016	Ыскаков М.			
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.			
Автор. надзор ТОО "ДосСтроиПроект"	Ахметов А.			

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 60 до узла 71.

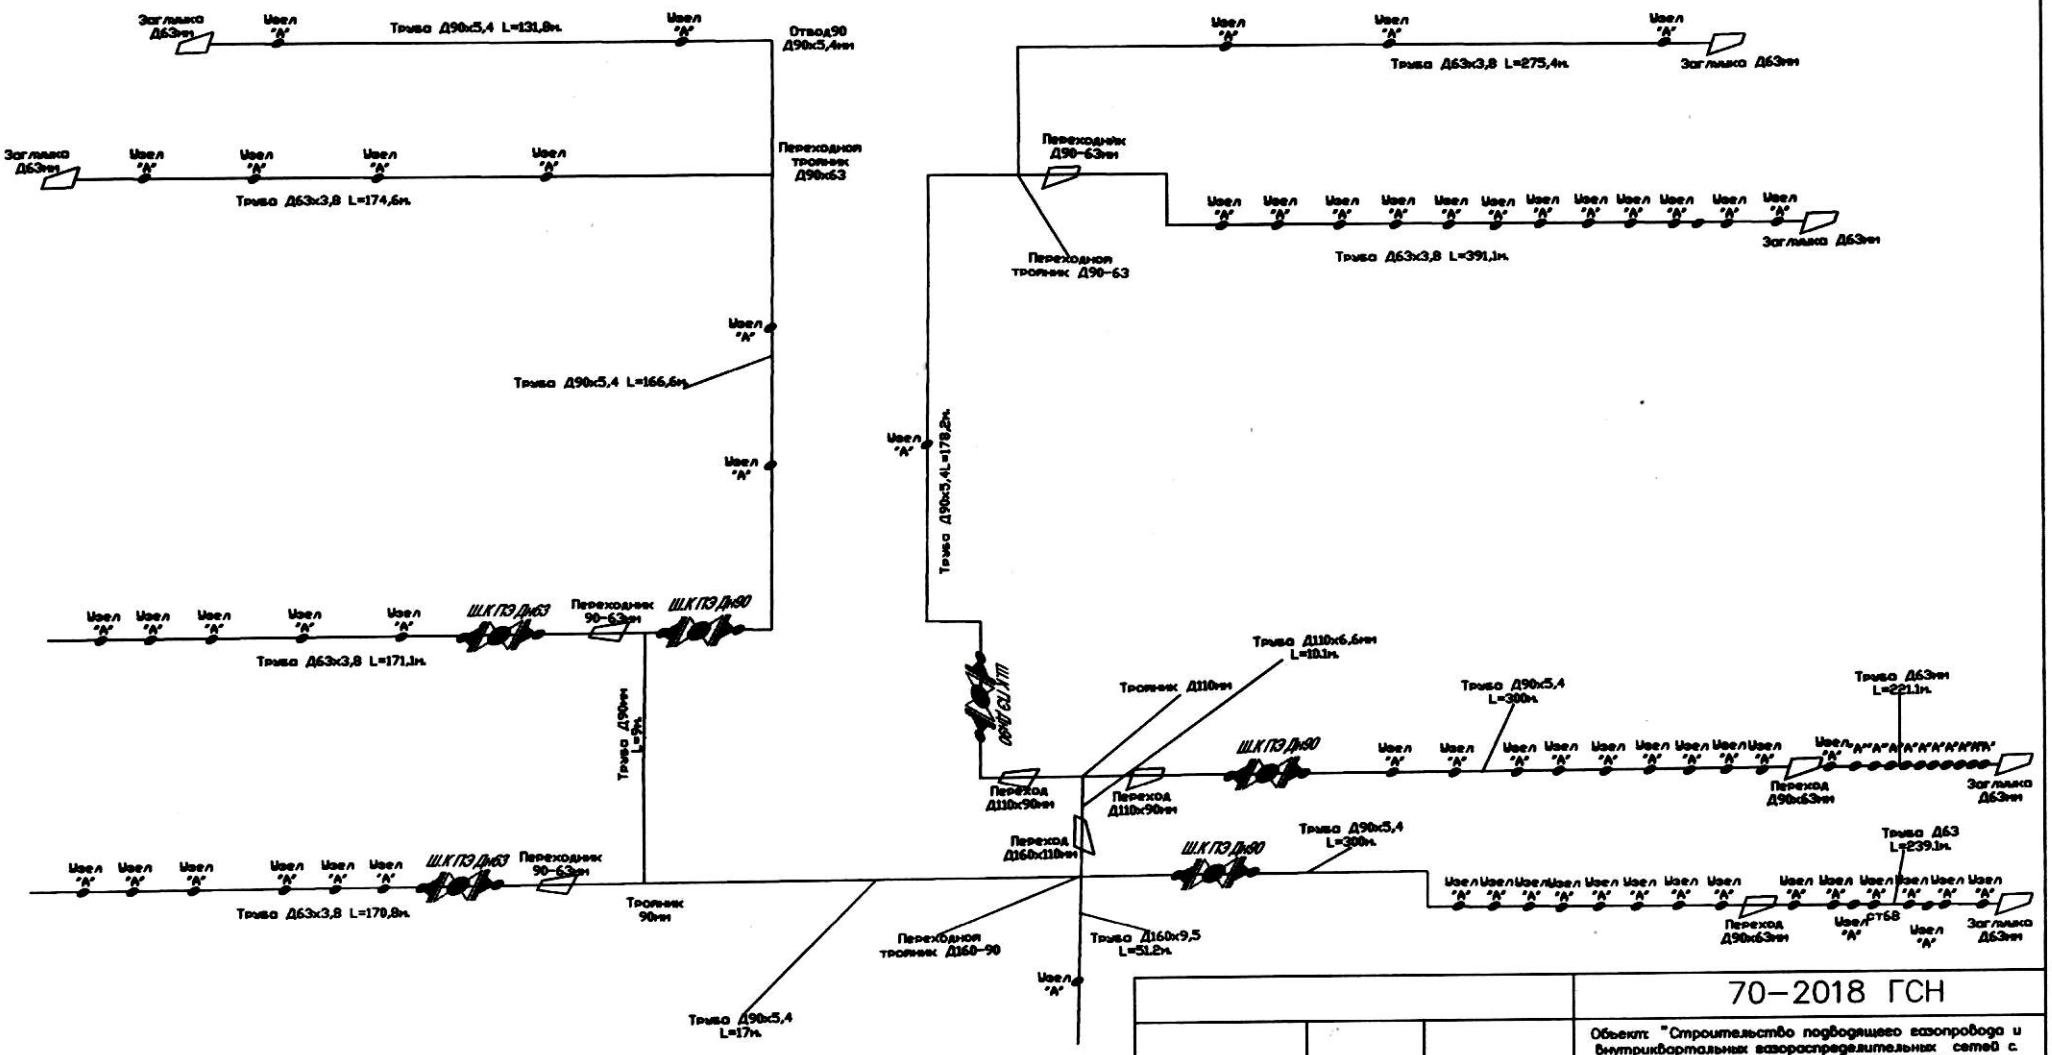

			70-2018 ГСН
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Бекежанов, Керделинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординской области"
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-1 — лист 11
Тех.надзор ТОО "Аскартау-2016"	Ыскаков М.		
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.		
Автор.надзор ТОО "ДосСтройПроект"	Ахметов А.		

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 13 до узла 58.

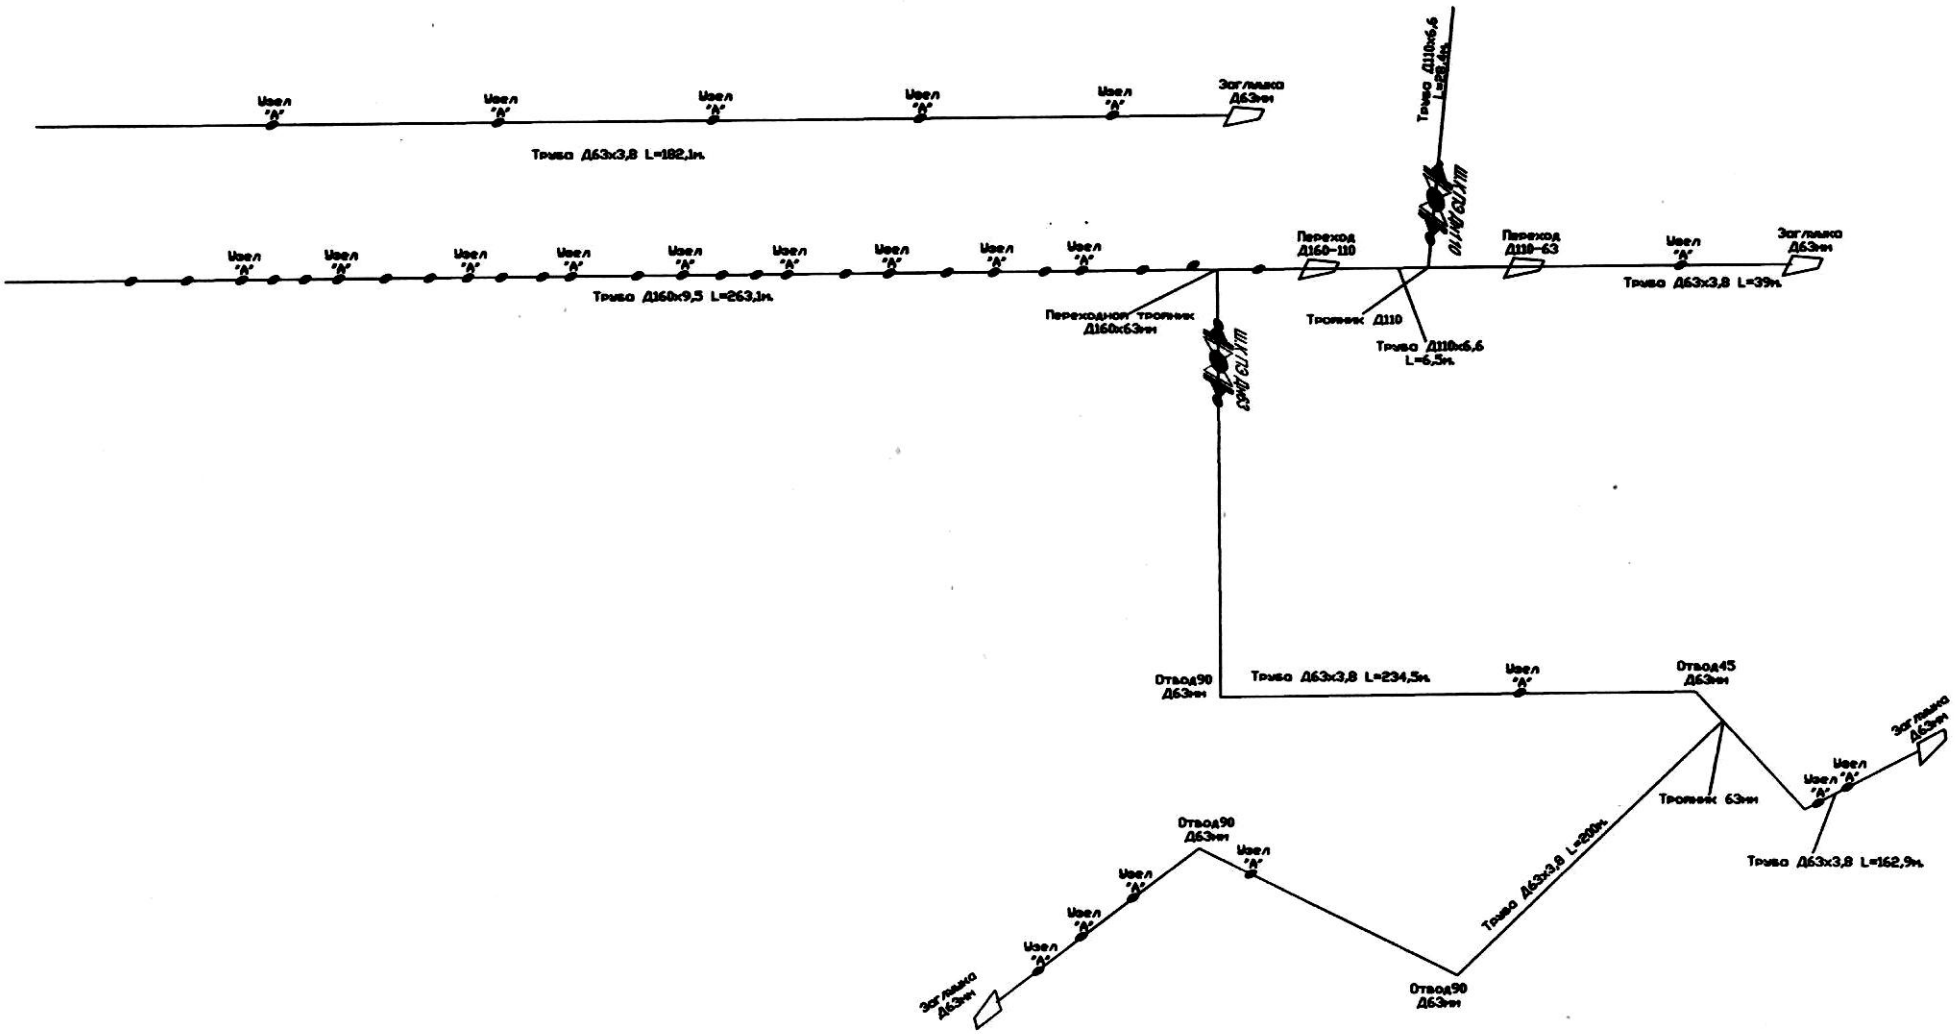

			70–2018 ГСН	
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Н.Бекежанов, Керделинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординской области"	
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-1	лист 13
Тех.надзор ТОО "Аскартау-2016	Ыскаков М.			
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.			
Автор.надзор ТОО "ДосСтройПроект"	Ахметов А.			

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 19 до узла 25.

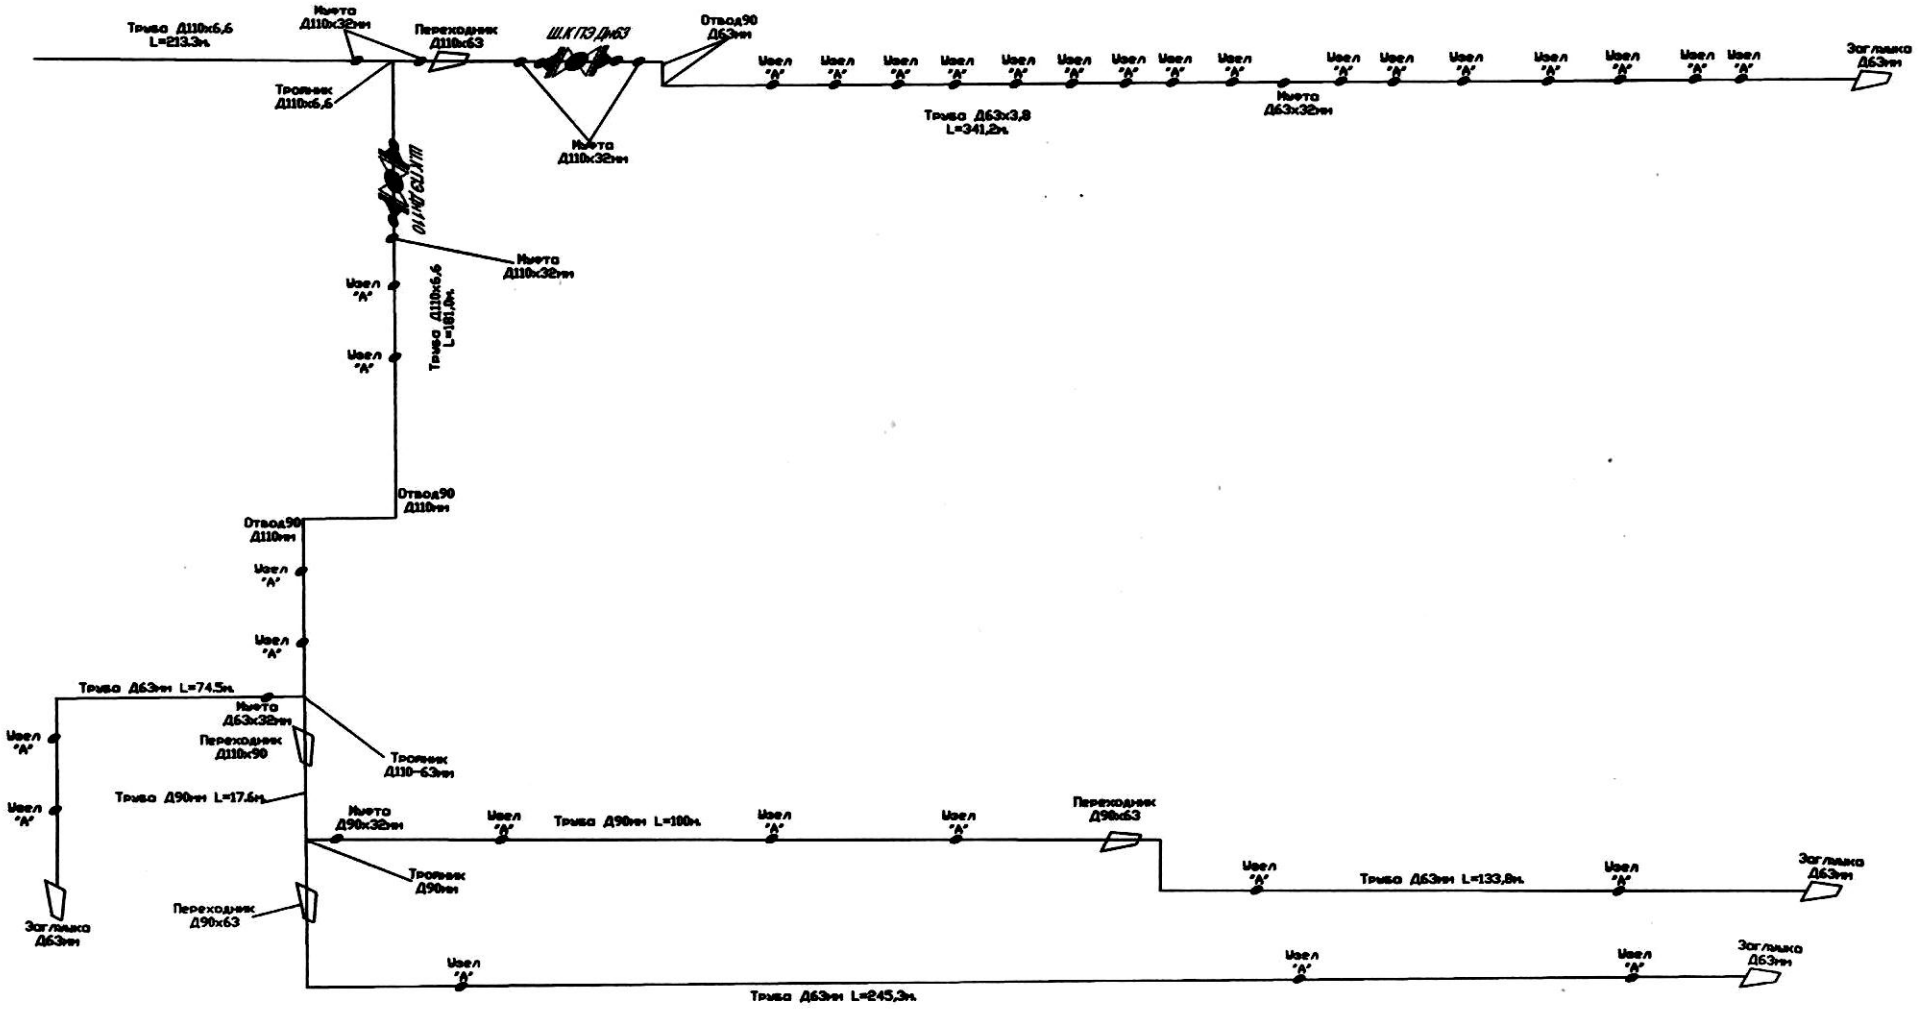

			70–2018 ГСН
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Бекежанов, Кердалинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординского области"
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-1 — лист 12
Тех.надзор ТОО "Аскартау–2016"	Ыскаков М.		
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.		
Автор.надзор ТОО "ДосСтройПроект"	Ахметов А.		

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 72 до узла 85.

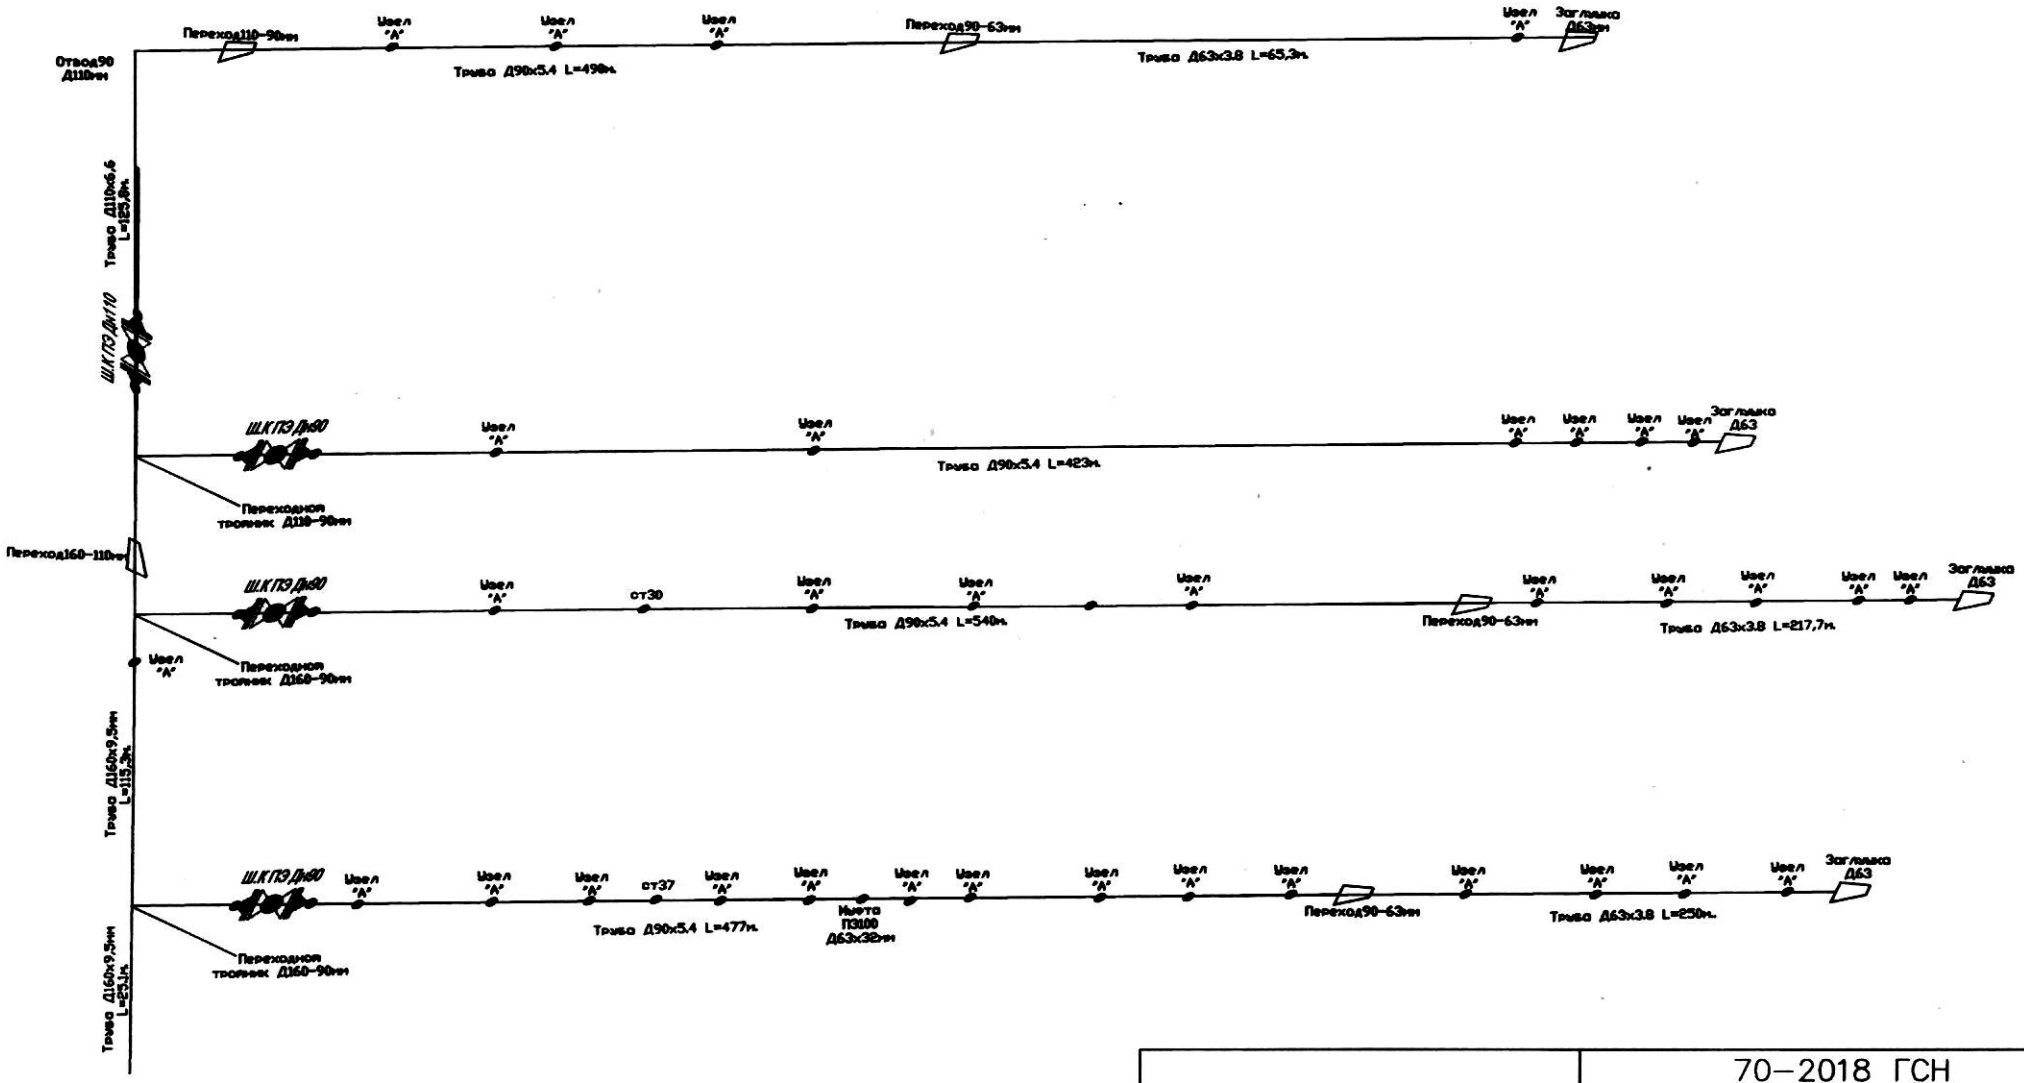

			70–2018 ГСН	
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Н.Бекежанов, Керделинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординской области"	
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-2	лист 19
Тех.надзор ТОО "Аскартау–2016"	Ыскаков М.			
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.			
Автор.надзор ТОО "ДосСтроиПроект"	Ахметов А.			

Исполнительная схема монтажа наружное газопровод 0,003МПа от узла 39 до узла 57.

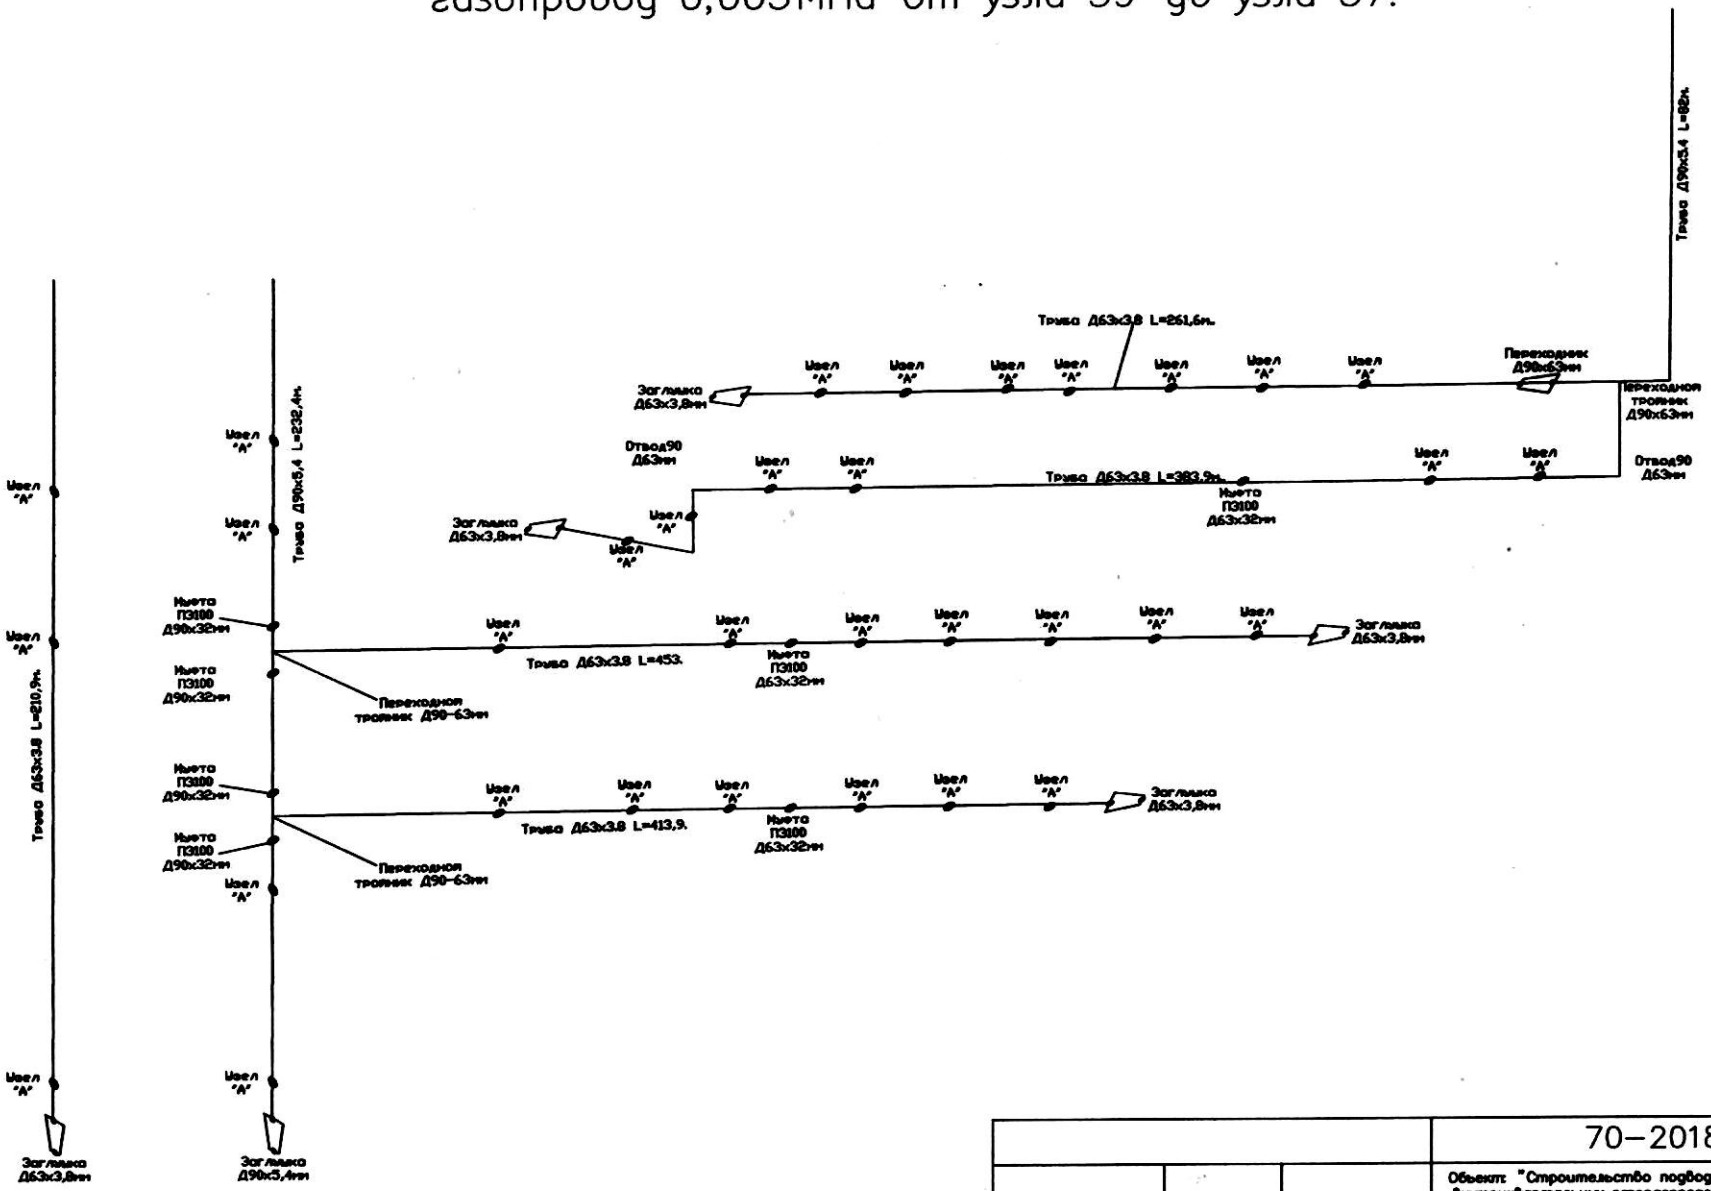

			70–2018 ГСН
			Объект: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Бекежанов, Керделинского сельского округа, Шиелийского района Кызылординской области"
		подпись	Исполнительная схема подземного газопровода от ГРПШ-2 — лист 16
Тех надзор ТОО "Аскартау-2016"	Ыскаков М.		
Начальник участка ТОО "ТАК"	Абдреев К.		
Автор надзор ТОО "ДосСтройПроект"	Ахметов А.		
