Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«28» 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, 322*
наименование организации, юридический адрес
в лице *генерального директора Календарева Тимура Ахатовича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *Антенно – мачтовое сооружение на ПС «Ямышево» по проекту«Строительство антенно-мачтового сооружения (АМС) для нужд АО «ПРЭК» в Павлодарской области Павлодарского района и района Аккулы»*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *Акционерное общество «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» в лице и.о. генерального директора Глотов Александр Владимирович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) выполнен *ТОО «КазТехноГаз-ПВ» лицензия № 14018911 от 15.12.2014 г. проект № 215/19.02-19*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом *АО «ПРЭК» № П-311 от 31.03.2020 г.*;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица Измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2. | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м 2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*По объекту «ПС 35/10кВ Ямышево» по проекту «Строительство антенно-мачтового сооружения (АМС) для нужд АО «ПРЭК» в Павлодарской области Павлодарского района и района Аккулы»произведено строительство антенно-мачтового сооружения (АМС) высотой 48,6 метров и массой 13500 кг, материал несущих конструкций - стальные уголки. Это необходимо для организации основного и резервного канала диспетчерской и технологической связи, каналов передачи данных систем АСКУЭ и СДТУ.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _ март 2020г _;
месяц, год

окончание работ декабрь 2020г _;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _ 1 _;

фактически, месяц: _ 10 _;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение:

И.о.начальника УТ АО «ПРЭК» Козлов С.Е. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

« 29 » 12 2020 г.

М.П.

Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, связь – не требуется;

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«ПС 35/10кВ Ямышево» по проекту «Строительство антенно-мачтового сооружения (АМС) для нужд АО «ПРЭК» в Павлодарской области Павлодарского района и района Аккулы»* готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса), гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», Календарев Тимур Ахатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«29» 12 2020 г.

М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Средазэнергомонтаж Павлодар"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

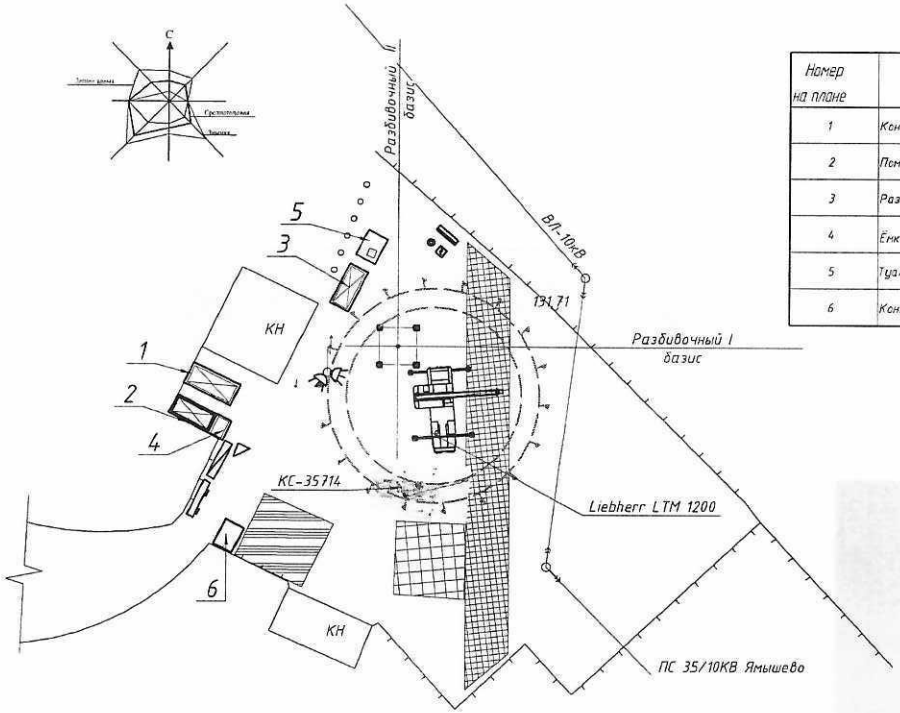


## Экспликация зданий и сооружений

| Номер на плане | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Контора прораба на 2 человека | |
| 2 | Помещение для обогрева и приема пищи | |
| 3 | Раздевальная с умывальником и питьевой водой | |
| 4 | Ёмкость для воды | |
| 5 | Туалет | |
| 6 | Контейнер для мусора | |

## Ситуационный план

## Таблица грузоподъемности крана Liebherr LTM 1200

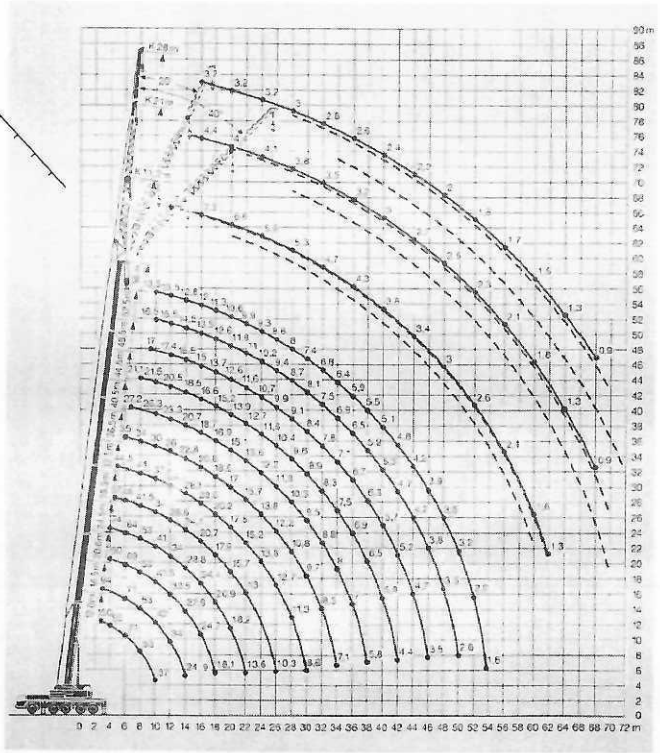

## Таблица грузоподъемности крана КС-35714

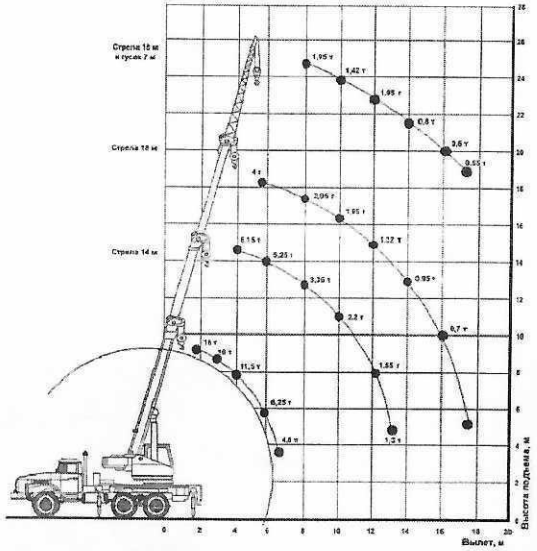


1 Монтаж башни связи осуществить на подготовленный фундамент с помощью стрелового крана методом подъема-поворота стрелы - опускания стрелы

2 При выполнении работ соблюдать требования "Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов" от 30.12.2014г №359, СН РК 1.03-02-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве"

## Условные обозначения

- Пожарный щит
- Граница опасной зоны перемещения грузов
- Граница монтажной зоны
- Предупреждающий знак "Осторожно! Работает кран""
- Схема движения а/транспорта информация о стрящемся объекте
- Стенд со схемами строповки, таблицей весов и грузов
- Временная площадка с покрытием из щебня
- Площадка для складирования
- Площадка для сборки секций башни
- Площадка для складирования элементов башни
- Прожектор
- Место для курения
- Урна для мусора

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| изм. | кол | № док | лист | подпись | дата | 215/19.02-19-ПОС |
| | | | | | | Павлодарская обл., с. Заря; поселок Новоямышево, с. Черное |
| ГИП | | Арифджанов | | | 05.19 | «Строительство антенно-мачтового сооружения (АМС) для нужд АО «ПРЗК». |
| Разраб | | Ильин И.И. | | | 05.19 | Стройгенплан в пос. Новоямышево |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 13 | |

ПКО ТОО «КТГ ПВ» Государственная лицензия ГСЛ № 14018911 от 15.12.2014г

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму Министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 Бұйрығына
3-қосымша

# Сәйкестік туралы Декларация

"28" 12 2020 ж.

Мердігер (бас мердігер) "Средазэнергомонтаж Павлодар" ЖШС Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Солтүстік Өндірістік аймақ, 322
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атқарушы *бас директор Календарева Тимура Ахатовича*
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

*Павлодар облысының Павлодар ауданы мен Аққулы ауданындағы «ПЭТК» АҚ қажеттілігі үшін «Антенналық діңгек құрылымының құрылысы (АДҚ) жобасы бойынша, Антенналық діңгек құрылымының «Ямышев ҚС»*
объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші "Павлодар Электржелісін Тарату Компаниясы"Акционерлік қоғамы болып табылатын бас директордың міндетін атқарушы *Глотов Александр Владимирович*
ұйымның атауы, Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

куәландырады:

1. Объектідегі құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау–сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалды;
2. Қосалқы мердігерлік ұйымдар: _____
ұйымның атауы
3. Жобан (жобалық-сметалық құжаттама) 15.12.2014 ж. № 14018911 лицензия «КазТехноГаз-ПВ» ЖШС-мен орындалған. №215/19.02-19 жоба.
«ПЭТК» АҚ 2020ж. 31.03. № П-311 бұйрығымен бекітілген.
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) Ұйымның атауы және бекітілген күні
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеті, жұмыс орындарының саны және т. б.) барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқа) нысаналы өнімге немесе қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерінде толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| | | | | | |
| | | | | | |

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$) | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Жалпы құрылыс көлемі | текше метр | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Оның ішінде жер асты бөлігі | $м^3$ | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы м2 | $м^2$ | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Павлодар облысының Павлодар ауданы мен Ақжұлы ауданындағы «ПЭТК» АҚ қажеттілігі үшін «Антенналық діңгек құрылымының құрылысы (АДҚ) жобасы бойынша «Ямышев 35/10кВ ҚС» Объектісі бойынша антенналық діңгек құрылымын (АДҚ) салу биіктігі 48,6 метр және 13500 кг массасымен жүзеге асырылды, тірек құрылымдарының материалы болат торлар болып табылады. Бұл диспетчерлік және технологиялық байланыс, ЭКЕАЖ және СДТУ жүйелерінің деректерді беру арналары үшін негізгі және резервтік арнаны ұйымдастыру үшін қажет.*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жеке сынаудан және кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жобада көзделген жабдық орнатылды;

7. Еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар және жобада көзделген сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы 2020ж. наурыз;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы 2020ж. желтоқсан;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы кезінде, ай:

норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, ай: 1;

нақты, ай: 10;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдықтар мен бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

10. Жер асты суларының нақты жағдайын Орындаушы геодезиялық түсіру инженерлік желілер және / немесе ғимараттар (құрылыстар) орындалды (міндетті қосымша) сәйкестік туралы декларацияға);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық) сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді, бұл инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетушілермен расталады.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету қызметтерін жеткізушілер:

Электрмен жабдықтау:

«ПЭТК» АҚ-ның "ТБ" бастығының м.а. С.Е.Козлов
ұйымның атауы, Тегі, Аты, Әкесінің аты ( бар болса), қолы

2020 ж. «28» 12

М. О.

Сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, байланыс –қажет емес;
12. Ғимараттың шу оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және сараптамалық жүзеге асыратын мемлекеттік ұйым беретін қорытындымен зертханалық өлшеу нәтижелері бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) (сараптамалық қорытынды қоса беріледі);
13. Халықтың қауқары аз топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілген, бұл халықты әлеуметтік қорғау органдары: талап етілмейді _____;
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, Күні

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Мердігер (бас мердігер) *Павлодар облысының Павлодар ауданы мен Ақжұлы ауданындағы «ПЭТК» АҚ қажеттілігі үшін «Антенналық діңгек құрылымының құрылысы (АДҚ) жобасы бойынша «Ямышев 35/10кВ ҚС»*объектісін пайдалануға дайын, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілді мерзім бойынша объектіні салу кезінде оның тарапынан туындаған ақауларды жоюды өз міндетіне қабылдайды.
Мердігер (бас мердігер)
«Средазэнергомонтаж Павлодар» ЖШС, Календарев Тимур Ахатович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы,

2020ж. «29» 12 М.О

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Средазэнергомонтаж Павлодар" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

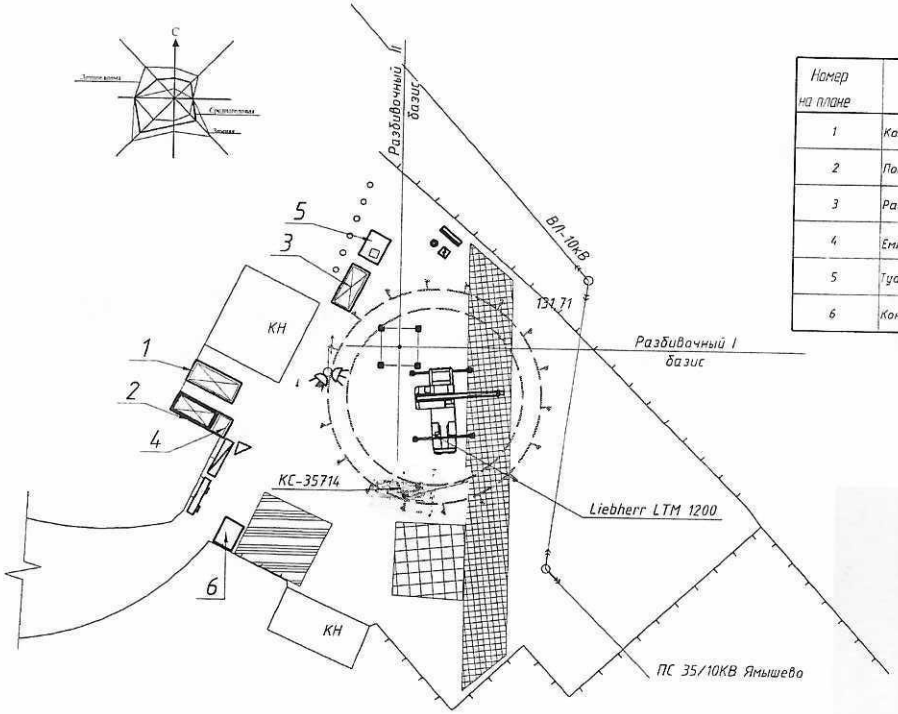


## Экспликация зданий и сооружений

| Номер на плане | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Контора прораба на 2 человека | |
| 2 | Помещение для обогрева и приема пищи | |
| 3 | Раздевальная с умывальником и питьевой водой | |
| 4 | Емкость для воды | |
| 5 | Туалет | |
| 6 | Контейнер для мусора | |

## Ситуационный план

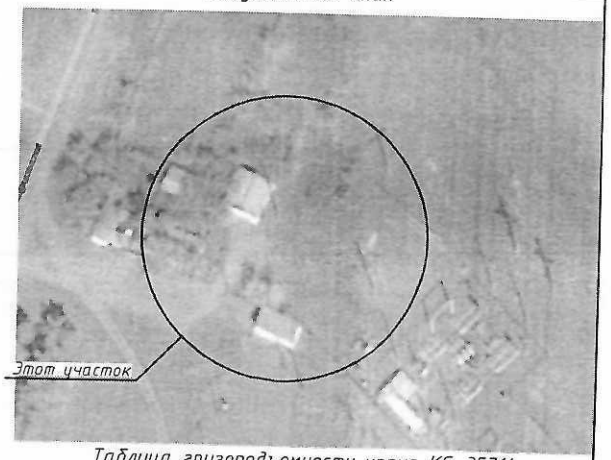


## Таблица грузоподъемности крана Liebherr LTM 1200

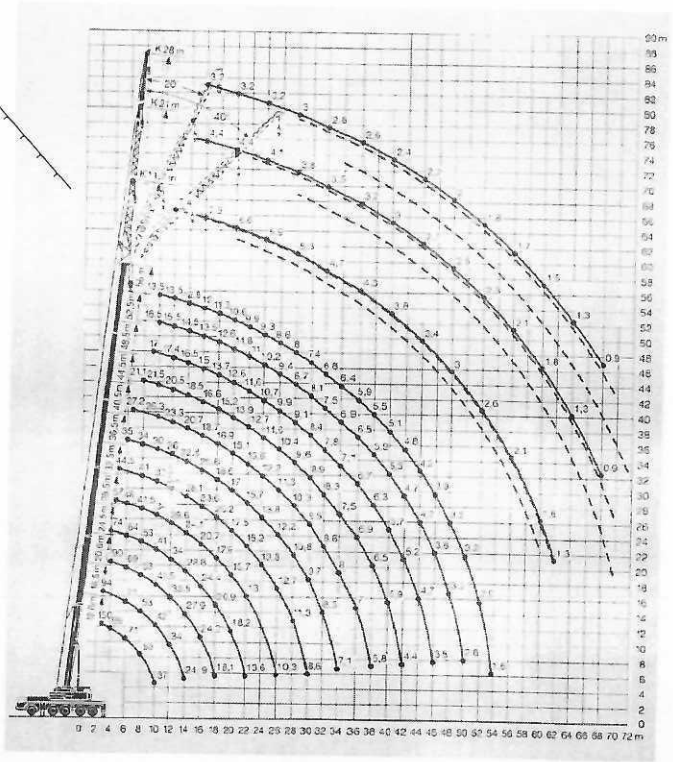

## Таблица грузоподъемности крана КС-35714

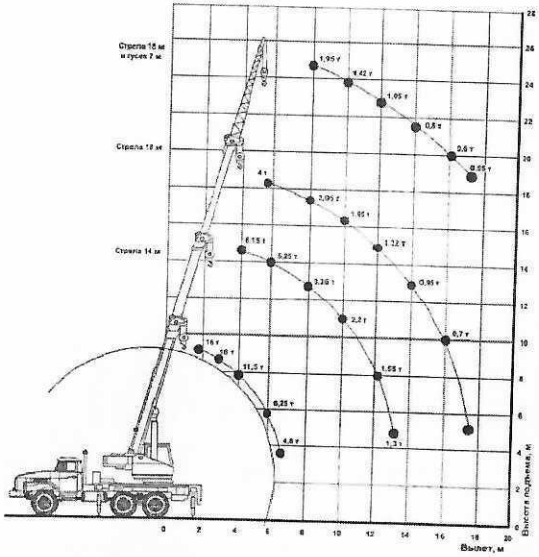


1 Монтаж башни связи осуществить на подготовленный фундамент с помощью стрелового крана методом подъема-поворота стрелы - опускания стрелы

2 При выполнении работ соблюдать требования "Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов" от 30.12.2014г №359, СН РК 1.03-02-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве"

## Условные обозначения

- Пожарный щит
- Граница опасной зоны перемещения грузов
- Граница монтажной зоны
- Предупреждающий знак "Осторожно! Работает кран""
- Схема движения а/транспорта информация о стрящемся объекте
- Стенд со схемами строповки, таблицей весов и грузов
- Временная площадка с покрытием из щебня
- Площадка для складирования
- Площадка для сборки секций башни
- Площадка для складирования элементов башни
- Прожектор
- Место для курения
- Урна для мусора

| изм. | кол. | № док. | лист | подпись | дата | 215/19.02-19-ПОС | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Павлодарская обл., с. Заря; поселок Новоямышево, с. Черное | | |
| ГИП | | Арифжанов | | | 05.19 | «Строительство антенно-мачтового сооружения (АМС) для нужд АО «ПРЭК». | Стадия: РП | Лист: 13 / Листов: |
| Разраб. | | Ильин И.И. | | | 05.19 | Стройгенплан в пос. Новоямышево | ПКО ТОО «КТГ ПВ» Государственная лицензия ГСЛ № 14018911 от 15.12.2014г | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
