Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» февраля 2021 года

Заказчик
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» заместитель руководителя – Бейсембаев Н. Б.

фамилия, имя ,отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
от «19» февраля 2021г., ТОО «Агропромремстрой», директор - Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович, Карагандинская обдасть, Шетский район, Акчатау, ул.Шахтеров, 8,

дата декларации , наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от «19» февраля 2021г. ТОО «Стройтехнология» - Шаймерденов К.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от «19» февраля 2021г. ТОО «Строй - АСТ» директор – Замиралова И.В.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ветеринарного пункта в с.Дубовка, Абайского района»**
по адресу
Карагандинская обл.,Абайский район, с.Дубовка, ул.Ковыльная

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

_____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

Распоряжение Акима Дубовского сельского округа № 23-р от 12.02.2019 г., внесение изменений решением 44-Р от 06.05.2021 года_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» № KZ72REA00175725 от 27.05.2020г.**_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Строй –АСТ» шифр 1-539;**_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства Абайского района» приказ №38 – ОСН от 21.10.2019г.**_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020г.,

месяц, год

окончание работ февраль 2021г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**

фактически, месяц: **6**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Производительность и так далее	Измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Мощность объекта (пропускная способность)	голов КРС в месяц	120	120	120	120
Площадь зем.участка	Га	0,25	0,25	0,25	0,25
Площадь застройки	м2	141,37	141,37	141,37	141,37
Общая площадь здания	м2	106,2	106,2	106,2	106,2
Строительный объем зданий	м3	360,4	360,4	360,4	360,4
Штатная численность	человек	4	4	4	4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

Здание представляет собой одноэтажное сооружение прямоугольной планировки, с размерами в осях 10,1×14,58 м. Высота этажа ветеринарного пункта 2,8 м, высота «Котельной» 2,5 м.

В здании предусматривается следующий набор помещений: тамбур, комната вет. специалистов, коридор, склад для использованного вет. материала, тепловой узел, кладовая для биопрепаратов, гараж, электрощитовая, санузел, комната персонала, котельная, санузел с душевой, комната персонала в котельной.

Двери наружные – металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003

Двери внутренние – деревянные по ТОСТ 6629-88

Ворота – металлические по серии 1.453.2-37.94, в.1

Оконные блоки – одинарный стеклопакет с двойным остеклением из ПХВ профилей по ТОСТ 30674-99

Ветеринарный пункт

Наружная отделка – сэндвич-панели толщиной 80 мм, утеплитель
Отделка внутренняя: стены (перегородки) – водоэмульсионная покраска
Полы
Тамбур, комната вет. специалистов, коридор, склад для использованного вет. материала, тепловой узел, кладовая для биопрепаратов, санузел, комнаты персонала, санузел с душевой – керамическая плитка с шероховатой поверхностью
Гараж, электрощитовая – бетонный пол
Потолок – трехслойные кровельные сэндвич-панели

Котельная

Наружная отделка – фасадная штукатурка по сетке
Стены и перегородки:
Котельный зал, комната в котельной – водоэмульсионная покраска, санузел с душевой – керамическая плитка
Потолок:
Котельный зал, комната персонала, санузел с душевой – водоэмульсионная покраска
Полы:
Санузел с душевой, комната персонала в котельной – керамическая плитка с шепрховатой поверхностью
Котельный зал – бетонный пол
Кровля – скатная из трехслойных кровельных сэндвич-панелей толщина 100 мм (утеплитель – пенополиизоцианурат, γ=100 кг/м^3) по металлическим конструкциям
Кровля котельной – мягкая рулонная из 2-х слоев бикроста
Водосток наружный, не организованный
Отмостка вокруг здания – асфальтобетонная по щебеночному основанию, шириной 1000 м

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **99748,417** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **62963,303** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **15750,503** тенге; прочие **21034,611** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **85418,816** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **52095,231** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **14206,837** тысяч тенге; прочие **19116,748** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство ветеринарного пункта в с.Дубовка, Абайского района, Карагандинская область,»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Бейсембаев Н.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Шаймерденов К.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Замиралова И.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жолдыбаев С.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ветеринарный пункт	1	-	13	141,37	380,2	101,09	-	101,09	54,0	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ж/б монолитные	Стеновые конструкции из СППС, толщиной 100мм, шлакоблок	Кровельные конструкции из СППС, толщиной 150 мм	Автономное от газового котла. Теплый пол в комнате специалистов	От точки подключения - опора №13, источник электроснабжения ПС 110/6 кВ «Комплексная Ф№12 отпайка№2»	Централизованное	Электроводонагреватели	Септик	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в	в	в	в бара	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

мансардах	подвалах	цокольных этажах	ках					

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная			66,96	12,48		21,65	
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			24,1					101,09

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2500	141,37	126,1	3,57	592	385,2	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									саженцы клен 17шт

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101		Комната вет специалистов	14,0			
	102		Комната вет специалистов	10,1			
	103		Коридор	8,3			
	104		Склад для использованного вет. материала	2,44			
	105		Комната уборочного инвентаря	2,92			
	106		Кладовая для биопрепаратов	7,92			
	107		Гараж	21,65			
	108		Тамбур	1,2			
	109		Электрощитовая	3,84			
	110		Склад	2,12			
	111		Котельный зал	16,8			
	112		Комната персонала	5,5			
	113		Санузел с душевой	4,3			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
					12,48			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
						21,65	

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		монолитные, сборные ж/б
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		металлические колонны, стеновые конструкции из СППС, толщиной 100 мм
	2) перегородки		гипсокартонные и кирпичные
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	
4	Крыша		Кровельные конструкции из СППС, толщиной 150 мм
5	Полы	1-го этажа	керамическая плитка с шероховатый поверхностью

		последующих этажей		
6	Проемы	окна		двойным остеклением из ПХВ профилей по ГОСТ 30674-99
		двери		наружные металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003 внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88
7	Отделочные работы	внутренние		водоэмульсионная покраска
		наружные		стеновые конструкции из СППС, толщиной 100 мм
8	Горячее водоснабжение			электронагреватели объемом 30л и 50л
9	Водопровод			существующая водопроводная сеть села Дубовка диаметр трубы 160мм, материал трубы пВх, ввод в здание ПЭ д.32мм
10	Канализация			септик 5м3
11	Электроосвещение			Светильники со светодиодными лампами
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		автономного газоснабжение котел WBN6000-18 HR марки BOSCH
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек

Площадь (м 2)	34,0
Высота строения (м)	+3,22
Объем строения (м 3)	109,48м3
Фундамент	ж/б ФБС
Стены	шлакоблок
Перекрытия	Ж/Б плита перекрытия - 220мм
Крыша	мягкая рулонная из 2-х слоев бикроста
Полы	санузел с душевой – керамическая плитка с шероховатый поверхностью, котельный зал – бетонный пол
Окна	с двойным остеклением с ПХВ
Двери	наружные металлические с утеплителем, внутренние деревянные
Внутренняя отделка	комната в котельный водоэмульсионная покраска, санузел с душевой – керамическая плитка
Наружная отделка	фасадная штукатурка по

	сетке								
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
КТП	1,7	1,5	2,55	4,3	6,2	киоскового исполнения
Уличный туалет	2,72	1,59	11,7		11,45	дерево

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик

Бейсембаев Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Замиралова И.В /Замиралова/

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	781,5	
	песчано-гравийное покрытие	м2	123,7	
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		

9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт	17	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		
14	цветники			
15	газоны	м2		
16	порода деревьев		клен	
17	возраст	год		

Заказчик

Бейсембаев Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Жамбалова А.В /Жамбалова/

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	33,431	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) Труба ПЭ100 SDR 11 д.32х3	м	33,431	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Колодец ж.б. Ф1500	шт	1	
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		

	" d-	шт		
	Кран d- 32x1 Porisan	шт	3	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	8	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из ПЭ SDR26-110x4,2	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
	6) из ПЭ SDR26-110х4,2	м	8,08	
	7) из ПЭ SDR26-63х2,5	м	4,04	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		
	Футляр (стальная труба Ф273мм)	м	6,024	
	Септик	шт	1	
4	Из полиэтиленовых труб SDR26-200х7,7	м	5,05	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Колодец канализационный		2ПП15-1 ПН15 КС15.6 1ПП15-1 КО6	Д1500		

2	Колодец дренажный		ПН10 КС10.9 ПП10-1	Д1000		
3	Колодец дренажный		ПН15 КС15.9 1ПП15-1 2ПП15-1 КО6	Д1500		

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Бейсембаев Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Замиралова И.В. (Замиралова)

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	105		
2	Ширина проезжей части	м	4-3,5		
3	Ширина тротуаров	м	1		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус	5		
8	Высота насыпи	м	0,5		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		1		
11	Дорожные знаки	шт	4		
12	Элементы освещения	шт			
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие		асфальто-бетон		
15	Электроосвещение	шт			

Заказчик

Бейсембаев Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Зомарлова И.В. /Зомарлова/

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	7
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	15
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные ПВ3	км	0,012
	2) алюминиевые АС 50/8	т	0,190125
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	7
	2) металлические	шт	18
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	

	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники светодиодные	шт	18
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х16	км	0,05
	2) марки АВВГ 5х6	км	0,115
	3) марки ВВГ 3х1,5	км	0,07
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	1 заземлитель	5
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик

Бейсембаев Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Замирбекова И.В /Замирбекова/

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

План на отм. 0,000

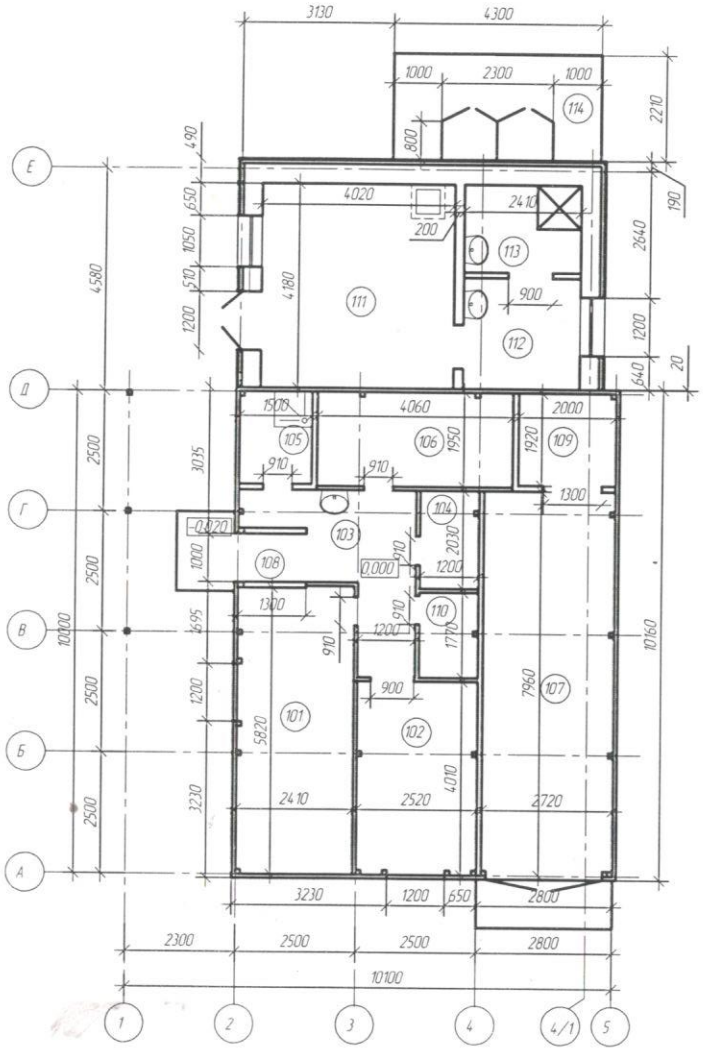

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м^2
101	Комната вет. специалистов	14,0
102	Комната вет. специалистов	10,1
103	Коридор	8,3
104	Склад для использованного вет. материала	2,44
105	Комната уборочного инвентаря	2,92
106	Кладовая для биопрепаратов	7,92
107	Гараж	21,65
108	Тамбур	1,2
109	Электрощитовая	3,84
110	Склад	2,12
111	Котельный зал	16,8
112	Комната персонала	5,5
113	Санузел с душевой	4,3
114	Навес для хранения газовых баллонов	9,5

Согласовано

Изм.	Колуч.	Лист	№док	Подпись	Дата	"Строительство ветеринарного пункта в с. Дубовка, Абайского района" Карагандинская обл., Абайский район, Дубовский сельский округ, село Дубовка, ул. Ковыльная			
ГИП		Новиков				Строительство ветеринарного пункта	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Малькина							
Проверил		Новиков				План на отм. 0,000	ТОО "Строй-Аст" лицензия № 16017992 от 23.11.2016		
