IT ENGINEERING SA

ОТЧЕТ

О проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за период ноябрь-декабрь месяцы 2021 года

Нур-Султан. 2021 г.

IT Engineering SA/ ИТ Инжиниринг СА
Address: 39 Abay Ave., Nur-Sultan 010000 / Адрес: 010000 г. Нур-Султан, пр. Абая 39
Post office/Почта: chancellery@bacontractors.kz
Tel/Тел: +7 717 269-10-33

ОТЧЕТ

О проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за период ноябрь-декабрь месяцы 2021 года

ФФ «IT Engineering SA»
(ИТ Инжиниринг СА)
в г. Нур-Султан
Директор Филиала Фирмы

_____ Пистаев А. К.

«___» _____ 2021 г.

Нур-Султан. 2021 г.

Содержание

Ситуационная схема ……	4
Объекты строительства……	4
Распределение специалистов авторского надзора……...	5
Выполненные виды работ за отчетный период…….....	5-7
Фотоиллюстрации выполненных работ за отчетный период ……..	8-26

Ситуационная схема.

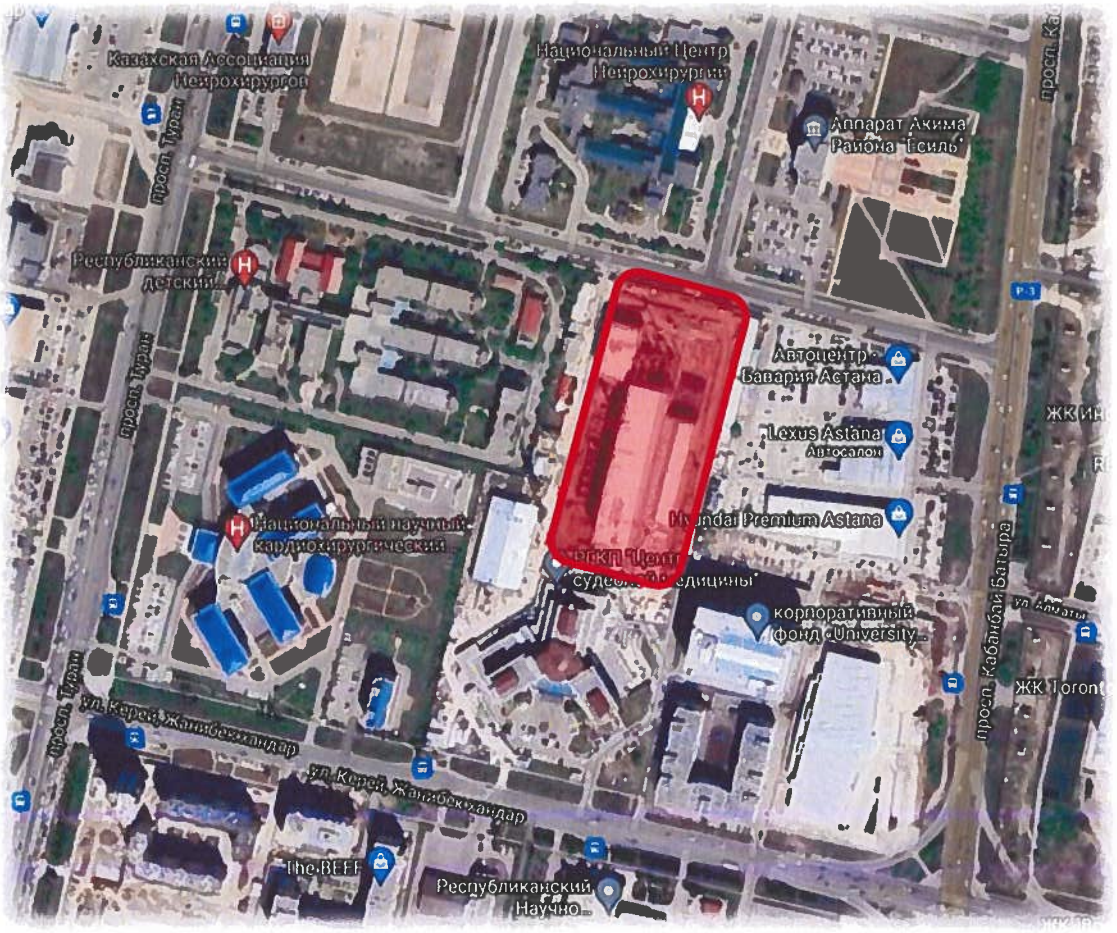

Объекты строительства.

Генеральным проектировщиком ФФ «IT Engineering SA» проводится работа по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Национальный научный онкологический центр в городе Нур-Султан» в рамках Договора №194 от 31.07.2019 года.

Работы по авторскому надзору ведутся под руководством инженеров Істілеу С.С, Казретовой А.К., Симница В

Представителями авторского надзора и от генерального проектировщика является Істілеу С.С, Казретовой А.К., Симница В

Экспертам авторского надзора было представлено задание на авторский надзор по строительству вышеназванного объекта от генерального проектировщика согласно Методическому документу Республики Казахстан «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» и оформлен журнал авторского надзора по объекту.

В процессе авторского надзора выполнен объем работ на соответствие производимых работ проектным решениям, действующим строительным нормам и правилам.

- **Распределение специалистов авторского надзора по объекту:**

№	Имя эксперта	Раздел согл. аттестата
1	Ізтілеу Сәбит Сәрсенбекұлы	АР, Нес/Огр
2	Казретовой Ажар Касымбековна	ОВиК, ВК , АПТ
3	Симница Ведат	ЭМ, ЭО, ЭС

В отчетный период, по приказу №ЦО-002, №ЦО-003 на оказание услуг по авторскому надзору объекта «Национальный научный онкологический центр в городе Нур-Султан», генеральный проектировщик предоставляет отчет по объектам, пропорционально выполненным строительно- монтажным работам.

В ходе осуществления авторского надзора по строительству объекта «проекту «Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек» г. Нур-Султан, специалистам авторского надзора были освидетельствованы работы, часть которых (наиболее существенные) отражены в таблице:

Месяц	**Период за ноябрь – декабрь месяцы**
Специалисты:	**Ізтілеу С.С., Казретова А.К., Симница В.**
Название объекта:	«Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек»
Генеральный подрядчик:	АФК «B&A Contractors SA»
Генеральный проектировщик:	ФФ «IT Engineering SA»
Выполненные виды работ за отчетный период:	**АР, Нес/Огр** • Бетонирование парапета по оси D 9-13 на отм. -0,62 +1,03 м. • Армирование стен композитной арматурой толщ. 600 мм в осях D-G 10-11 на отм. -5,720...(Циклотрон) • Бетонирование стен с композитной арматурой толщ. 600 мм в осях D-G 10-11 на отм. -5,720...(Циклотрон) • Армирование внутренних стен в осях D-G 10-11 на отм. -5,720...(Циклотрон) • Бетонирование внутренних стен в осях D-G 10-11 на отм. -5,720...(Циклотрон) • Армирование плиты перекрытия композитной арматурой толщ. 600 мм в осях D-G 10-11 на отм. -2,620...(Циклотрон) • Бетонирование плиты перекрытия композитной арматурой толщ. 600 мм в осях D-G 10-11 до отм. -2,020...(Циклотрон) • Армирование плиты перекрытия толщ. 600 мм в осях D-G 10-11 на отм. -2,020...(Циклотрон) Скваженное водопонижение канализационной насосной станции

	• Разработка котлована в осях А-Б/ 1-2 до отм.-6.900м • Забивка шпунтов Ларсена Л5-УМ (52 шт.) до отм.-0.150м. • Устройство щебеночного основания в осях А-Б/ 1-2 до отм.-6.800м • Устройство подбетонки под основание фундамента в осях А-Б/ 1-2 до отм.-6.700м • Устройство гидроизоляции под основание фундамента в осях А-Б/ 1-2 на отм.-6.700м • Армирование фундамента в осях А-Б/ 1-2 на отм.-6.650м • Бетонирование фундамента в осях А-Б/ 1-2 до отм.-6.350м • Монтаж металлоконструкций фасадных панелей Холла (каркас) по оси H-L/5-8 • Монтаж металлоконструкций МГП по оси А-В/12-14 • Монтаж металлических конструкций уселения кровли МГП • Устройство стилобата в осях D-H / 1Устройство наружнего витража по оси 25 / H-L с отм. +0.000 до отм. +3.900 м • Устройство наружнего витража по оси L / 25-24 с отм. +0.000 до отм. +3.900 м • Устройство наружнего витража по оси L / 11-8 с отм. +0.000 до отм. +3.900 м • Устройство наружнего витража по оси 8 / H-L с отм. +3.900 до отм. +31.000 м 0-15 на отм.-0,62м (Тип П.КР-1) • Отделка стен керамической плиткой в осях 3-17/ K-R на отм.-5.120 (Цоколь) ТИП Р3 • Отделка монолитных стен лестничного марша (Лестница F) в осях 11-12/Q-R на отм. +0.000/+10.350 м.(Блок ЕВ1) • Отделка монолитных стен лестничного марша (Лестница G) в осях 21-22/Q-R на отм. +0.000/+10.350 м.(Блок ЕВ1) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC2 в осях H-L 8-25 на отм. +2.600 и +3.000м (1-этаж) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC3.1 в осях H-L 8-25 на отм. +2.600 ..,+3.000м..,+4.000м (1-этаж) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC3.2 в осях H-L 8-25 на отм. +2.600 ..,+3.000м.. (1-этаж) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC2 в осях L-R 11-23 на отм. +2.600 (1-этаж,Блок ЕВ1) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC3.1 в осях L-R 11-23 на отм. +2.600..,+3.000м (1-этаж,Блок ЕВ1) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC3.2 в осях L-R 11-23 на отм. +2.600..,+3.000м (1-этаж,Блок ЕВ1) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC2 в осях L-R 11-22 на отм. +7.200 (2-этаж,Блок ЕВ1) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC3.1 в осях L-R 11-22 на отм. +7.200..,+7.600м (2-этаж,Блок ЕВ1) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC3.2 в осях L-R 11-22 на отм. +7.200..,+7.600м (2-этаж,Блок ЕВ1) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC2 в осях H-L 8-25 на отм. +7.200 ... +7.600м (2-этаж) • Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC3.1 в осях H-L 8-25 на отм. +7.200 ... +7.600м (2-этаж)

	• Устройство подвесного фальш-потолка ТИП FC3.2 в осях H-L 8-25 на отм. +7.200 ... +7.600м (2-этаж) • Устройство подвесного потолка (ARMSTRONG METAL) ТИП FC4 в осях I-L 12-25 на отм. +22.400 (5-этаж) • Устройство подвесного потолка (ARMSTRONG ACOUSTIC) ТИП FC1 в осях H-L 8-25 на отм. +12.800... +13.200 (3-этаж) • Устройство керамической плитки (лестница G) в осях Q-R 21-22 с отм.+0.000 м до отм +10.350m
	ЭМ, ЭО, ЭС
	• Расключение распределительной коробки сетей освещения и розетки на отм. +0,62; +4,50; • Монтаж шкафов 0.4 кВ на отм. +0,62; +4,50; +5,72; 14,70; • Прокладка кабеля для сетей освещения на отм. +4,50; +10,10; 14,70; • Монтаж Светильников на отм. +19,30; • Тех.блок: монтаж кабельных лотков; • Монтаж ячеек среднего напряжения; • Монтаж трансформаторов
	ОВиК, ВК , АПТ
	• Насосы систем пожаротушение; • Монтаж сплинкерных оросителей систем АПТ; • Насосы для подачи топлива; • Насосы систем ГВС; • Монтаж колориферов тех блок 0-1 этаж и основной блок 3 этаж; • Радиаторы 1-2 этаж основной блок; • Радиаторы для предварительного нагрева воздуха; • Насосы систем холодоснабжение тех блок 0этаж; • Обвязка паровых котлов; • Насосы контура водогрейных котлов 1 этаж тех блок

Фотоиллюстрации выполненных работ за отчетный период	**АР, Нес/Огр**

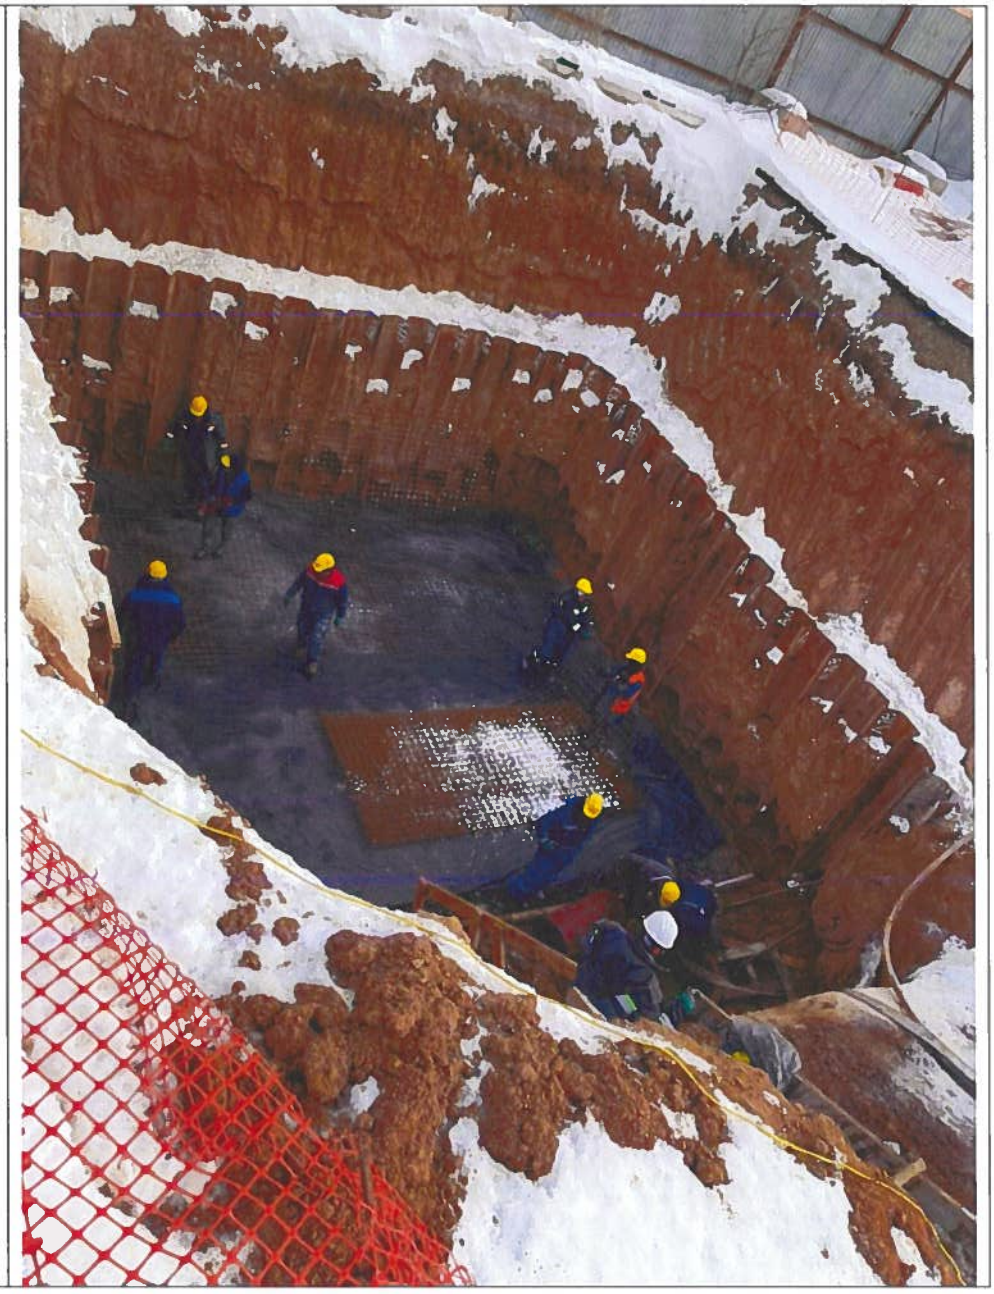

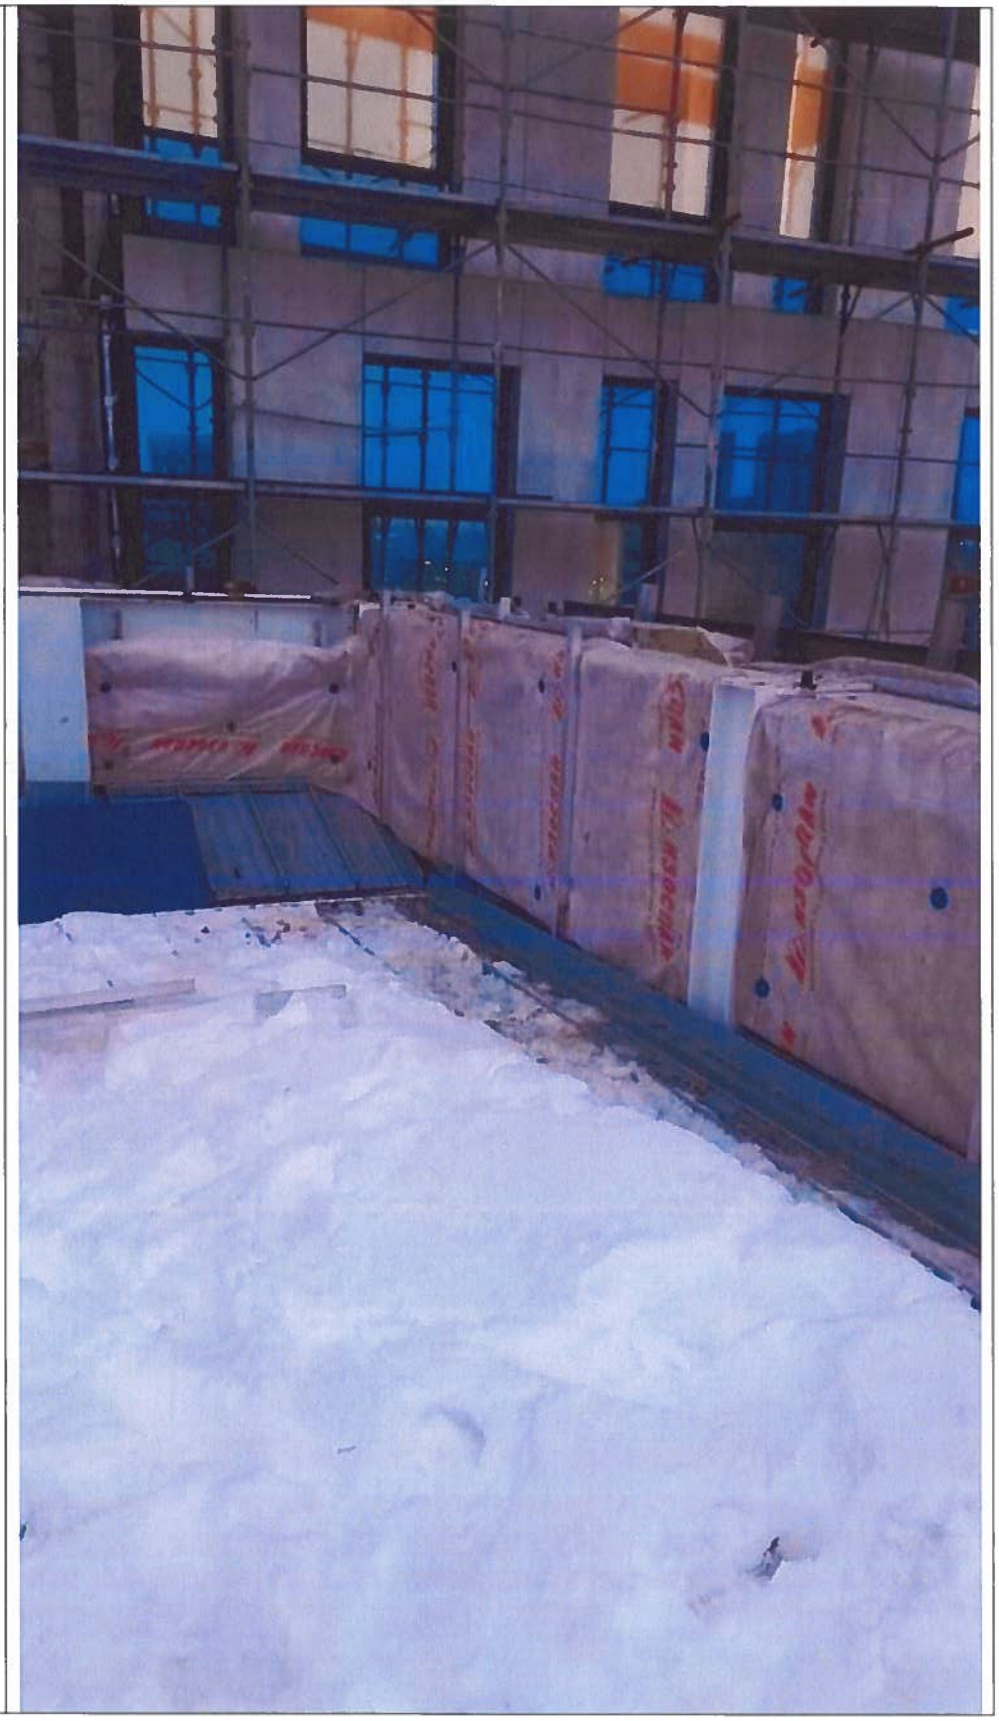

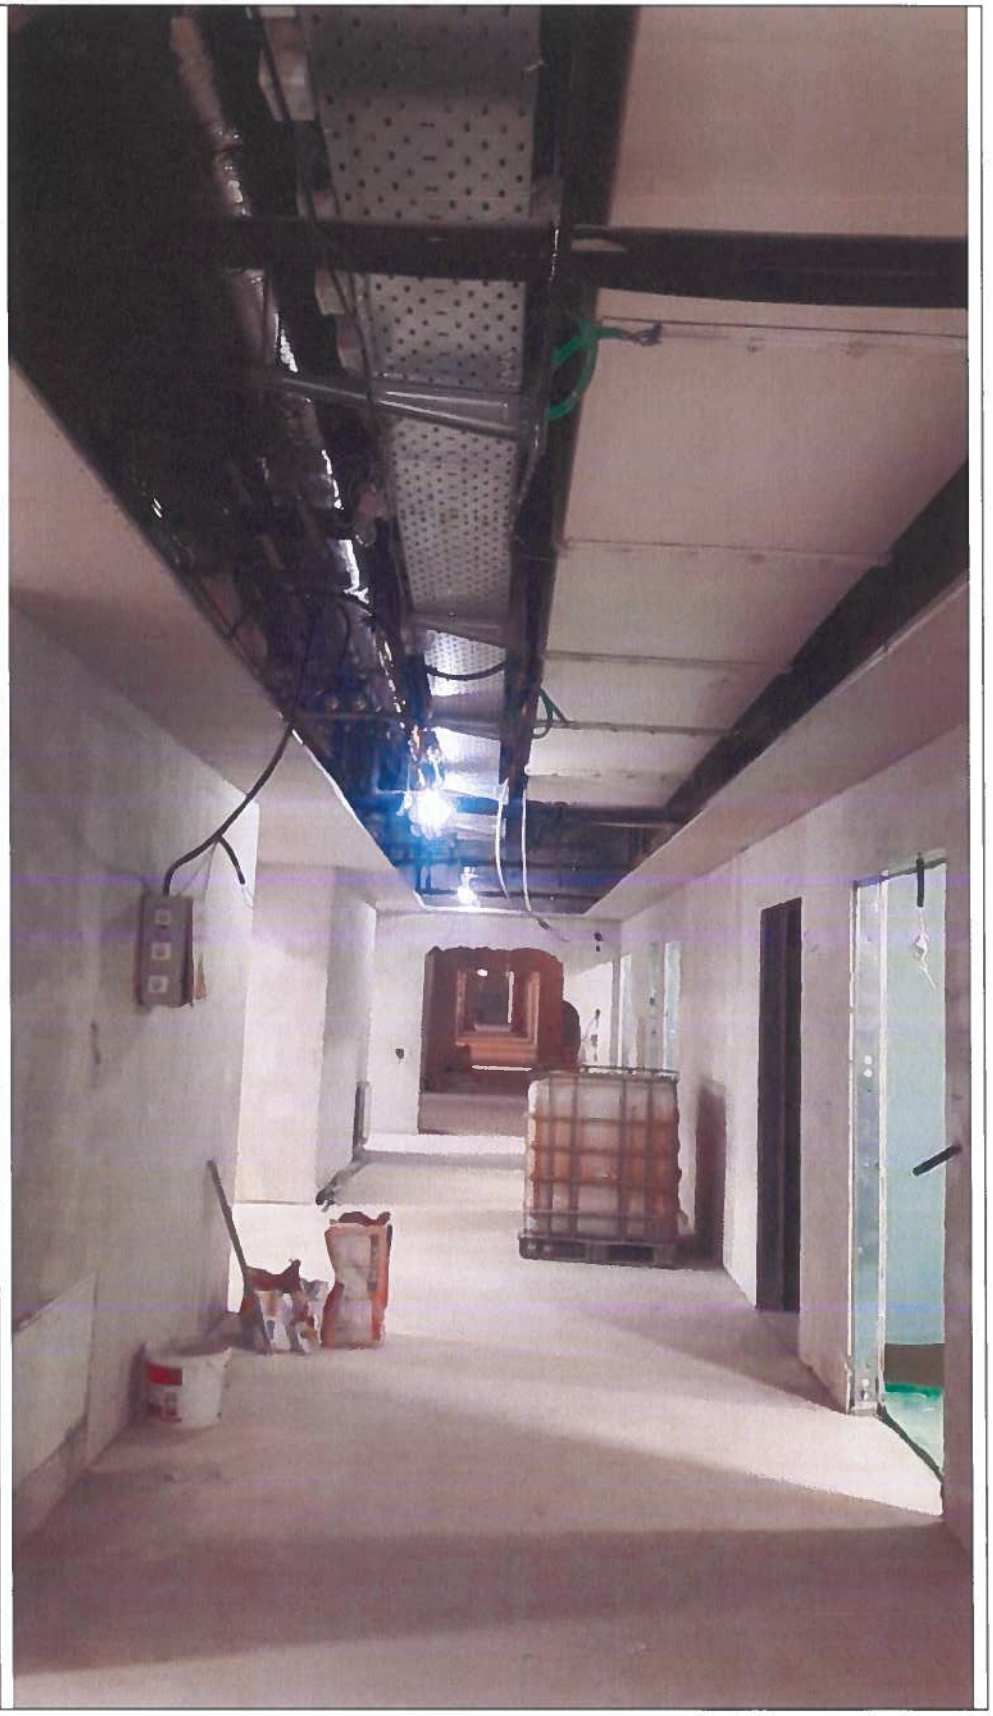

ЭМ, ЭО, ЭС

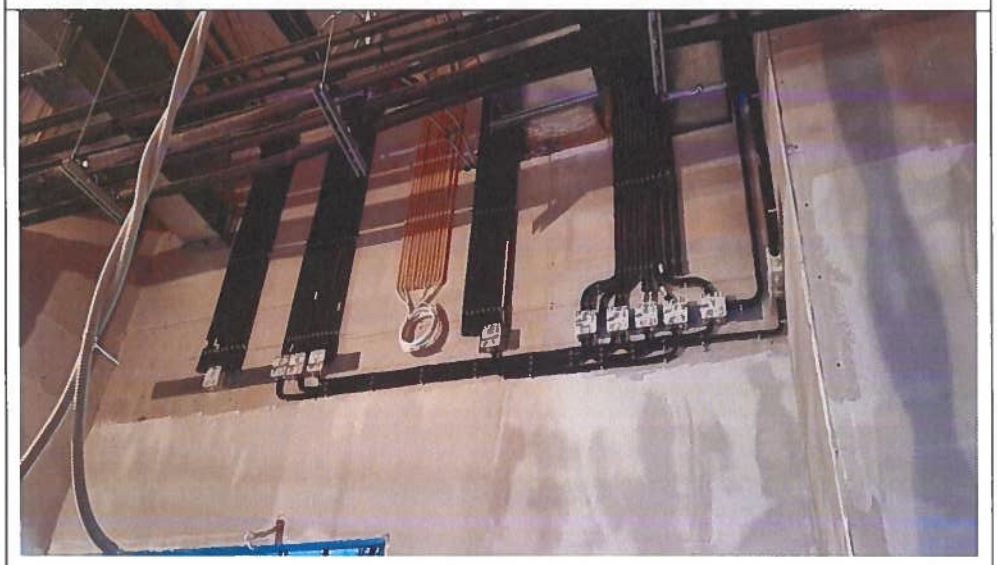

	ОВиК, ВК , АПТ
	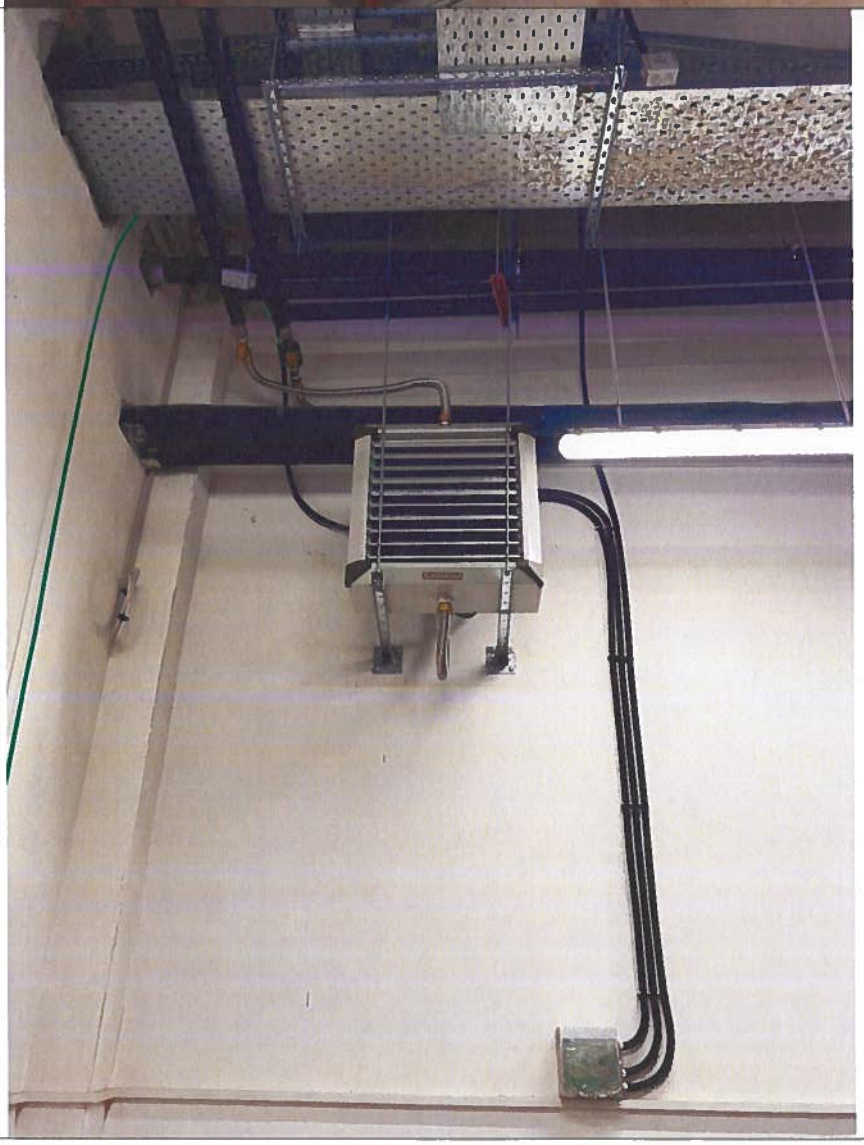

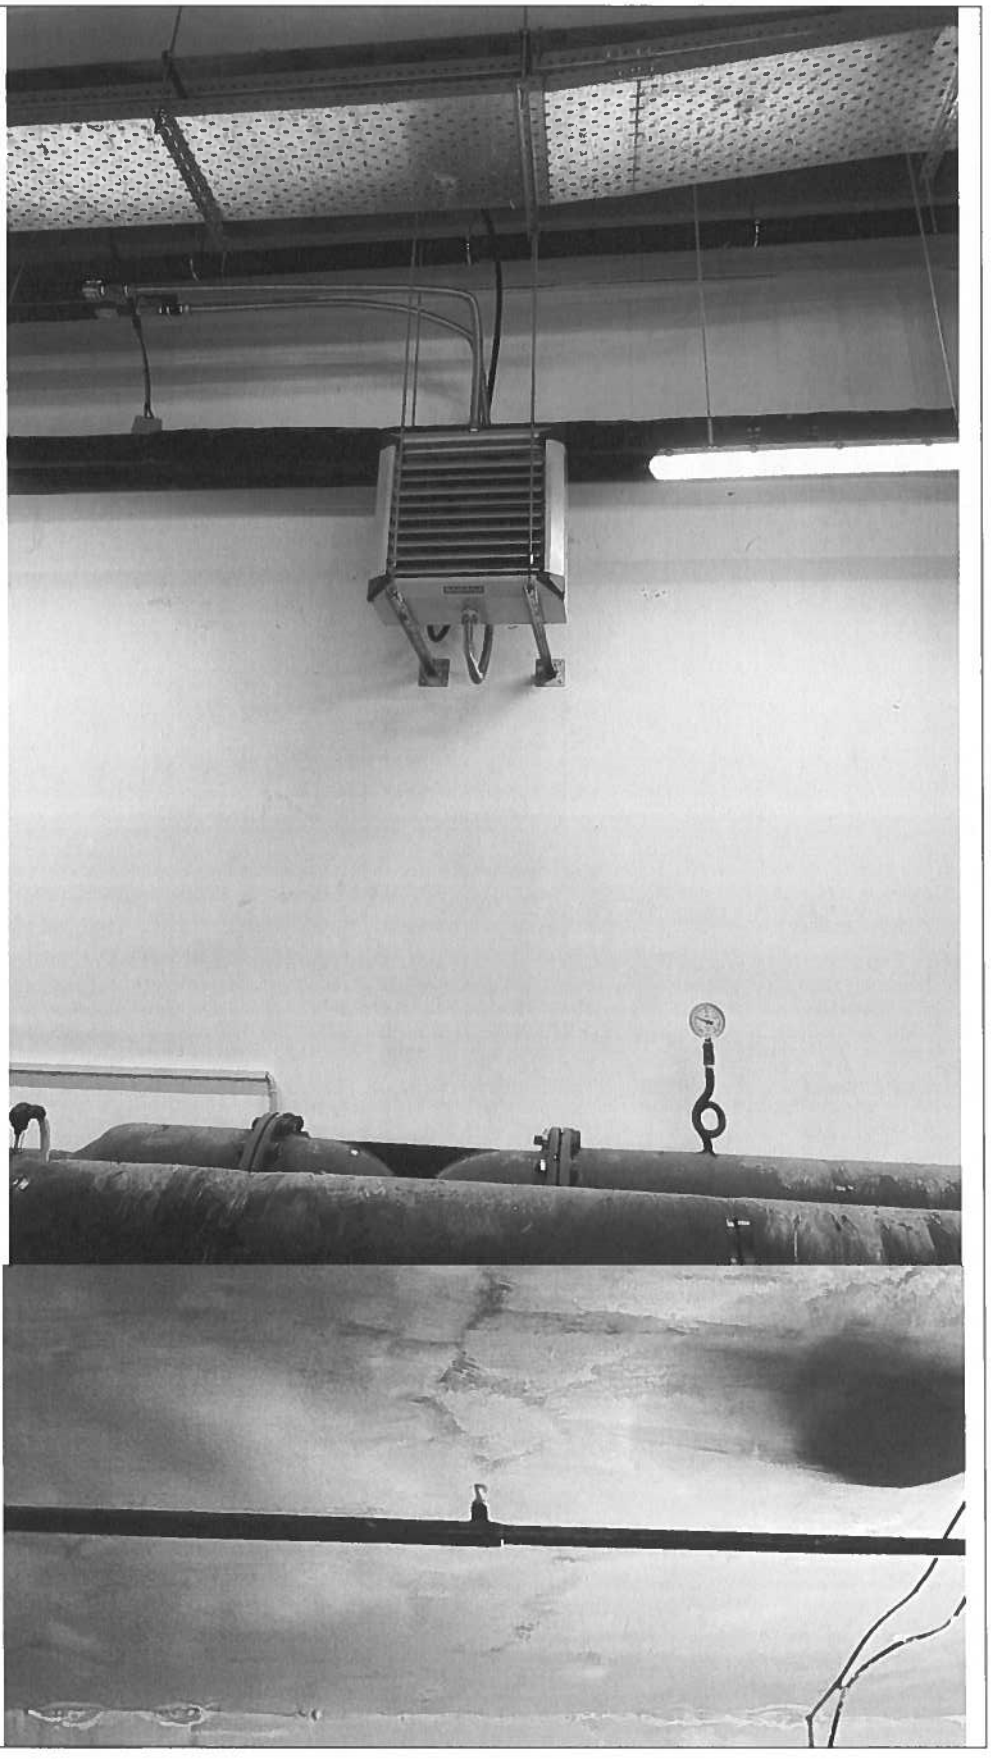

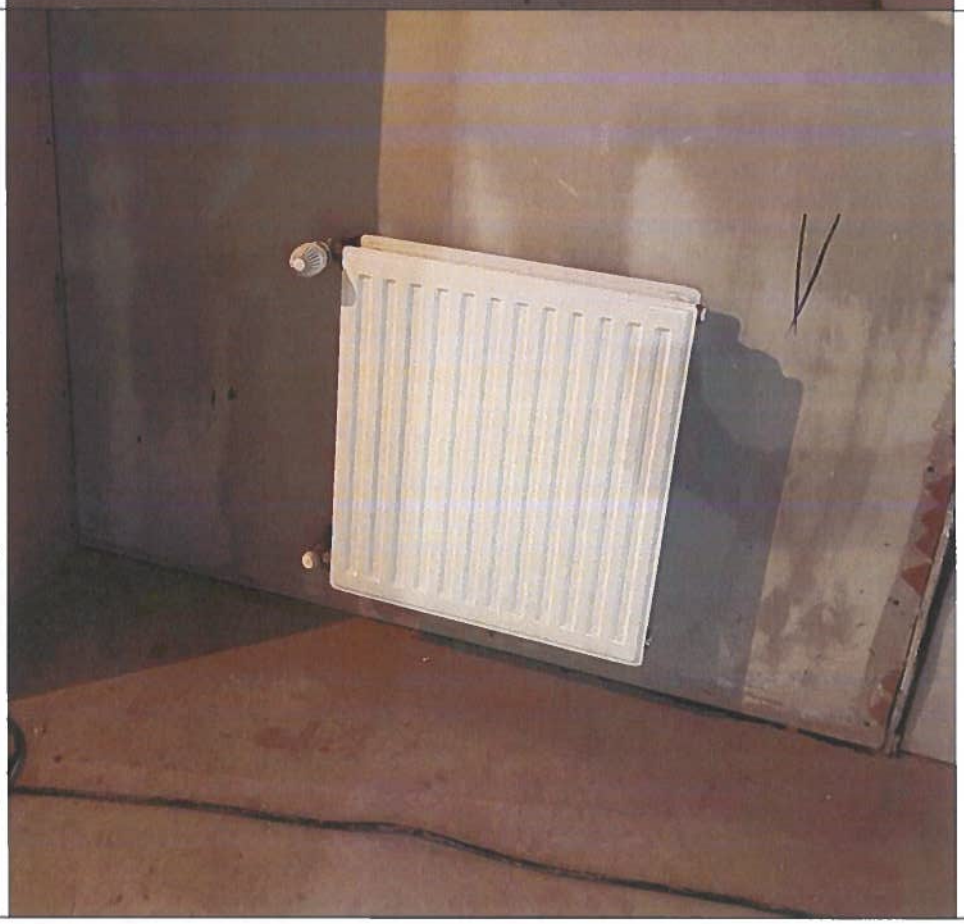

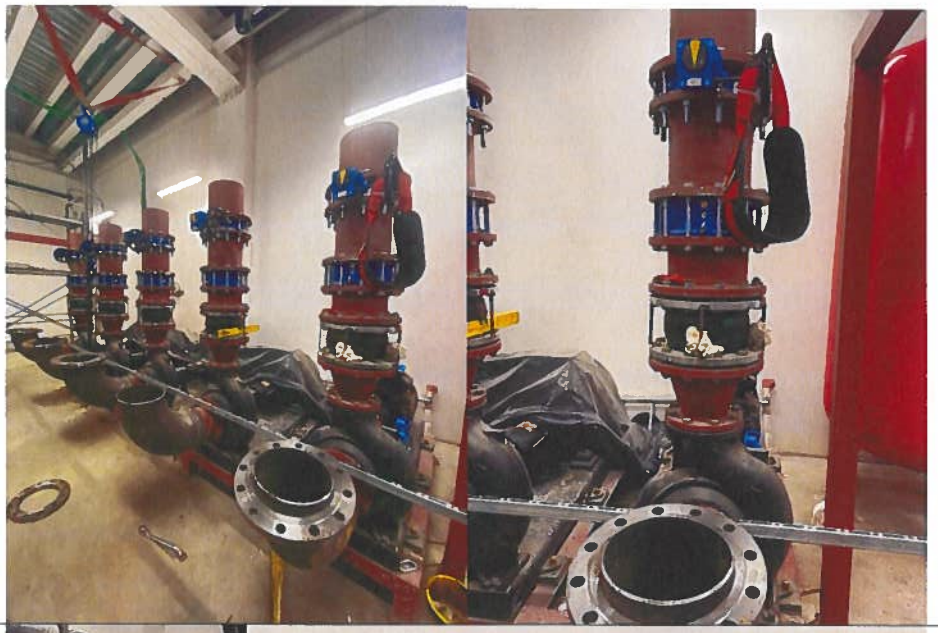

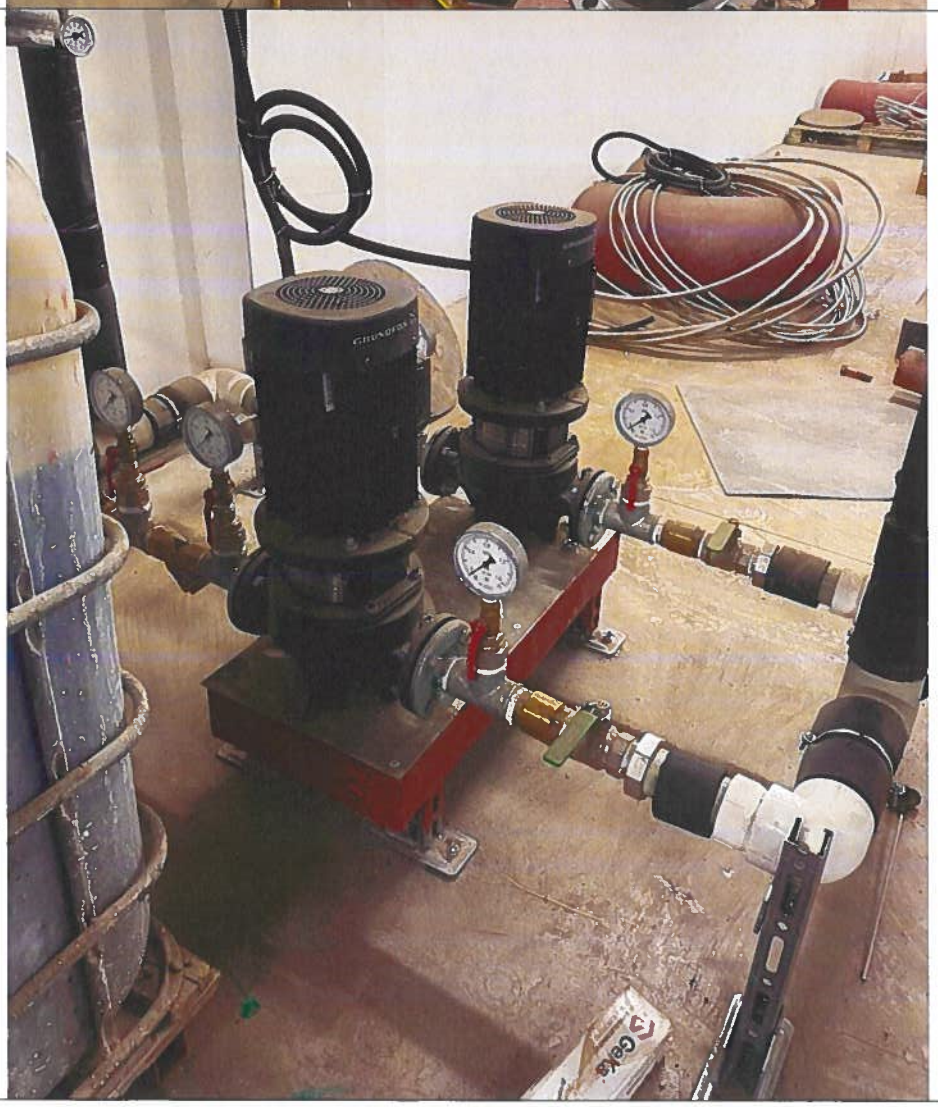

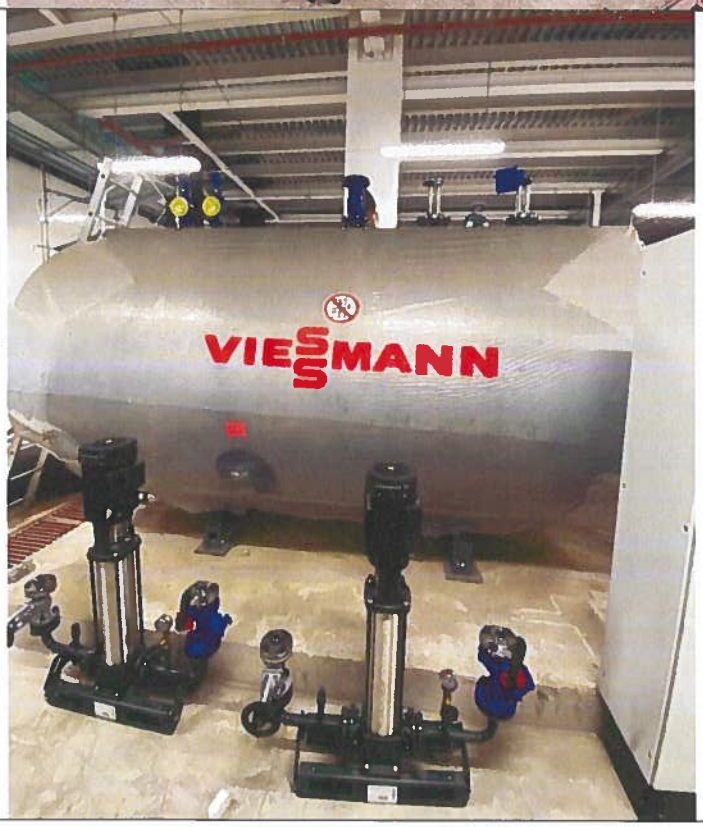
VIESMANN
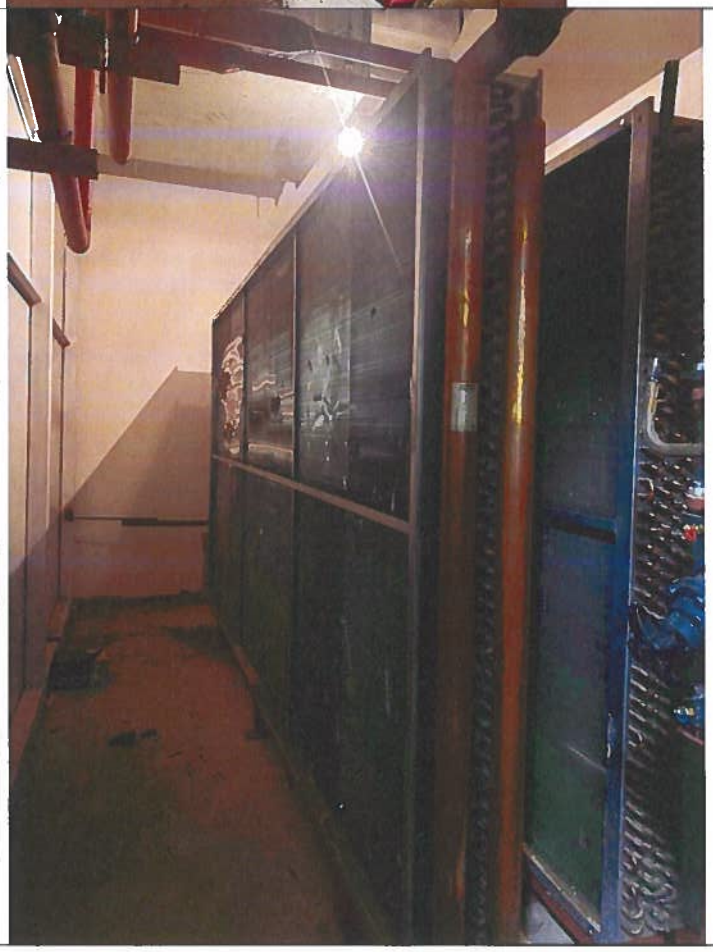
MACOC 1
