ТОО «Инженер +»

ЗАКАЗ: № 10/19

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

" Проведение электро линий для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО "

Проект организации строительства

Директор **Жайтуганов Р.Н.**

Главный инженер проекта **Бисембаев А.Ш.**

Уральск 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
ПРИНЯТЫЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 4
2.1 Краткая характеристика площадки строительства 4
3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 5
4. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 6
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 7
6. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 7
6.1 Общестроительные работы 8
6.1.1 Разбивочные геодезические работы 8
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 9
7.1 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях 9
7.2 Потребность в электроэнергии 9
7.3 Потребность в воде 10
8. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 2
9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4
10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям т руда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства 5
11. Календарный план производства работ 2
ПРИЛОЖЕНИЯ 2
Приложение 1 Ведомость машин и механизмов 2
Строительный генеральный план

ПРИНЯТЫЕ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Перечень нормативных документов, используемых при разработке проекта приведен в таблице ниже.

Принятые нормы и стандарты

№ п/п	Шифр и номер документа	Наименование документа
Нормативные документы, действующие на территории РК		
1.	СН РК 1.03-00-2011*	Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений
2.	СП РК 1.03.102-2014 Часть II	Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений
3.	Пособие к СНиП РК 1.04.03-2008	Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений
4.	Пособие к СНиП РК 1.03-06-2002	Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений
5.	СНиП РК 1.01-32-2005*	Строительная терминология
6.	СНиП РК 1.01-01-2011	Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства.
7.	СН РК 1.02-03-2011	Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство
8.	СНиП РК 1.03-05-2001	Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
9.	ППБС 01-94	Правилапожарной безопасности при строительно-монтажных и огневых работ.
10.	ПУЭ РК	Правила устройства электроустановок
11.	СН РК 4.03-01-2011	Газораспределительные системы
12.	СН РК 4.01-03-2011	Водоотведение. Наружные сети и сооружения
13.	СНиП РК 1.03-26-2004	Геодезические работы в строительстве
14.	СНиП РК 3.01-03-2010	Правила по благоустройству территории населенных пунктов
15.	СНиП РК 2.02-05-2009*	Пожарная безопасность зданий и сооружений
16.	СНиП 3.05.04-85*	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
17.	Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177	Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общие данные

Проектом предусматривается: «Проведение электро линий для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО».

Целью настоящего проекта является обеспечение электро энергией качества 42 земельного участка с Оленти.

Исходными данными для разработки проекта являются:

- задание на проектирование, утвержденное в 2019 г.;
- акт выбора участка;
- архитектурно-планировочное задание;

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
КТП 160кВА - 1 комп. 1.Провод сталеалюминиевый, сеч. 50мм² 3АС50/8 – 950 м; 2.Самонесущий изолированный провод, без несущей жилы, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена, сечение - 4×70+35мм². СИПн-4 – 855 м; 3.Самонесущий изолированный провод, без несущей жилы, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена, сечение - 4×95+35мм². СИПн-4 – 407 м; 4.Самонесущий изолированный провод, без несущей жилы, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена, сечение - 4×16мм². СИПн-4 – 800 м;	Общая сметная стоимость строительства в базисных ценах 25675,44 тыс.тенге г., в том числе СМР 17390,79 тыс.тенге. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 25675,44 тыс.тенге года, в том числе СМР 17390,79 тыс.тенге. Продолжительность строительства – 1,5 месяцев. (III квартал 2020 года)

2.1 Краткая характеристика площадки строительства

Разработка "Проведение электро линий для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО"

выполнено на основании технических условий на электроснабжение N°7-32-3/21 от 30.05.2019г., выданных АО "Зап.Каз.РЭК", задания на проектирование, генерального плана и других частей проекта и в соответствии с требованиями РДС

По степени надежности электроснабжения объект относится к III категории.В соответствии с техническими условиями подача электроэнергии провод принят марки АС сечением 50 мм²

по ГОСТ 839-80.Строительство ВЛ предусмотрено по действующему типовому проекту 3.407.1-143. выпуск 1

Промежуточная опора принята типа П10-2 со стойкой типа СВ105-5.0 Концевая анкерная опора принята типа А10-1 со стойками типа СВ105-5.0 Угловая анкерная опора принята типа УА10-1 со стойками типа СВ105-5.0

Установка разъединителя на концевой опоре. Стойки опор устанавливаются в пробуренные котлованы глубиной 2,5/3 м и диаметром 350-450 мм. На устройстве ответвления и опорах приняты штыревые изоляторы типа ШФ-20В, на концевых опорах приняты подвесные изоляторы типа ПС-70. Заземление траверс выполнить их присоединением к верхнему заземляющему проводнику сваркой или зажимом ПС-2.

Точкой подключения основного электропитания является от существующей опоры N42 ВЛ-10кВ Л-8 22 партсъезд ПС-110/35/10кВ "Жымпита",

Настоящим проектом предусматривается:

1) Выполнить строительство 42 ВЛ-10кВ Л-8 22 партсъезд ПС-110/35/10кВ "Жымпита", до КТПН-10/0,4кВ.

2) Установить КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок.

3) Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-ом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов.

4) Проектируемая ВЛ-10кВ выполнена согласно типового проекта ТП 3.407.1-143 выпуск 1 и выпуск

Проектом предусматривается установка КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок. Согласно установленной мощности-S=63,4кВт и с учетом перспективного роста нагрузок микрорайона КТПН-10/0,4кВ должна быть укомплектована трансформатором ТМ мощность 160кВА.

ВЛ-0,4кВ. Проектом предусматривается строительство ВЛ-0,4кВ с СИП-ом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов.ВЛ-0,4кВ выполнена проводом типа СИПн-4 с сечением 4х70/4х95мм². Для наружного освещения выполнена проводом типа СИПн-4 с сечением 2х35мм²,в качестве источников наружного освещения проектом приняты светильники с пускорегулирующей аппаратурой серии световодный светильник , которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ. Ответвления к жилым домам выполнены проводом типа СИПн-4 с сечением 2×16мм².

Все работы по монтажу выполняются согласно проекта ОАО "Казсельэнергопроект" ПОСОБИЕ по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ с изолированными проводами(ВЛИ) с линейной арматурой ТОО "ЭНСТО"».

Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ, ПТБ и СНиП

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с СП РК 1.03.102-2014 Часть II при строительстве системы водоснабжения или(и) канализации в комплексе с другими нормируемыми объектами (воздушная линия электропередачи) общая продолжительность строительства комплекса определяется по формуле:

$T = T_{макс} + (T_1+T_2+T_3+T_4) \times K$ (5)

где – $T_{макс}$ – максимальная продолжительность строительства одного из объектов по норме. Электроснабжение с максимальной протяженностью 10,0 км.

Наибольшую норму продолжительности строительства принимаем по таблице Б.5.2.1 СП РК 1.03.102-2014 Часть II. В соответствии с пунктом 23 «Воздушная линия электропередачи» Напряжением 6-10-20 кВ протяженностью 1 км = 1 месяцев. Электроснабжения с максимальной протяженностью равна = 1 км, для расчета используем метод экстраполяции по формуле:

$$T_н = T_м \sqrt[3]{\frac{П_н}{П_м}}$$

где $Т_н = T_{макс}$- нормируемая продолжительность определяемая экстраполяцией.

$Т_м$– максимальное значение нормативной продолжительности в пределах рассматриваемого интервала = 1 мес.

$П_м$– максимальное значение показателя (мощности) в пределах рассматриваемого интервала = 1 км.

$П_н$– фактическое значение, показатель объекта 1 км.

$$Т_н = 5\sqrt[3]{\frac{1}{1}} = 0{,}75 \text{ мес.}$$

$T_{макс}$ = продолжительность строительства с учетом экстраполяции равна = 1 месяца.

Тогда общая продолжительность строительства Т равна:

T = 0,75 + (1+1+1+2) х 0,15 =1,5 мес.

Общая продолжительность строительства составляет **1,5 месяцев** в том числе подготовительный период 0,2 мес.

Начало строительства III квартал 2020 года.

4. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Принципиальная схема организации строительства определяет сроки, организационно-технологическую схему последовательности строительства и ввод в эксплуатацию объекта в нормативный срок. Принципиальная схема строительства разработана для организации строительства поточным методом ведения работ в одну смену.

Производство СМР планируется вести специализированными четырьмя потоками параллельно в три периода:

- подготовительный период;
- основной;
- заключительный.

Основной и заключительный периоды совмещены во времени.

В подготовительный период строительства должны быть выполнены следующие работы:

- подготовка полосы газоснабжения (расчистка кустарника, снос и перенос строений и коммуникаций, при необходимости осушение территорий);
- постройка базовых и при объектных временных ремонтных, материально-технических баз и складов.

В основной период строительства предусматривается выполнение основных специальных работ потоками по строительству:

- поселковых газопроводных сетей

В составе комплексных потоков при разработке ППР должны предусматриваться объектные и специализированные потоки, количество которых должно обеспечивать выполнение работ в сроки, установленные календарным планом ПОС.

Строительство сетей наружных сетей как основного, наиболее трудоемкого в возведении объекта определяет общие сроки завершения объекта, так как он является ведущим, срокообразующим объектным потоком, а остальные работы должны предшествовать строительству сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Календарным планом организации строительства определены: оптимальная продолжительность и последовательность выполнения основных работ, а также сдача объекта в эксплуатацию.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Производство всех строительно-монтажных работ предусматривается с ведением работ в одну смену. Работы в ночное и сумеречное время суток не предусмотрены.

Обеспечение нужд строительства в местных материалах, конструкциях и изделиях предусматривается осуществлять из существующих карьеров, щебёночных заводов, заводов ЖБИ .

Доставку материалов, конструкций и изделий к объектам строительства предусматривается осуществлять по существующей сети автомобильных дорог.

Складирование строительных материалов и конструкций предусмотрено в специально отведенных местах. Кратковременное складирование (в количестве сменной потребности) допускается осуществлять непосредственно в местах производства работ.

Заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами осуществляется на городских заправочных станциях или автозаправщиком.

Обеспечение строительства сжатым воздухом предусматривается от передвижных компрессорных установок.

Отопление бытовых и производственных помещений предусматривается посредством передвижных ЭС.

Обеспечение бытовых городков и стройплощадок питьевой водой предусматривается с использованием покупной бутилированной питьевой воды в емкостях по 20 литров с использованием одноразовых стаканов.

Питание строителей предполагается осуществлять в столовых-раздаточных. Перевозка рабочих до мест производства работ и обратно предусматривается автотранспортом. В связи с транспортной доступностью и близостью к городской инфраструктуре потребность во временных зданиях для проживания рабочих не предусматривается.

Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования и привозная вода должна храниться в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием. Обеспечение стройплощадок питьевой водой предусматривается с использованием покупной бутилированной питьевой воды в емкостях по 20 литров с использованием одноразовых стаканов.

Сброс хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в специальные емкости (септики) с последующим вывозом.

Связь на объекте осуществляется посредством сотовых телефонов.

6. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

При производстве работ соблюдать требования СНиП РК 1.03-05-2001, СНиП РК 2.02-05-2009*, СНиП РК 5.03-34-2005, СНиП РК 5.03-37-2005, СНиП 2.11.03-93,СНиП РК 5.04-18-2002, СНиП РК 5.01-01-2002, СНиП РК 4.04-10-2002, СНиП РК 2.02-15-2003, СНиП 3.06.03-85, ГОСТ 12.3.002-75*, ГОСТ 12.3.009-76*, ГОСТ 7473-2010.

К началу работ по прокладке электроснабжение следует:

- выполнить вертикальную планировку территории;
- произвести геодезическую разбивку трассы с закреплением на местности;
- обозначить (отшурфовать) пересекаемые или находящиеся в зоне работы действующие подземные (надземные) коммуникации;
- доставить на строительную площадку песок, трубы, машины, приспособления согласно ППР;
- отрыть траншею (при необходимости выполнить крепление вертикальных стенок).

6.1 Общестроительные работы

6.1.1 Разбивочные геодезические работы

Геодезическое обеспечение строительства должно выполняться в соответствии со СНиП РК 1.03-26-2004 «Геодезические работы в строительстве», РДС РК 1.03-03-2001 «Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве».

В процессе строительства необходимо осуществлять геодезический (инструментальный) контроль за соответствием положения элементов, конструкций и частей сооружений, инженерных сетей проектным решениям как в процессе их монтажа и вре-

менного закрепления, так и после их монтажа (укладки, закрепления) и установки. Исполнительную съемку подземных коммуникаций следует выполнять до засыпки траншей.

Вынос отметок дна траншеи выполняют нивелиром с закреплением отметок на специально забитых колышках. Уклон дна траншеи согласно проекту выполняют по визиркам.

В открытой траншее производят добор грунта, выравнивание (планировку)дна траншеи вручную с проектным уклоном.

Песок или грунт для основания подают в траншею краном с бадьей вместимостью 1 м3. Грунт в бадью засыпают из самосвала или экскаватором (погрузчиком).

Грунт в основании под укладку труб уплотняют ручными электрическими трамбовками ИЭ-4502 и ИЭ-4505.

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением на предмет сохранности и устойчивости.

В зоне месторасположения знака складирование строительных конструкций и материалов допускается не ближе 2 м от центра знака.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

При составлении настоящего ПОС применены данные с аналогичного объекта, исходными данными которого послужили материалы из сметной программы АВС-4. В результате определены объемы основных работ и потребности в энергетических, материально-технических ресурсах и транспортных средствах, а так же ведомость объемов работ.

Потребности в строительных конструкциях и материалах приведены в приложении3. Потребности в машинах и механизмах приведены в приложении 2.

7.1 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях производится по формуле: $S_{тр} = P_н \cdot K \cdot 0,1$, где:

К- нормативный показатель площади;

$P_н$ - количество рабочих в наиболее многочисленную смену;

$S_{тр}$ – требуемая площадь инвентарных зданий.

0,1 – показатель площади на 10 человек

Контора $S_{тр}$ = 10·3,8·0,1= 3,8 м^2, где 10 – количество ИТР служащих и МОП в одну смену.

Открытые площадки для отдыха и места для курения – определяются по количеству рабочих в наиболее многочисленную смену при норме 0,2м^2·45 = 9 м^2.

Таблица 7.2.1

№	Наименование	Кол-во (шт.)	Длина (м)	Ширина (м)
Мобильные здания (вагончики)				

1	Контора	1	6,7	3,0
2	Здание отдыха	1	6	2,7
3	Кладовая материальная	1	6,4	3,1

7.2 Потребность в электроэнергии

На период строительства для целей строительного производства предполагается использовать дизельный генератора компании FG Wilson:

– для работающих машин мощность генератора – 250 кВт;

Результаты расчетов потребности в электроэнергии приведены в таблице 7.1.1

Таблица 7.2.1

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Расчётное значение
1	Мощность электромоторов работающих машин (К = 0,5)	кВт	230
2	Мощность внутренних осветительных приборов (К = 0,8)	кВт	20
3	Мощность наружных осветительных приборов (К = 0,9)	кВт	98
4	Мощность сварочных аппаратов (К = 0,6)	кВт	42

7.3 Потребность в воде

На период строительства для целей строительного производства предусматривается привозная вода в автоцистернах для воды. Результаты расчетов потребности в воде приведены в таблице 7.2.1

Таблица 7.3.1

№	Показатель	Расч. значение	Ед изм.
	Потребность в воде	4,2	л/с
1	Расход воды на производственные потребности	0,4	л/с
2	Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности	0,1	л/с
3	Расходы воды на пожаротушение	5	л/с

8. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Проектом учтены требования СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружения», СНиП РК 2.09-03-85 «Сооружения промышленных предприятий», СНиП РК 3.02-09-2010 «Производственные здания».

При производстве работ по прокладке сетей связанных с размещением рабочих в траншее, могут возникнуть следующие опасные и вредные производственные факторы, связанные с характером работы:

- обрушающиеся горные породы (грунты);
- падающие предметы (куски породы);
- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые имипредметы;
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- химически опасные и вредные производственные факторы.

Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов безопасность работ при укладке трубопроводов и размещении рабочих мест в траншее должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий по охране труда:

- соблюдение безопасной крутизны незакрепленных откосов траншей с учетом нагрузки от машин и грунта;
- выбор типов машин и средств малой механизации, применяемых приукладке труб, и мест их установки;
- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивостиоткосов в связи с сезонными изменениями;
- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, атакже лестниц для спуска работников к месту работ.

К выполнению работ по монтажу сетей допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостоверения.

Перед допуском к самостоятельному выполнению работ с рабочими проводится первичный инструктаж на рабочем месте по безопасному производству работ с записью результатов инструктажа в «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте».

Вновь принимаемые на работу должны пройти вводный инструктаж с записью в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».

Нахождение посторонних людей в зоне работ не допускается.

Спуск рабочих в траншею и их подъем должен выполняться по трапам шириной не менее 0,6 м или инвентарным лестницам, установленным за границей опасной зоны для прохода людей при работе машин.

Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.

К управлению строительными машинами запрещается допускать рабочих, не имеющих удостоверений на право управления машиной.

Проносить грузы кранами в зоне работы людей запрещается. На месте работ должны быть вывешены предупредительные знаки.

Рабочие зоны и участки производства работ в населенных пунктах или на территории действующих организаций, которые выходят на улицы, проезды, во дворы населенных пунктов, а также в других местах возможного движения людей и транспорта во избежание доступа посторонних лиц, должны быть ограждены защитными ограждениями с установкой на них хорошо видимых как днем, так и в темное времясуток предупредительных надписей, а в ночное время - и сигнальное освещение.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Строительное производство в неосвещенных местах не допускается. Проект временного электроосвещения выполняет специализированная организация по заказу подрядчика.

При опускании труб в траншею с помощью веревок нахождение рабочих в зоне работ (l трубы + 3 м) не допускается.

При работе в колодцах, камерах должны быть приняты меры, обеспечивающие полную безопасность людей.

Работники, занятые на работах по обезжириванию трубопроводов, должны быть обеспечены соответствующими противогазами, спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчатками, а место проведения обезжиривания необходимо оградить и обозначить знаками безопасности.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране труда, имеющие III группу по электробезопасности.

Переносные электроинструменты, электромеханизмы, светильники должны иметь напряжение не выше 42 В.

Рабочие, работающие при повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, должны быть обеспечены индивидуальными и коллективными средствами защиты.

В случае возникновения пожара и загорания труб из полимерных материалов их следует тушить обычными средствами пожаротушения, а при пожаре в закрытом помещении следует применять изолирующие противогазы.

Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов из полимерных материалов на плотность следует производить после надежной при грузки грунтом высотой 0,8 м посередине испытываемого трубопровода и устройства упоров по их концам на поворотах и ответвлениях. При испытаниях запрещается стучать по трубам и сдвигать их с места.

Осмотр трубопроводов разрешается производить толькопосле снижения давления до 0,3 МПа, а устранение дефектов производить послеснижения давления в трубопроводах до атмосферного.

При монтаже и испытаниях трубопроводов запрещается прислонять к ним лестницы и стремянки, ходить по трубопроводу. Запрещается обстукивать трубы молотком или оттягивать их от стенок траншеи или строительных конструкций.

При монтаже сетей необходимо строго соблюдать требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Экологическими требованиями к строительству и реконструкции предприятий, сооружений и других объектов Экологического кодекса Республики Казахстан строительно-монтажные работы осуществляются при наличии положительных заключений государственных экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз и в соответствии с нормативами качества окружающей среды. При выполнении строительных работ должны приниматься меры по рекультивации земель, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов, благоустройству территорий.

При проведении строительных работ следует по возможности предусматривать малоотходные и безотходные технологии с целью охраны окружающего воздуха, вод, земель.

Важнейшим условием сохранения окружающей среды, рационального и бережного использования природных ресурсов является:

- строительство проектируемых сооружений в границах отводимых участков;
- обеспечение максимальной сохранности существующей растительности при организации строительных площадок.

Запрещается устройство неорганизованных свалок бытовых отходов и строительного мусора.

Заправка автотранспорта и строительной техники осуществляется в строго отведенных местах. Оборудованных закрытыми емкостями (сменными контейнерами) для сбора отработанных ГСМ, бытовых и производственных стоков.

Твердые отходы и проливы ГСМ собираются и систематически отправляются на утилизацию данных видов отходов или вывозятся в специально отведенные места.

По окончанию строительства необходимо проведение восстановительных работ по благоустройству с очисткой территории, восстановлению нарушенного почвенного покрова временных площадок и по трассам внеплощадочных инженерных сетей.

Запрещается сжигание или закапывания отходов и мусора.

На площадках производства работ устанавливаются биотуалеты.

Для предотвращения загрязнения водной среды необходимо предусмотреть:

- выполнение строительных работ за пределами водоохранных зон водных объектов;
- устройство под объекты насыпного основания;
- устройство твердого покрытия из дорожных плит на площадках и подъездных автодорогах.
- Для обеспечения экологической безопасности необходимо осуществить решение следующих задач:

- обеспечить надежную и безаварийную работу технологического оборудования, транспорта и спецтехники;
- стремиться осуществлять: сбор отходов только организованными бригадами с соблюдением всех необходимых мер предосторожности (наличие спецодежды и индивидуальных средств защиты);
- разделение отходов по классам опасности и временное хранение в специальных герметичных контейнерах, сборниках и других емкостях, оснащенных плотно закрывающимися крышками и с соответствующим обозначением класса опасности отхода (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и.п.) согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации;
- размещение контейнеров на специально отведенных огороженных площадках, имеющих твердое покрытие (асфальт, бетон), с целью исключения попадания загрязняющих веществ в почву, грунт и затем в подземные воды;
- удаление накопившихся отходов с площадок временного хранения согласно графику вывоза отходов, установленного Компанией;
- перевозку отходов в герметичных специальных контейнерах, исключающих возможность загрязнения окружающей среды во время их транспортировки или в случае аварии транспортных средств;
- перевозку отходов под строгим контролем. Для этого, движение всех отходов должно регистрироваться в специальном журнале, подвергаться весовому и визуальному контролю;
- транспортировку опасных отходов в соответствии со статьей 294 Экологического кодекса Республики Казахстан (№212-11 от 10 декабря2008г.)
- Порядок транспортировки опасных видов отходов на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке опасных отходов и требования обеспечению экологической и пожарной безопасности должны определяться государственными стандартами, правилами и нормативами, действующими в РК.

Все перечисленные мероприятия по ООС должны быть конкретизированы, дополнены, уточнены в разделе ППР.

10. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТЕ И ВВОДЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими

средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса.

Лица, занятые на участках с вредными и опасными условиями труда, проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и водоотведение. При отсутствии централизованного водопровода или другого источника водоснабжения допускается использование привозной воды.

Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.

Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.

Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.

Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды.

Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем подключения их к существующей системе водоотведения по временной схеме или устройством надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин "Биотуалет".

Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.

При выполнении строительно-монтажных работ в строящихся высотных зданиях, на монтажных горизонтах необходимо устанавливать мобильные туалетные кабины "Биотуалет" и пункты для обогрева рабочих, которые переставляются каждый раз в зону, над которой не производится транспортирование грузов кранами (вне опасной зоны).

По мере накопления мобильные туалетные кабины "Биотуалет" очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.

Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками.

На строительной площадке устраиваются временные стационарные или передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ. В случае невозможности устройства их на территории строительной площадки, они

размещаются за ее пределами в радиусе не далее 50 м.

Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав.

Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы.

Проходы к санитарно-бытовым помещениям не пересекают опасные зоны (строящиеся здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами и другие).

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды.

11. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ пп	Наименование процесса	Длительность (дней)	Дата начальная	Дата конечная	июнь 2020 года	июль 2020 года	август 2020 года	сентябрь 2020 года				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Проведение электро линий для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО	45	20.06.2020	05.08.2020								

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Ведомость машин и механизмов

№ п/п	Наименование процесса	Количество
	Машины с машинистами	
1	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	
2	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	
3	Кран на автомобильном ходу, КС-2561Д	
4	Краны башенные, 8 т	
5	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	
6	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	
7	Вышки телескопические, 25 м	
8	Экскаваторы ЭО-4124	
9	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5м3	
10	Автомобили-самосвалы, 5-10 т	
11	Автопогрузчики, 5 т	
	Механизмы	
1	Агрегаты сварочные	
2	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	
3	Компрессор СО-7А	
4	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием	
5	Трамбовки электрическая ИЭ-4502	
6	Трамбовка ручная ИЭ4502	
7	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	
8	Вибратор поверхностный	
9	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	
10	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	

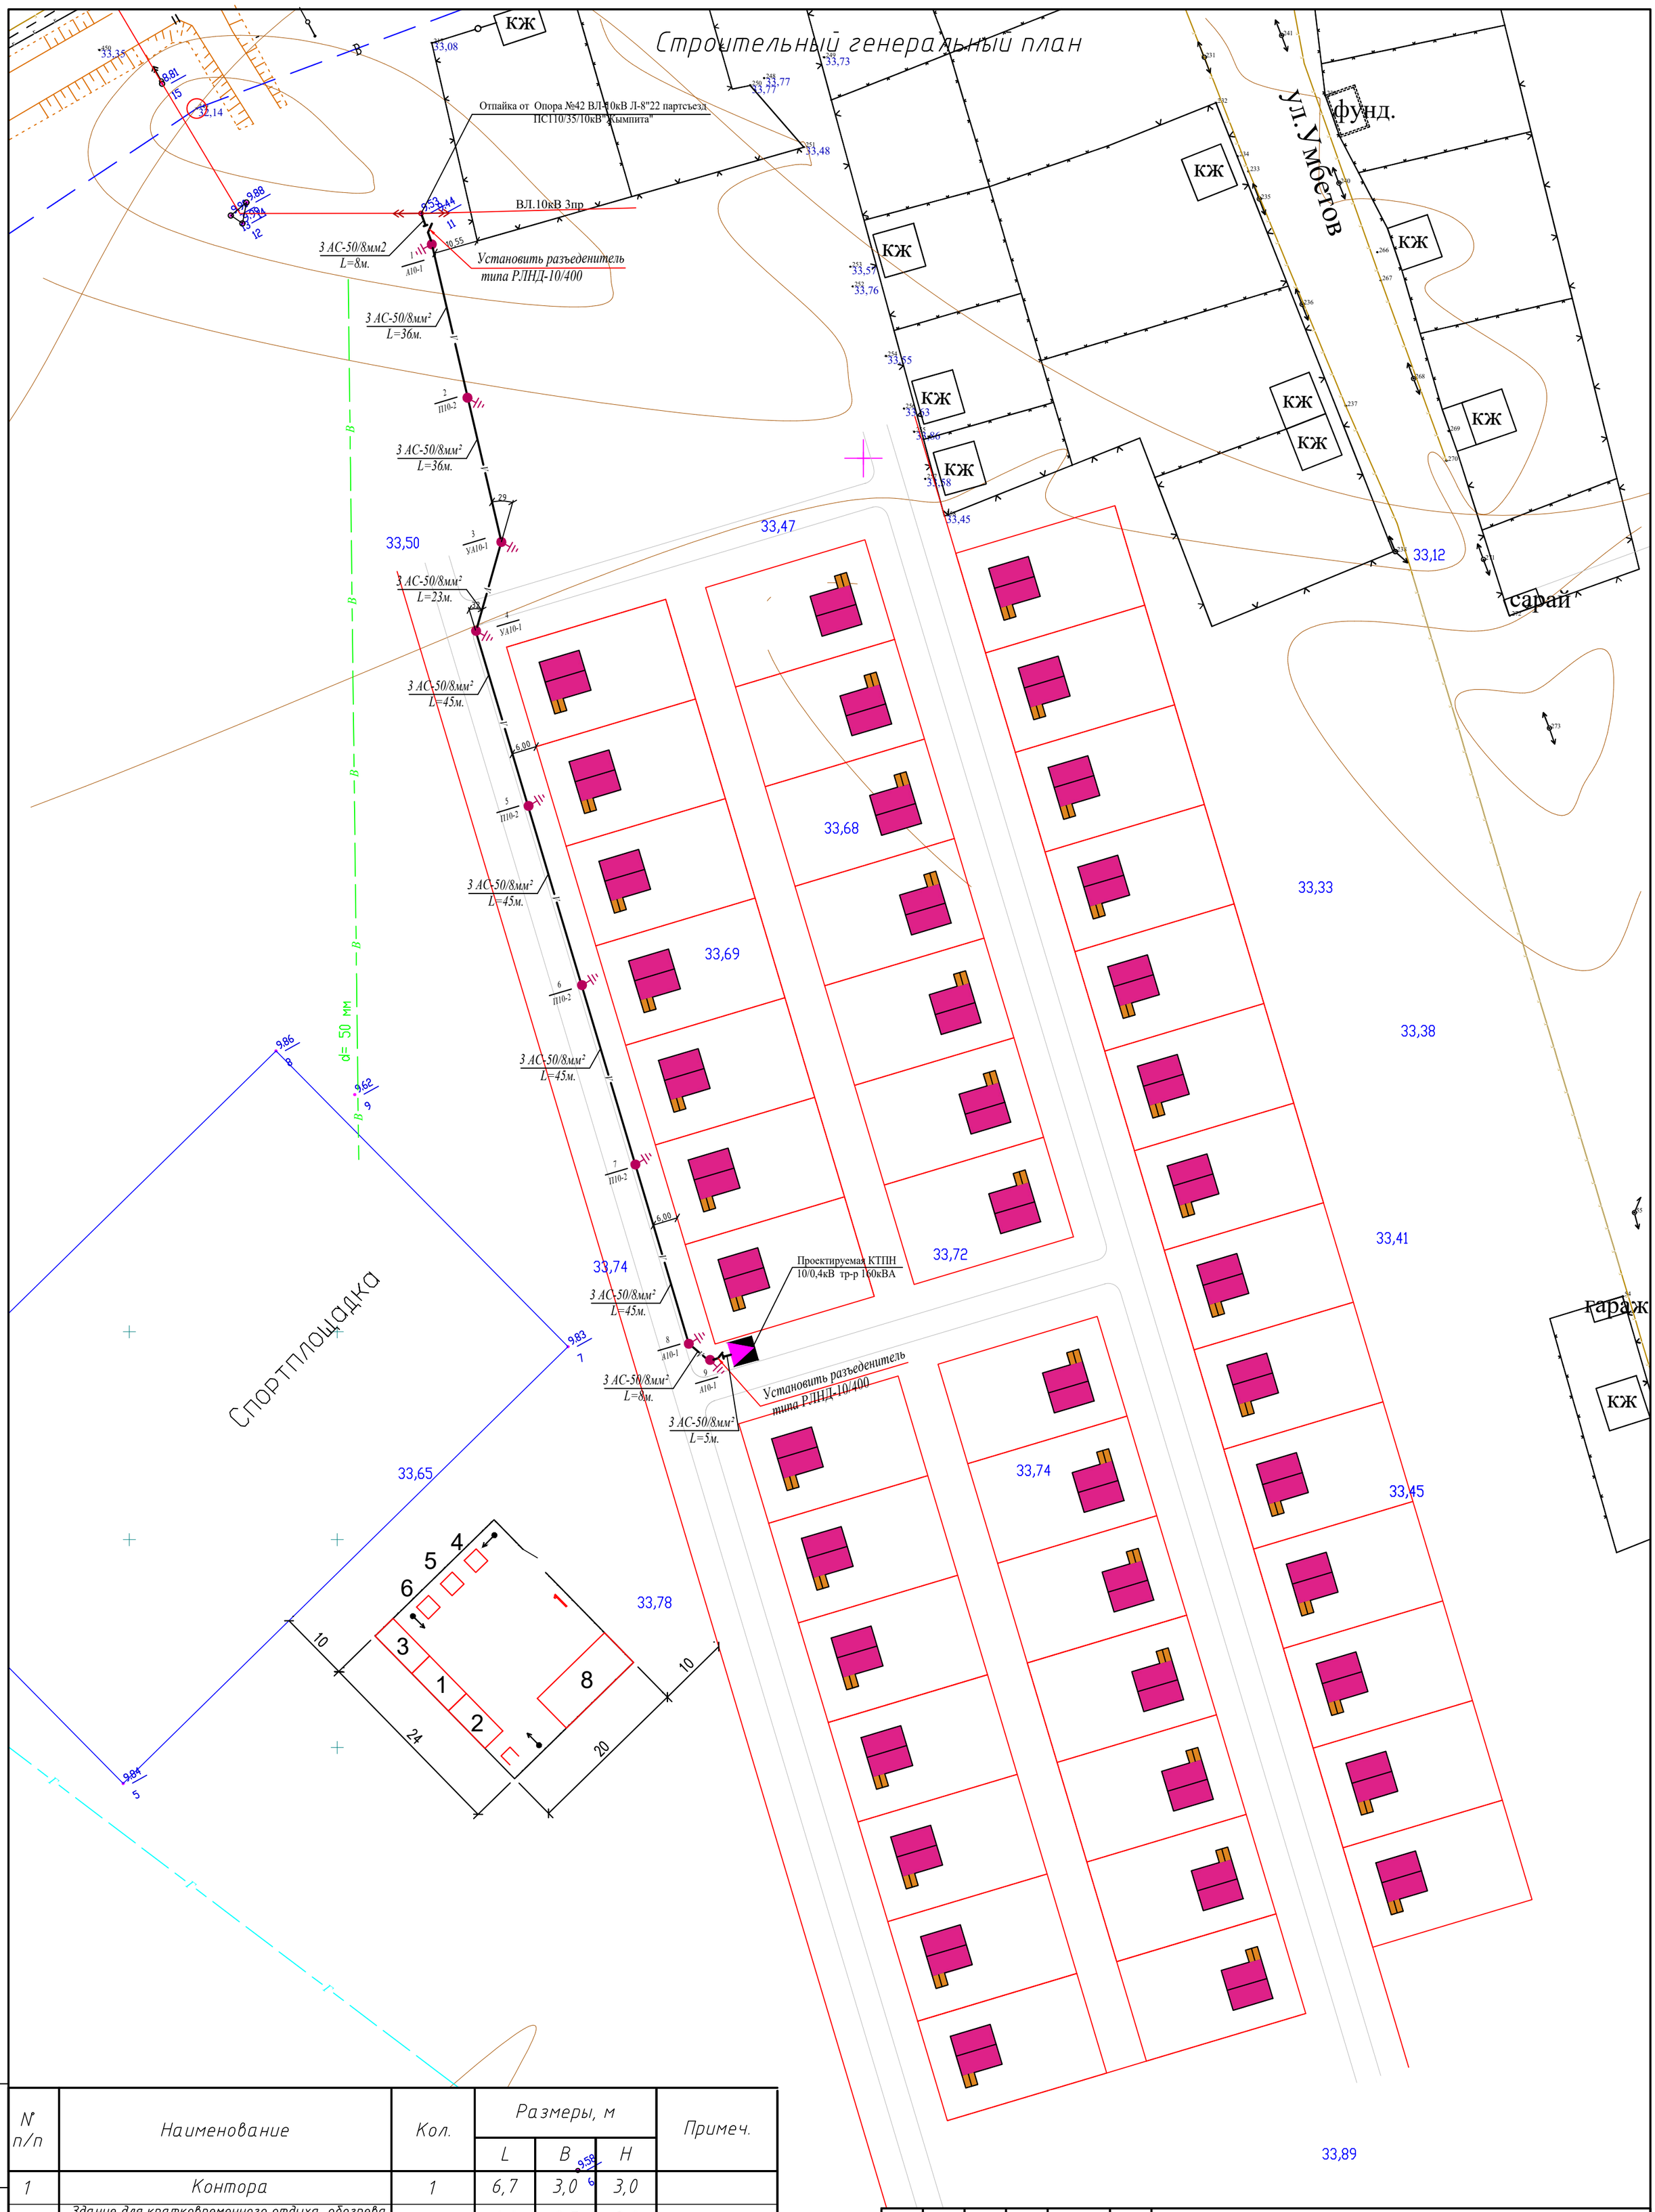

№ п/п	Наименование	Кол.	Размеры, м L	B	H	Примеч.
1	Контора	1	6,7	3,0	3,0	
2	Здание для кратковременного отдыха, обогрева и сушки одежды рабочих на 6 чел.	1	6,0	2,7	3,0	
3	Клодовая материальная	1	6,4	3,1	2,7	
4	Электрический узел	1				
5	Емкость для воды	1				
6	Бетоно-растворительный узел	1				
7	Туалет	1	1,2	1	2,2	
8	Площадка для стройматериалов	1	15,0	5		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Баймаганбетов			
Пров.		Бисембаев			
Н.контр.		Жайтуганов			
ГИП		Бисембаев			

10/19-СГП

Проведение электро линий для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с.Оленти Сырымского района ЗКО

Электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
РП	1	

Строительный генеральный план

ТОО "Инженер+"

ФОРМАТ А2
