Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

" 21 " июль 2021 года

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group" БИН: 931240000052, 030012 Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, пр. Санкибай батыра, 12Б**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) **от « 14 » июля 2021 г. ТОО "КазПромСтройГрупп", 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., Бөкенбай батыра, 21, 8 (7132) 90-76-98, БИН: 050140011681, Директор Молдыбаев К.С.**,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « 14 » июля 2021г. ТОО "Құрылысмаркетинг", Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Звездная 3, 33, Эксперт Жолдыкараев Д.К. KZ79VJE00043686 от 10.01.2019 года БИН: 020140003060, тел: +7 747 442 2684**,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « 14 » июля 2021 года., ПрК "Актюбгражданпроект", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе , ул.Маресьева, 103, 101, тел. 563033, главный инженер проекта Макишева Г.Н. БИН: 920140000272,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт водовода д-600 по ул.Бр.Жубановых от пр.А.Молдагуловой до ул.Г.Жубановой в г.Актобе»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **технически сложный 1 (повышенный) уровня ответственности, Актюбинская область, по ул.Бр.Жубановых от пр.А.Молдагуловой до ул.Г.Жубановой в г.Актобе**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "16"июля 2021года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"20" апреля 2020 года №1 Договор доверительного управления;** документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **"14" января 2020 года №322 Акимат города Актобе;**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" KZ77REA00222292 от 18.05.2021 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ПрК " Актюбгражданпроект " заказ №18724569**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **АО " Aqtobe su-energy group " №54-п от 22.05.2020**;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **« 06 » октября 2020 года;**
окончание работ **« 01 » октября 2021 года;**

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**; фактически, месяц:**8**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Водопровод д-600мм	**м**	**1 883,3**		**1 875**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Прокладка водопровода д-600 мм протяженностью 1875 м из стеклопластиковых труб** _____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **226 035,321** тысяч тенге без НДС, в том числе строительно-монтажных работ **217 681,744** тысяч тенге без НДС, оборудования, инструмента и инвентаря **8 353,577** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **216 964,94** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **210 431,20** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6 533,74** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт водовода д-600 по ул.Бр.Жубановых от пр.А.Молдагуловой до ул.Г.Жубановой в г.Актобе» принять в эксплуатацию**
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Заместитель генерального директора по водоснабжению- главный инженер**

Боранкулов А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Эксперт Шадияров Нуржан Мусаулы, Аттестат №KZ85VWC00001490 от 05.02.2020 г.**.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Курлысмаркетинг», директор Байгозова Гульдана Аширхановна**,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Жолдыкараев Д.К. KZ79VJE00043686.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ПрК «Актюбгражданпроект» ГИП Макишева Г.Н.**.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация **ПрК "Актюбгражданпроект", Председатель Ажгалиев Аубакир Гусманович**,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы).

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "КазПромСтройГруппа" директора Молдыбаева К.С**

.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	1875	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из стеклопластиковых труб	м	1875	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	18	
	Задвижка d- 600	шт	3	
	" d- 300	шт	3	
	" d- 200	шт	2	
	" d- 150	шт	4	
	" d- 100	шт	3	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d- 50	шт	6	
	" d- 32	шт	7	
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		

	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб 1:500	Масштаб 1:500

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Боранкулов А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Мокишева Гульжана Мукановна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

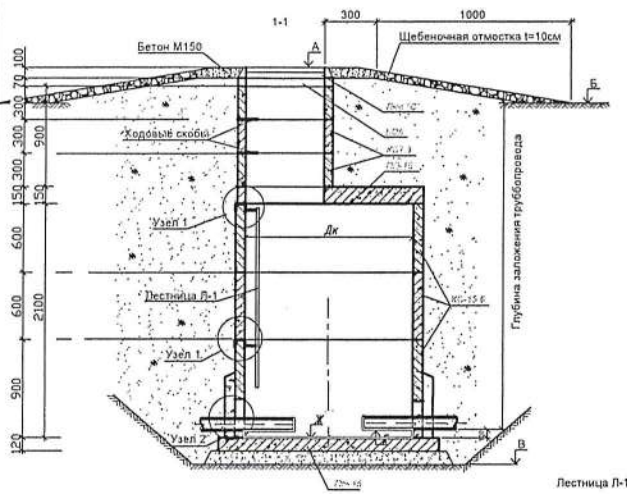



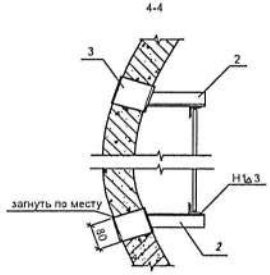

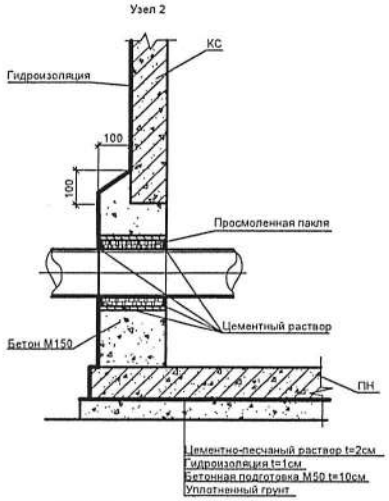





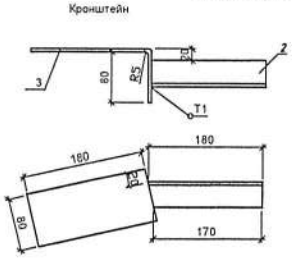





Спецификация элементов колодца диаметром 1.5 м

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол шт.	Масса ед..кг	Приме-чание
КО6	Серия 3.9000.1-14, СТ РК 1971-2010	Кольцо опорное	1	50	
ПП15-2	Серия 3.9000.1-14, СТ РК 1971-2010	Плита перекрытия 15-1	1	250	
КС 7.3	Серия 3.9000.1-14, СТ РК 1971-2010	Кольцо стеновое	1	130	
КС 15.6	Серия 3.9000.1-14, СТ РК 1971-2010	Кольцо стеновое	1	660	
КС15.9а	Серия 3.9000.1-14, СТ РК 1971-2010	Кольцо стеновое	1	860	
ПН 15	Серия 3.9000.1-14, СТ РК 1971-2010	Плита днища ПН-15	1	680	
Л-1	КМ-90.00.00	Лестница Л-1		17,83кг	
С	ГОСТ 3634-89	Люк полимерно-песчаный "С"			
	ГОСТ 5781-82	Ходовые скобы д=12 мм, l=700 мм		1,86кг	
	ГОСТ 22245-90	Битум			

Спецификация элементов лестницы Л-1

№ поз	Обозначение	Наименование	К-во	Вес общий кг
1 2	ГОСТ 8509-86	Уголок 40-5 L=1.600м L=0.180м	 2 4	 7.74 1.74
3	ГОСТ 103-86	Полоса 80-5 L=0.26м	4	3.27
4	ГОСТ-5781-82	Арматура ØAI L=0.480м	6	5.13
		Итого:		17.83

Примечания:

1. Размеры даны в мм
2. Покрытие: грунтовка ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109-91
   эмаль ХВ-1100 ГОСТ 5993-99
3. Наружная изоляция колодцев окрасочная, выполняется горячим битумом в 2 слоя толщиной 4-5мм по грунтовке из битума, растворенного бензином.

					Канализационный колодец		
					Разрезы. Узлы. Спецификации.		

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** ИИН/БИН **931240000052**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1113 от 28.09.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
46	30.11.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр. А.Молдагуловой до ул. Г.Жубановой г. Актобе			Работа	1	74 889 836,00	74 889 836,00	8 023 911,00
				Итого	1	x	74 889 836,00	8 023 911,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер / _____ / Бозанкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе

Договор №1113 от 28.09.2020г

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №1113	Договор дата 28.09.2020	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге						
			из графы 1				
				из них		дополнительные затрать	
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	на приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе		66 865 925,00		63 211 473,00	3 654 452,00				8 023 911,00	74 889 836,00
Всего по объекту	74 889 836,00									

Итого к оплате: 74 889 836 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать шесть)

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО"Құрылысмаркетинг " Шадияров Н.М.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С.

Авторского надзора
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
530инв20
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазПромСтройГрупп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1113 от 28.09.20г

Акт приемки выполненных работ №1 НОЯБРЬ 2020г

на Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Строительные работы												
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	4355,81	405,21	390,05	1 765 039	1699004	511	380255	2 316 918	

					15,04	106,2	65 524	462608	–	171624	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15;									
			м3 грунта	138,06	3716,73	–	513 131	–	–	369454	953 192
					3716,73	–	513 131	–	–	70607	
3	3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	12,74	3097,27	–	39 459	–	–	28410	73 299
					3097,27	–	39 459	–	–	5430	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	150,8	2529,26	1630,13	381 413	245823	–	168107	593 482
					899,14	649,15	135 590	97892	–	43962	

5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	8292,07	351		2 910 517		–	–	3 143 358
					–		–		–	232841	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	4506,51	24,19	20,5	109 011	92380	423	37934	158 701
					3,6	8,09	16 208	36478	–	11756	
7	7 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 уплотненного грунта	290,55	221,37	104,47	64 319	30354	–	34559	106 788
					116,9	48,3	33 965	14034	–	7910	

8	8 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	3407,6	259,39	249,71	883 888	850916	240	190419	1 160 252
					9,61	68,01	32 732	231739	–	85945	
9	9 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5452,22	351		1 913 729		–	–	2 066 827
					–		–		–	153098	
10	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	3066,54	40,51	40,51	124 212	124212	–	32867	169 645

11	11 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;			–	14,89		–	45649	–	12566
			м3 грунта	340,76	1436,03	–	489 341	–	–	352326	909 000
					1436,03	–	489 341	–	–	67333	
12	12 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 уплотненного грунта	3066,87	221,37	104,47	678 913	320397	–	364785	1 127 194
					116,9	48,3	358 516	148130	–	83496	
13	13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 основания	146,98	2949,36	183,42	433 497	26959	228613	184017	666 915
					1210,54	54,1	177 925	7951	–	49401	
14	14 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 основания	621,89	3291,46	183,42	2 046 923	114067	1180036	778597	3 051 562
					1210,54	54,1	752 820	33642	–	226042	

15	15 1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,8	1267287,93	541757,41	1 013 831	433406	61268	631634	1 777 102
					648945,92	148571,9	519 157	118857	–	131637	
16	16 2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	808	40730		32 909 840		32909840	–	35 542 627
					–		–		–	2632787	
17	28 2901-0000-0000 (пл)	Патрубок стеклопластиковый с фланцем PN10 SN5000 д-600мм	шт	9	171350		1 542 150		1542150	–	1 665 522
					–		–		–	123372	
18	46 2900-0000-0001 (пл)Прайс лист	Отвод стеклопластиковый 45" (148") PN10 SN10000 Д-600мм	шт	1	80000		80 000		80000	–	86 400
					–		–		–	6400	
19	48 2900-0000-0001 (пл)Прайс лист	Отвод стеклопластиковый 45" (169") PN10 SN10000 д-600мм	шт	1	80000		80 000		80000	–	86 400
					–		–		–	6400	

20	51 2900-0000-0001 (пл)Прайс лист	Отвод стеклопластиковый 45" (158") PN10 SN10000 Д-600мм	шт	2	80000 –		160 000 –		160000 –	– 12800	172 800
21	58 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4472 –		8 944 –		8944 –	– 716	9 660
22	63 1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	фланец	9	27463,47 6353,34	20539,92 5405,18	247 171 57 180	184859 48646	5132 –	104768 28155	380 094
23	64 2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015	шт.	9	35445 –		319 005 –		319005 –	– 25520	344 525

24	73 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	задвижка или клапан	2	3431,22	220,73	6 862	441	939	5641	13 503
					2741,08	108,19	5 482	216	–	1000	
25	74 2304-0102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	91319		182 638		182638	–	197 249
					–		–		–	14611	
26	79 1122-0901-0112	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	задвижка или клапан	2	45521,11	20253,64	91 041	40507	5161	56185	159 004
					22686,74	5690,02	45 373	11380	–	11778	

27	80 5101-0102-0205 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	2030251		4 060 502		–	–	4 060 502
					–		–		4060502	–	
28	86 1106-0101-0113	Устройство упоров бетонных НР = 91 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3	2,2	26836,32	1324,76	59 041	2915	42179	13311	78 140
					6339,38	309,38	13 947	681	–	5788	
29	87 2900-0000-0001 (пл)Прайс лист	Лента сигнальная ЛСВ	рулон	2	8544,64		17 089		17089	–	18 456
					–		–		–	1367	
30	88 1308-0201-0201	Алюминиевый провод сечением 4мм2. Прокладка. НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м кабеля	800	394,36	178,65	315 483	142919	36551	130357	481 507
					170,02	56,3	136 013	45038	–	35667	
31	89 2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,08	544511		43 561		43561	–	47 046
					–		–		–	3485	

32	90 1122-1101-0110	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			врезка	1	79753,04	58789,71	79 752	58789	3941	33398	122 202
					17021,89	16712,44	17 022	16713	–	9052	
33	94 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,69	25301,42	10687,46	219 870	92874	23490	139942	388 597
					11910,94	4355,5	103 506	37850	–	28785	
34	95 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29040		87 120		87120	–	94 090
					–		–		–	6970	
35	96 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18911		18 911		18911	–	20 424

36	97 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	– / 23813	– / 142 878	– / 142878	– / 1513	154 308
37	98 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	– / 16873	– / 33 746	– / 33746	– / 11430	36 446
38	99 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	– / 4518	– / 36 144	– / 36144	– / 2892	39 036

39	101 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	3	30708		92 124		92124	–	99 494
					–		–		–	7370	
40	102 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	1	19492		19 492		19492	–	21 051
					–		–		–	1559	
41	107 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			комплект	6	18064		108 384		108384	–	117 055
					–		–		–	8671	
Раздел 2 Разрушение и восстановление дорожного покрытия											
42	110 1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 конструкции	850	4658,08	1669,25	3 959 371	1418865	–	2241554	6 696 999

					2988,82	673,84	2 540 506	572763	–	496074	
43	111 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1530	97		148 410		–	–	160 283
					–		–		–	11873	
44	112 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1530	351		537 030		–	–	579 992
					–		–		–	42962	

Всего	**70 147 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 053 397
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 879 687
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 930 267
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 470 510
- оборудование, тенге	4 060 502
- перевозка грузов, тенге	5 509 686
- накладные расходы, тенге	6 278 520
в т.ч. зарплата, тенге	565 067
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 895 345
Всего	**70 147 647**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	687 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %), K=0,8	2 083 363
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 377 156**

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**74 295 472**
Скидка-10%	7 429 547
Итого	66 865 925,00
НДС (12 %)	8 023 911,00
Всего по акту с учетом НДС	**74 889 836,00**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера по водоснабжению **Азамат Д.К.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник водопроводных сетей **Туменов К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "КазПромСтройГрупп" **Молдыбаев К.С.**

Авторского надзора:
Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" **Утениязов Е.**

Технадзор ТОО" Құрылысмаркетинг" **Шадияров Н.М.**

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** — ИИН/БИН **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1113 от 28.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
1	29.01.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр. А.Молдагуловой до ул. Г.Жубановой г. Актобе			Работа	1	44 815 557,02	44 815 557,02	4 801 666,82
				Итого	1	x	44 815 557,02	4 801 666,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / подпись / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.01.2021

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

КазПромСтройГрупп

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе

Договор №1113 от 28.09.2020г

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ЯНВАРЬ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		номер №1113	дата 28.09.2020г	Наименование	Код	Наименование				код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затрать			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за январь) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	на приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-2 Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе		40 013 890,20		37 519 081,20	2 494 809,00				4 801 666,82	44 815 557,02
Всего по объекту	119 705 393,02									

Итого к оплате: 44 815 557,02 (Сорок четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) 02 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С.

Технадзор

ТОО "Құрылысмаркетинг" Шадияров Н.М.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
530инв20
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазПромСтройГрупп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1113 от 28.09.20г

Акт приемки выполненных работ №2 ЯНВАРЬ 2021 г.

на Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Строительные работы												
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	2722,38	405,22	390,05	1103150	1061877	320	237660	1 448 075	

2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15;			15,04	106,2	40953	289130	–	107265	
			м3 грунта	86,28	3716,72	–	320679	–	–	230889	595 693
					3716,72	–	320679	–	–	44125	
3	3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	7,96	3097,24	–	24654	–	–	17751	45 797
					3097,24	–	24654	–	–	3392	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	94,25	2529,26	1630,12	238383	153639	–	105067	370 926
					899,14	649,16	84744	61183	–	27476	

5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	5182,54	351		1819072		–	–	1 964 598
					–		–		–	145526	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	2816,57	24,19	20,5	68133	57738	265	23709	99 189
					3,6	8,09	10130	22799	–	7347	
7	7 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 уплотненного грунта	181,6	221,37	104,47	40201	18972	–	21600	66 745
					116,9	48,3	21229	8771	–	4944	
8	8 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	2129,75	259,39	249,71	552430	531822	150	119012	725 157

9	9 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			9,61	68,01	20458	144836	–	53715	
			т	3407,64	351		1196082		–	–	1 291 769
					–		–		–	95687	
10	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	1916,58	40,51	40,51	77632	77632	–	20542	106 028
					–	14,89	–	28530	–	7854	
11	11 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	212,98	1436,03	–	305845	–	–	220208	568 137
					1436,03	–	305845	–	–	42084	

12	12 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 уплотненного грунта	1916,8	221,37	104,47	424323	200249	–	227992	704 500
					116,9	48,3	224074	92581	–	52185	
13	13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 основания	91,86	2949,36	183,42	270928	16849	142879	115007	416 810
					1210,54	54,09	111200	4969	–	30875	
14	14 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 основания	388,68	3291,45	183,42	1279322	71291	737520	486622	1 907 220
					1210,54	54,1	470511	21026	–	141276	
15	15 1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,5	1267288	541758	633644	270879	38292	394771	1 110 688
					648946	148572	324473	74286	–	82273	

16	16 2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	505	40730			20568650		20568650	–	22 214 142
					–			–		–	1645492	
17	28 2901-0000-0000 (пл)	Патрубок стеклопластиковый с фланцем PN10 SN5000 д-600мм	шт	6	171350			1028100		1028100	–	1 110 348
					–			–		–	82248	
18	29 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (Тройник 600х100-1 шт, кристовина 600х150-1 шт, 600х300-1 шт) НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	т фасонных частей	0,378	1138697,79	513241,52		430429	194006	133309	155326	632 615
					272787,13	142277,61		103114	53781	–	46860	
19	47 2900-0000-0001 (пл)Прайс лист	Отвод стеклопластиковый 45" (175") PN10 SN10000 д-600мм	шт	1	80000			80000		80000	–	86 400
					–			–		–	6400	
20	50 2900-0000-0001 (пл)Прайс лист	Отвод стеклопластиковый 45" (172") PN10 SN10000 Д-600мм	шт	1	80000			80000		80000	–	86 400
					–			–		–	6400	

21	55 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			фланец	1	1238,94	69,55	1239	70	61	1097	2 523
					1108,14	–	1108	–	–	187	
22	56 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	1	2624		2624		2624	–	2 834
					–		–		–	210	
23	57 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			фланец	2	1885,2	130,07	3770	260	186	3321	7 658
					1662,21	15,46	3324	31	–	567	
24	58 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	2	4472		8944		8944	–	9 660
					–		–		–	716	

25	59	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	фланец	1	6173,57 / 5337,54	455,88 / 46,37	6174 / 5338	456 / 46	380 / –	5330 / 920	12 424
26	60	2302-0103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	18456 / –		18456 / –		18456 / –	– / 1476	19 932
27	63	1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	фланец	1	27463,47 / 6353,34	20539,92 / 5405,18	27463 / 6353	20540 / 5405	570 / –	11640 / 3128	42 231
28	64	2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	35445 / –		35445 / –		35445 / –	– / 2836	38 281

29	71 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	задвижка или клапан	1	2339,43	94,6	2341	95	328	1944	4 628
					197,51	46,37	1918	46	–	343	
30	72 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57296		57296		57296	–	61 880
					–		–		–	4584	
31	73 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	задвижка или клапан	2	3431,22	220,73	6862	441	939	5641	13 506
					2741,08	108,19	5482	216	–	1000	

32	74 2304-0102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	91319		182638		182638	–	197 249
					–		–		–	14611	
33	77 1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	задвижка или клапан	1	24776,98	11826,38	24777	11826	1242	15200	43 175
					11708,96	3645,41	11709	3645	–	3198	
34	78 5101-0102-0203 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	741759		741759		–	–	741 759
					–		–		741759	–	

35	79 1122-0901-0112	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	задвижка или клапан	1	45521,11	20253,64	45522	20254	2581	28092	79 506
					22686,74	5690,02	22687	5689	–	5889	
36	80 5101-0102-0205 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2030251		2030251		–	–	2 030 251
					–		–		2030251	–	
37	87 2900-0000-0001 (пл)Прайс	Лента сигнальная ЛСВ	рулон	2	8544,64		17089		17089	–	18 456
					–		–		–	1367	
38	88 1308-0201-0201	Алюминиевый провод сечением 4мм2. Прокладка. НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м кабеля	500	394,36	178,65	197178	89325	22845	81473	300 943
					170,02	56,3	85008	28149	–	22292	
39	89 2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,05	544511		27226		27226	–	29 404

40	94 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзкс1=1,15;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,23	25301,42 / 11910,4	10687,46 / 4355,5	182930 / 86116	77271 / 31490	19543 / –	116430 / 23949	323 309
41	95 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29040 / –		87120 / –		87120 / –	– / 6970	94 090
42	97 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	23813 / –		142878 / –		142878 / –	– / 11430	154 308
43	99 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4518 / –		27108 / –		27108 / –	– / 2169	29 277

44	100	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5654 / –		16962 / –		16962 / –	– / 1357	18 319
45	101	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	30708 / –		92124 / –		92124 / –	– / 7370	99 494
46	103	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,2	51308,7 / 12196,03	3300,39 / 1638,56	1036437 / 246360	66667 / 33098	723410 / –	276663 / 105048	1 418 148

47	104	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4,48	49202		220425		220425	–	238 059
						–		–		–	17634	
48	105	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654		11308		11308	–	12 213
						–		–		–	905	
49	106	2106-0510-0101	Стоимость металлических стремянок	т	0,1096	699958		76715		76715	–	82 852
						–		–		–	6137	
50	107	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	18064		126448		126448	–	136 564
						–		–		–	10116	
51	108	1108-0201-0109	Кладка горловины колодца из керамического кирпича НР = 93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 кладки	0,595	32038,19	2496,42	19061	1485	13228	4351	25 285

52	109 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;		7307,79	556,42	4348	331	–	1873	
			м2 поверхности	119,86	921,24	22,81	110420	2734	68996	36327	158 487
					322,79	3,09	38690	371	–	11740	

Всего	**41 997 942**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 580 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 946 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	910 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 814 606
- оборудование, тенге	2 772 010
- перевозка грузов, тенге	3 015 154
- накладные расходы, тенге	2 963 665
в т.ч. зарплата, тенге	266 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 905 624
Всего	**41 997 942**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	407 950
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %), К=0,8	1 236 577
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**817 409**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**44 459 878,00**
Скидка-10%	4 445 987,80

Итого	40 013 890,20
НДС (12 %)	4 801 666,82
Всего по акту с учетом НДС	**44 815 557,02**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера по водоснабжению **Азамат Д.К.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник водопроводных сетей **Туменов К.А.**

Зам. главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "КазПромСтройГрупп" **Молдыбаев К.С.**

Авторского надзора:
Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" **Утониязов Е.**

Технадзор ТОО" Құрылысмаркетинг" **Шадияров Н.М.**

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** — ИИН/БИН **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1113 от 28.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
4	05.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр. А.Молдагуловой до ул. Г.Жубановой г. Актобе			Работа	1	32 038 324,42	32 038 324,42	3 432 677,62
				Итого	1	x	32 038 324,42	3 432 677,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер

Принял (Заказчик) / подпись / Бозанкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.03.2021

М.П.

Aqtobe su-energy group

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе

Договор №1113 от 28.09.2020г

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ФЕВРАЛЬ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		номер №1113	дата 28.09.2020г	Наименование	Код	Наименование				код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
				из графы 1						
				из них						
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за февраль) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-3 Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе		28 605 646,80		28 605 646,80						
Всего по объекту	151 743 717,44								3 432 677,62	32 038 324,42

Итого к оплате: 32 038 324,42 (тридцать два миллиона тридцать восемь тысяч триста двадцать четыре) 42 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО"Құрылысмаркетинг " Шадияров Н.М.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.

"SANA-2015". Версия 20.1-от 20.01.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
530инв20
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазПромСтройГрупп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1113 от 28.09.20г

Акт приемки выполненных работ №3 ФЕВРАЛЬ

Основание: на Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	1633,43	405,21	390,05	661891	637127	192	142596	868 846
						15,04	106,2	24572	173478	–	64359		

2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15;									
			м3 грунта	51,77	3716,73	–	192415	–	–	138539	357 430
					3716,73	–	192415	–	–	26476	
3	3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	4,78	3097,27	–	14805	–	–	10660	27 502
					3097,27	–	14805	–	–	2037	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	56,55	2529,26	1630,13	143030	92184	–	63040	222 556
					899,14	649,15	50846	36710	–	16486	

5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	3109,52	351		1091442		–	–	1 178 757
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;			–		–		–	87315	
			м3 грунта	1689,94	24,19	20,5	40880	34643	159	14225	59 513
7	7 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;			3,6	8,09	6078	13679	–	4408	
			м3 уплотненного грунта	108,96	221,37	104,47	24120	11383	–	12960	40 046
8	8 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;			116,9	48,3	12737	5263	–	2966	
			м3 грунта	1277,85	259,39	249,71	331459	319094	90	71407	435 095

9	9 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			9,61	68,01	12275	86901	–	32229	
			т	2044,58	351		717648		–	–	775 060
					–		–		–	57412	
10	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	1149,95	40,51	40,51	46579	46579	–	12325	63 616
					–	14,89	–	17118	–	4712	
11	11 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	127,79	1436,03	–	183510	–	–	132127	340 888
					1436,03	–	183510	–	–	25251	

12	12 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 уплотненного грунта	1150,08	221;37 / 116,9	104,47 / 48,3	254593 / 134444	120149 / 55549	– / –	136795 / 31311	422 699
13	13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 основания	55,12	2949,36 / 1210,54	183,42 / 54,1	162569 / 66725	10110 / 2982	85734 / –	69010 / 18526	250 105
14	14 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 основания	233,21	3291,46 / 1210,54	183,42 / 54,1	767600 / 282309	42775 / 12616	442516 / –	291976 / 84766	1 144 342
15	15 1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,3	1267287,93 / 648945,92	541757,41 / 148571,9	380186 / 194684	162527 / 44571	22975 / –	236862 / 49364	666 412

16	16 2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002									
			м	303	40730		12341190		12341190	–	13 328 485
					–		–		–	987295	
17	29 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (тройник д-600х300, д-600х100мм) НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			т фасонных частей	0,252	1138697,79	513241,52	286951	129337	88872	103550	421 741
					272787,13	142277,61	68742	35854	–	31240	
18	55 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			фланец	1	1238,94	69,55	1239	70	61	1097	2 523
					1108,14	–	1108	–	–	187	
19	56 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	1	2624		2624		2624	–	2 834
					–		–		–	210	

20	61	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	фланец	1	5201,7 / 4524,91	390 / 31	5202 / 4525	390 / 31	287 / –	4510 / 777	10 489
21	62	2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	10578 / –		10578 / –		10578 / –	– / 846	11 424
22	63	1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	фланец	4	27463,47 / 6353,34	20540 / 5405	109854 / 25413	82160 / 21620	2281 / –	46563 / 12513	168 930
23	64	2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	35445 / –		141780 / –		141780 / –	– / 11342	153 122

24	87	2900-0000-0001 (пл)Прайс	Лента сигнальная ЛСВ	рулон	1	8544,64 / –		8545 / –		8545 / –	– / 684	9 229
25	88	1308-0201-0201	Алюминиевый провод сечением 4мм2. Прокладка. НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м кабеля	300	394,36 / 170,02	178,65 / 56,3	118306 / 51005	53595 / 16889	13706 / –	48884 / 13375	180 565
26	89	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,03	544511 / –		16335 / –		16335 / –	– / 1307	17 642
27	94	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,38	25301,42 / 11910,94	10687,39 / 4355,46	60217 / 28348	25436 / 10366	6433 / –	38327 / 7884	106 428
28	95	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040 / –		29040 / –		29040 / –	– / 2323	31 363

29	97	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23813 / –	47626 / –	47626 / –	– / 3810	51 436
30	99	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4518 / –	9036 / –	9036 / –	– / 723	9 759
31	100	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654 / –	5654 / –	5654 / –	– / 452	6 106
32	101	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708 / –	30708 / –	30708 / –	– / 2457	33 165
33	106	2106-0510-0101	Стоимость металлических стремянок	т	0,01566	699958 /	10961 /	10961 /	– /	11 838

34	107	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064 / –		18064 / –	–	18064 / –	– / 1445	877	19 509
35	108	1108-0201-0109	Кладка горловины колодца из керамического кирпича НР = 93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 кладки	0,07083	32038,19 / 7307,79	2496,42 / 556,42	2269 / 518	177 / 39	1574 / –	518 / 223	3 010
36	109	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 поверхности	17,12333	921,26 / 322,78	22,83 / 3,1	15775 / 5527	391 / 53	9857 / –	5189 / 1677	22 641

Раздел 2 Разрушение и восстановление дорожного покрытия

37	110	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 конструкции	965,96	4658,08	1669,25	4499521	1612431	–	2547354	7 610 625
38	111	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1738,728	2988,82	673,84	2887090	650901	–	563750	
						97		168657		–	–	182 150
39	112	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1738,728	–		–		–	13493	
						351		610294		–	–	659 118
						–		–		–	48824	

Всего 29 906 999

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 247 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 380 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 184 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 346 878
- перевозка грузов, тенге	2 588 041
- накладные расходы, тенге	4 128 514
в т.ч. зарплата, тенге	371 566
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 215 332

Всего 29 906 999

Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	311 033
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	942 803
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**623 217**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**31 784 052,00**
Скидка-10%	3 178 405,20
Итого	28 605 646,80
НДС (12 %)	3 432 677,62
Всего по акту с учетом НДС	**32 038 324,42**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" — **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера — **Азамат Д.К.**

Зам.главного инженера — **Ашубаев Ж.Б.**

Начальник ПТО — **Муханова А.К.**

Начальник ОКС — **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник водопроводных сетей — **Туменов К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "КазПромСтройГрупп" — **Молдыбаев К.С.**

Авторского надзора:
Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" — **Утениязов Е.**

Технадзор ТОО" Құрылысмаркетинг" — **Шадияров Н.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б**	**931240000052**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 1113 от 28.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
5	01.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр. А.Молдагуловой до ул. Г.Жубановой г. Актобе			Работа	1	23 009 816,59	23 009 816,59
				Итого	1	x	23 009 816,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / _____ / Борискунов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.04.2021

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе

Договор №1113 от 28.09.2020г

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за МАРТ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер №1113	дата 28.09.2020г	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затрать			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за март) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-4 Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе		20 544 479,10		20 544 479,10					2 465 337,49	23 009 816,59
Всего по объекту	174 753 534,03									

Итого к оплате: 23 009 816,59 (двадцать три миллиона девять тысяч восемьсот шестнацать) 59 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО' ..рылысмаркетинг " Шадияров Н. ..

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК ..ктюбгражданпроект" Утен..зов Е.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
530инв20
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазПромСтройГрупп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1113 от 28.09.20г

Акт приемки выполненных работ №4 МАРТ 2021г.

на Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Строительные работы												
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	1088,95	[illegible],21	390,05	44[illegible]59	424750	128	9[illegible]4	579 229	

				15,04	106,21	16381	115652	–	42906	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15;								
			м3 грунта	34,51	3716,73	–	128264	–	–	92350	238 263
					3716,73	–	128264	–	–	17649	
3	3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
			м3 грунта	3,19	3097,27	–	9880	–	–	7114	18 354
					3097,27	–	9880	–	–	1360	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
			м3 грунта	37,7	2529,26	1630,13	95354	61456	–	42027	148 371
					899,14	649,15	33898	24473	–	10990	

5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
		т	2073,02	351		727630		–	–	785 840
				–		–		–	58210	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
		м3 грунта	1126,63	24,19	20,5	27253	23095	106	9483	39 675
				3,6	8,09	4052	9119	–	2939	
7	7 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
		м3 уплотненного грунта	72,64	221,37	104,47	16081	7589	–	8641	26 700
				116,9	48,31	8492	3509	–	1978	
8	8 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
		м3 грунта	851,9	259,39	249,71	220971	212728	60	47605	290 062

9	9 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			9,61	68,01	8183	57935	–	21486	
			т	1363,05	351		478431		–	–	516 705
					–		–		–	38274	
10	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	766,63	40,51	40,51	31053	31053	–	8217	42 412
					–	14,89	–	11412	–	3142	
11	11 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	85,19	1436,03	–	122335	–	–	88081	227 249
					1436,03	–	122335	–	–	16833	

12	12	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 уплотненного грунта	766,72	221,37	104,47	169728	80099	–	91197	281 799
						116,9	48,3	89629	37033	–	20874	
13	13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 основания	36,74	2949,36	183,42	108359	6739	57145	45997	166 704
						1210,54	54,08	44475	1987	–	12348	
14	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 основания	155,47	3291,46	183,42	511722	28516	295004	194646	762 877
						1210,54	54,09	188202	8410	–	56509	
15	15	1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,2	1267287,93	541755	253457	108351	15317	157908	444 274
						648945,92	148570	129789	29714	–	32909	

16	16	2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002								
				м	283,3	40730		11538809		11538809	–	12 461 914
						–		–		–	923105	
17	23	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,025	413369,94	122800	10333	3070	124	7944	19 740
						285568	35400	7139	885	–	1462	
18	24	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				м	25,25	1646		41562		41562	–	44 886
						–		–		–	3325	
19	25	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,0736	341840,02	85801,63	25161	6315	103	20338	49 136
						254656	24456,52	18743	1800	–	3640	

20	26	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001								
				м	38,38	341		13088		13088	–	14 135
						–		–		–	1047	
21	27	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
				м	35,956	158		5681		5681	–	6 136
						–		–		–	454	
22	28	2901-0000-0000 (пл)	Патрубок стеклопластиковый с фланцем PN10 SN5000 д-600мм	шт	10	171350		1713500		1713500	–	1 850 580
						–		–		–	137080	
23	29	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	т фасонных частей	0,117	1138697,79	513239,32	133227	60049	41262	48076	195 807
						272787,13	142273,5	31916	16646	–	14504	

24	55	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
				фланец	1	1238,94	70	1239	70	61	1097	2 523
						1108,14	–	1108	–	–	187	
25	56	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015								
				шт.	1	2624		2624		2624	–	2 834
						–		–		–	210	
26	63	1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
				фланец	10	27463,47	20539,9	274634	205399	5702	116409	422 326
						6353,34	5405,2	63533	54052	–	31283	
27	64	2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015								
				шт.	10	35445		354450		354450	–	382 806
						–		–		–	28356	

28	87	2900-0000-0001 (пл)Прайс	Лента сигнальная ЛСВ	рулон	1	8544,64		8545		8545	–	9 229
						–		–		–	684	
29	88	1308-0201-0201	Алюминиевый провод сечением 4мм2. Прокладка. НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м кабеля	200	394,36	178,65	78871	35730	9138	32589	120 377
						170,02	56,3	34003	11260	–	8917	
30	89	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,02	544511		10890		10890	–	11 761
						–		–		–	871	
31	91	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	врезка	1	14089,76	8299	14091	8299	777	7517	23 337
						5015,29	2578	5015	2578	–	1729	

32	92	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
				врезка	4	5130,43	2698,75	20521	10795	601	12413	35 569
						2281,37	853,25	9125	3413	–	2635	
33	94	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,56	25301,42	10687,45	241881	102172	25840	153952	427 500
						11910,94	4355,44	113869	41638	–	31667	
34	95	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29040		58080		58080	–	62 726
						–		–		–	4646	
35	96	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18911		56733		56733	–	61 272
						–		–		–	4539	

36	97	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23813	95252	95252	–	102 872
						–	–	–	7620	
37	98	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	16873	101238	101238	–	109 337
						–	–	–	8099	
38	99	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	4518	45180	45180	–	48 794
						–	–	–	3614	
39	100	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5654	28270	28270	–	30 532
						–	–	–	2262	

40	101	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
				шт.	2	30708		61416		61416	–
						–		–		–	4913
41	102	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								
				шт.	3	19492		58476		58476	–
						–		–		–	4678
42	106	2106-0510-0101	Стоимость металлических стремянок								
				т	0,07828	699958		54793		54793	–
						–		–		–	4383
43	107	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
				комплект	5	18064		90320		90320	–
						–		–		–	7226
44	108	1108-0201-0109	Кладка горловины колодца из керамического кирпича НР = 93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
				м3 кладки	0,35417	32038,19	2495,98	11346	884	7874	2590
						7307,79	556,23	2588	197	–	1115

66 329	
63 154	
59 176	
97 546	
15 051	

45	109 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 поверхности	85,61667	921,24	22,81	78873	1953	49284	25948	113 207
					322,79	3,1	27636	265	–	8386	

Всего	**21 479 106**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 098 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 419 112
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	431 978
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 847 433
- перевозка грузов, тенге	1 206 061
- накладные расходы, тенге	1 317 203
в т.ч. зарплата, тенге	118 548
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 591 044
Всего	**21 479 106**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	223 383
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	677 118
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**447 592**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**22 827 199**
Скидка-10%	2 282 719,90
Итого	20 544 479,10

НДС (12 %)	2 465 337,49
Всего по акту с учетом НДС	**23 009 816,59**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам.главного инженера Ашубаев Ж.Б.

Зам.главного инженера Азамат Д.К.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник водопроводных сетей Туменов К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С.

Авторского надзора:
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Е.

Технадзор
ТОО" Құрылысмаркетинг" Шадияров Н.М.

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** ИИН/БИН **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1113 от 28.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
8	05.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр. А.Молдагуловой до ул. Г.Жубановой г. Актобе			Работа	1	19 280 677,25	19 280 677,25
				Итого	1	x	19 280 677,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2021

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе

Договор №1113 от 28.09.2020г

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АПРЕЛЬ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер №1113	дата 28.09.2020г	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затрать			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за апрель) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-5 Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе		17 214 890,40		15 845 931,40	1 368 959,00				2 065 786,85	19 280 677,25
Всего по объекту	194 034 211,28									

Итого к оплате: 19 280 677,25 (девятнацать миллионов двести восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят семь) 25 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

ТОО"Құрылысмарк...нг " Шадияров Н.М.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С.

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ПрК "Актюбгражданп...ект" Утениязов Е.

Приложение 3-1
530инв20
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КазПромСтройГрупп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1113 от 28.09.20г

Акт приемки выполненных работ №5 АПРЕЛЬ 2021г.

на Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	453,43	405,21	390,05	183736	176862	53	39583	241 18	

					15,04	106,2		6821	48156	–	17866	
2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15;										
			м3 грунта	14,38	3716,73	–		53447	–	–	38482	99 284
					3716,73	–		53447	–	–	7354	
3	3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;										
			м3 грунта	1,33	3097,27	–		4119	–	–	2966	7 653
					3097,27	–		4119	–	–	567	
4	4 1201-0101-0601	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;										
			м3 грунта	15,7	2529,26	1630,13		39709	25593	–	17502	61 787
					899,14	649,15		14116	10192	–	4577	

5	5 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъёмность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	863,41	351		303057		–	–	327 301
					–		–		–	24245	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	469,35	24,19	20,5	11354	9622	44	3951	16 527
					3,6	8,09	1688	3799	–	1224	
7	7 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 уплотненного грунта	30,25	221,37	104,47	6697	3161	–	3598	11 118
					116,9	48,3	3536	1461	–	824	

8	8 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	354,9	259,39	249,71	92057	88623	25	19832	120 839
					9,61	68,01	3409	24136	–	8951	
9	9 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	567,71	351		199266		–	–	215 207
					–		–		–	15941	
10	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			м3 грунта	320,1	40,51	40,51	12966	12966	–	3431	17 708
					–	14,89	–	4765	–	1312	

11	11 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	35,48	1436,03	–	50950	–	–	36684	94 647
					1436,03	–	50950	–	–	7011	
12	12 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 уплотненного грунта	319,33	221,37	104,47	70690	33360	–	37983	117 367
					116,9	48,3	37330	15424	–	8694	
13	13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 основания	15,3	2949,36	183,42	45125	2806	23798	19156	69 423
					1210,54	54,1	18521	828	–	5142	
14	14 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 основания	64,76	3291,46	183,42	213154	11878	122882	81078	317 724
					1210,54	54,1	78394	3503	–	23539	

15	15 1122-1601-0104	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,0833	1267287,93	541757,41	105565	45129	6379	65769	185 043
					648945,92	148571,9	54057	12376	–	13707	
16	16 2301-0906-0306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	2,833	40730		115388		115388	–	124 619
					–		–		–	9231	
17	17 1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,01	1128592,22	414953,02	11285	4149	718	7572	20 366
					641824,2	123003,4	6418	1230	–	1509	
18	18 2301-0501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	21428		216423		216423	–	233 737
					–		–		–	17314	

19	19	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,008	773114,2	283930,72	6185	2271	375	4172	11 186
						442338,3	84452,02	3539	675	–	829	
20	20	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	13237		106955		106955	–	115 511
						–		–		–	8556	
21	21	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,0175	543987,58	173829,29	9520	3042	230	7064	17 909
						357050,85	50621,97	6248	887	–	1327	
22	22	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,675	3450		60979		60979	–	65 857
						–		–		–	4878	
23	28	2901-0000-0000 (пл)	Патрубок стеклопластиковый с фланцем PN10 SN5000 д-600мм	шт	10	171350		1713500		1713500	–	1 850 580

					–			–		–	137080	
24	29 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	т фасонных частей	0,829	1138697,79	513241,52		943980	425477	292362	340648	1 387 400
					272787,13	142277,61		226141	117948	–	102770	
25	30 2302-0101-2306	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)										
			шт.	4	225			900		900	–	972
					–			–		–	72	

26	31	2302-0101-2305	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 40 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)						
				шт.	4	187	748	748	–	808
						–	–	–	60	
27	32	2302-0101-0656	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)						
				шт.	1	54015	54015	54015	–	58 336
						–	–	–	4321	

28	33	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
				шт.	38	1651,14	1063,16	62743	40400	–	33149	103 565
						587,98	293,19	22343	11141	–	7671	
29	34	2302-0302-8021	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10									
				шт.	1	31514		31514		31514	–	34 035
						–		–		–	2521	
30	35	2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10									
				шт.	2	14839		29678		29678	–	32 052
						–		–		–	2374	
31	36	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10									
				шт.	4	3032		12128		12128	–	13 098
						–		–		–	970	
32	37	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10									
				шт.	6	1444		8664		8664	–	9 357
						–		–		–	693	

33	38	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	4	726	2904	2904	–	3 136
						–	–	–	232	
34	39	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	4	363	1452	1452	–	1 568
						–	–	–	116	
35	40	2302-0303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10	шт.	4	861	3444	3444	–	3 720
						–	–	–	276	
36	41	2302-0301-0317	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 50x1 1/2, PN 16	шт.	4	541	2164	2164	–	2 337
						–	–	–	173	
37	42	2302-0301-0313	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40x1, PN 16	шт.	4	332	1328	1328	–	1 434
						–	–	–	106	

38	43	2302-0301-0622	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63x2x63, PN 16	шт.	2	1688		3376		3376	–	3 646
						–		–		–	270	
39	44	2302-0301-0619	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50x2x50, PN 16	шт.	3	1145		3435		3435	–	3 710
						–		–		–	275	
40	45	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	2677		803		803	–	867
						–		–		–	64	
41	49	2900-0000-0001 (пл)Прайс лист	Отвод стеклопластиковый 45" (167") PN10 SN10000 д-600мм	шт	1	80000		80000		80000	–	86 400
						–		–		–	6400	
42	52	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	задвижка или клапан	13	1809,26	94,6	23530	1230	2192	20504	47 555

					1546,74	46,37	20108	603	–	3523	
43	53	2304-0905-1506	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70 °C, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005								
				шт.	6	9656		57936		57936	–	62 571
						–		–		–	4635	
44	54	2304-0905-1504	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70 °C, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
				шт.	7	2634		18438		18438	–	19 913
						–		–		–	1475	
45	55	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
				фланец	9	1238,94	69,55	11150	626	551	9873	22 706
						1108,14	–	9973	–	–	1682	
46	56	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015								
				шт.	9	2624		23616		23616	–	25 505
						–		–		–	889	

47	57	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
				фланец	6	1885,2	130,07	11311	780	558	9965	22 980
						1662,21	15,46	9973	93	–	1702	
48	58	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015								
				шт.	4	4472		17888		17888	–	19 318
						–		–		–	1431	
49	59	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
				фланец	5	6173,57	455,88	30868	2279	1901	26651	62 120
						5337,54	46,37	26688	232	–	4602	
50	60	2302-0103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 33259-2015								
				шт.	5	18456		92280		92280	–	99 663

					–		–		–	7382	
51	61 1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			фланец	7	5201,7	389,57	36412	2727	2011	31571	73 422
					4524,91	30,91	31674	216	–	5439	
52	62 2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	7	10578		74046		74046	–	79 970
					–		–		–	5924	
53	63 1122-1201-0112	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			фланец	11	27463,47	20539,92	302097	225938	6272	128051	464 566
					6353,34	5405,18	69887	59457	–	34412	

54	64	2302-0103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015							
				шт.	11	35445		389895	389895	–
						–		–	–	31192
55	65	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,0736	70039,02	–	5155	–	251	4855
						66628,13	–	4904	–	–	801
56	66	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,025	80213,88	–	2005	–	339	1649
						66628,13	–	1666	–	–	292
57	67	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,0175	111172,08	–	1945	–	546	1385
						79953,75	–	1399	–		266

58	68	1122-0701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,008	216418,16	–	1732	–	986	739	2 668
						93279,38	–	746	–	–	198	
59	69	1122-0701-0110	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,01	3251333,34	–	3252	–	2186	1055	4 651
						106605	–	1066	–	–	345	
60	70	1122-0701-0113	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	1,8833	637981,58	–	1201511	–	925453	273297	1 592 792
						146581,88	–	276058	–	–	117985	
61	71	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	задвижка или клапан	1	2339,43	94,6	2341	95	328	1944	4 625

				1917,51	46,37	1918	46	–	343
62	72 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57296		57296		57296	–
					–		–		–	4584
63	75 1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	Задвижка или клапан	2	16361,66	7943,69	32723	15887	1542	20003
					7646,96	2455,3	15294	4911	–	4218
64	76 5101-0102-0201 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	389653		779306		–	–
					–		–		779306	–

65	77 1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	задвижка или клапан	1	24776,98	11826,38	24777	11826	1242	15200	43 177
					11708,96	3645,41	11709	3645	–	3198	
66	78 5101-0102-0203 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	741759		741759		–	–	741 759
					–		–		741759	–	
67	81 1122-0601-0608	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,004	455559,14	73882,04	1823	296	954	669	2 690

					143201,68	25694,5		573	103	–	199	
68	82 1122-0601-0610	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,0012	694336,46	88928,11		832	106	522	239	1 158
					170172,4	31121,76		204	37	–	86	
69	83 1122-0601-0605	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,0015	298924,76	62511,63		448	93	174	211	713
					120565,54	21806,21		181	32	–	53	

70	84	1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,0015	248166,07	57352,36	372	86	118	195	613
						112217,46	19565,09	168	29	–	45	
71	85	1122-0601-0612	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	км трубопровода	0,012	1022332,4	137760,79	12267	1652	7398	3724	17 272
						268101,8	45418,56	3217	545	–	1279	
72	86	1106-0101-0113	Устройство упоров бетонных НР = 91 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3	2,28	26836,32	1324,76	61188	3020	3714	13796	80 979

					6339,38	309,38		14454	706	–	5999	
73	87	2900-0000-0001 (пл)Прайс	Лента сигнальная ЛСВ	рулон	2	8544,64		17089		17089	–	18 456
						–		–		–	1367	
74	88	1308-0201-0201	Алюминиевый провод сечением 4мм2. Прокладка. НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м кабеля	101,3	394,36	178,65	39948	18097	4628	16507	60 973
						170,02	56,3	17223	5703	–	4516	
75	89	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01013	544511		5516		5516	–	5 957
						–		–		–	441	
76	90	1122-1101-0110	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	врезка	1	79753,04	58789,71	79752	58789	3941	33398	122 202
						17021,89	16712,44	17022	16713	–	9052	

77	91 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			врезка	5	14089,76	8298,53	70449	41493	3880	37587	116 678
					5015,29	2578,19	25076	12891	–	8643	
78	92 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;									
			врезка	16	5130,43	2698,84	82087	43182	2403	49654	142 282
					2281,37	853,37	36502	13654	–	10539	
79	93 3205-0101-0101	Откачка воды при врезке	маш.-ч	8	415,15	415,13	3321	3321	–	–	3 587
					–	325,5	–	2604	–	266	
80	94 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,85	25301,42	10687,46	375725	158708	40140	239140	664 055
					11910,94	4355,5	176877	64679	–	49189	

81	95 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29040	116160	116160	–	125 453
					–	–	–	9293	
82	96 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18911	56733	56733	–	61 271
					–	–	–	4539	
83	97 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	23813	190504	190504	–	205 745
					–	–	–	15240	
84	98 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	16873	101238	101238	–	109 337
					–	–	–	8099	

85	99	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	4518	63252	63252	–	68 312
						–	–	–	5060	
86	100	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	5654	62194	62194	–	67 169
						–	–	–	4976	
87	101	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	30708	122832	122832	–	132 658
						–	–	–	9827	
88	102	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	19492	58476	58476	–	63 155
						–	–	–	4678	

89	106	2106-0510-0101	Стоимость металлических стремянок	т	0,17222	699958			120547		120547	–	130 192
						–			–		–	9644	
90	107	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18064			90320		90320	–	97 545
						–			–		–	7226	
91	108	1108-0201-0109	Кладка горловины колодца из керамического кирпича НР = 93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 кладки	0,68	32038,19	2496,42		21787	1698	15120	4973	28 904
						7307,79	556,42		4969	378	–	2141	
92	109	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 поверхности	188,36	921,24	22,81		173525	4297	108427	57086	249 058
						322,79	3,09		60801	582	–	18449	

Раздел 2 Разрушение и восстановление дорожного покрытия

93	110	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 конструкции	321,54	4658,08	1669,25	1497759	536731	–	847940	2 533 332
						2988,82	673,84	961028	216666	–	187656	
94	111	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	578,772	97		56141		–	–	60 631
						–		–		–	4491	
95	112	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	578,772	351		203149		–	–	219 400
						–		–		–	16252	

Раздел 3 Демонтажные работы

96	121	1122-1301-0101	Демонтаж существующих ж/б колодцев НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кэкс2=1,15;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	68,2	13559,04	6412,48	924728	437332	–	658967	1 710 389

97	122	4131-0101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка			7146,56	2613,3	487396	178227	–	126696
				т	122,76	423		51927		–	–	56 082
						–		–		–	4154
98	123	4131-0101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка								
				т	122,76	423		51927		–	–	56 082
						–		–		–	4154
99	124	4101-0105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
				т	122,76	445		54628		–	–	58 998
						–		–		–	4370

Всего **18 087 874**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 879 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 455 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 839 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 810 628
- оборудование, тенге 1 521 065
- перевозка грузов, тенге 920 095

1368959

- накладные расходы, тенге	3 273 448
в т.ч. зарплата, тенге	294 611
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 227 179
Всего	**18 087 874**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	172 295
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %), К=0,8	522 260
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**345 227**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**19 127 656**
Скидка-10%	1 912 765,60
Итого	17 214 890,40
НДС (12 %)	2 065 786,85
Всего по акту с учетом НДС	**19 280 677,25**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера **Ашубаев Ж.Б.**

Зам.главного инженера **Азамат Д.К.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник водопроводных сетей **Туменов К.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп" **Молдыбаев К.С.**

Авторского надзора:
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" **Утениязов Е.**

Технадзор
ТОО" Құрылысмар тинг" **Шад оов Н.М.**

ТОО "КазПромСтройГрупп"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**931240000052**
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140011681**

Договор (контракт) Договор № 1113 от 28.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
11	**03.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр. А.Молдагуловой до ул. Г.Жубановой г. Актобе			Работа	1	33 809 391,28	33 809 391,28
				Итого	1	x	33 809 391,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / _____ / Боранкулов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2021

М.П.

Aqtobe su-energy group

ТОО „КазПромСтройГрупп"

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе

Договор №1113 от 28.09.2020г

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮНЬ 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №1113	Договор дата 28.09.2020г	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге							
			из графы 1					
				из них		дополнительные затрать		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ремонт водовода д-600мм по ул.Бр. Жубановых от пр. А. Молдагуловой до ул. Г. Жубановой г.Актобе		30 186 956,50		30 186 956,50					3 622 434,78	33 809 391,28
Всего по объекту	**227 843 602,56**	**195 913 568,00**		**7 518 220,00**					**24 411 814,56**	**227 843 602,56**

Итого к оплате: 33 809 391,28 (тридцать три миллиона восемьсот девять тысяч триста девяносто один) 28 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К**

Технадзор

ТОО"Құрылысмаркетинг " **Шадия, ов Н.М.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазПромСтройГрупп" **Молдыбаев К.С.**

Авторского надзора

Главный инженер проекта

ГПК "Актюбгражданпроект" **Генияэов Е.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
530инв20
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазПромСтройГрупп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1113 от 28.09.20г

Акт приемки выполненных работ №6 ИЮНЬ 2021г.

на Капитальный ремонт водопровода д-600мм по ул.Бр.Жубановых от пр.А. Молдагуловой до ул.Г. Жубановой

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Разрушение и восстановление дорожного покрытия												
1	113	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 материала основания в плотном теле	712,5	3265,59	1199,05	2326730	854322	1354890	332302	2 871 753
						164,94	266,9	117518	190169	–	212723	

2	114	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 основания	4750	697,33	257,08	3312306	1221135	1866806	594359	4 219 196
						47,23	68,62	224365	325967	–	312533	
3	115	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя НР = 108 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 основания	38000	47,7	14,89	1812493	565970	1218562	203366	2 177 127
						0,74	4,22	27961	160341	–	161269	
4	116	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	т	2,375	165441,26	2069,05	392923	4914	388009	2748	427 325
						–	1071,16	–	2544	–	31654	

5	117	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 покрытия	4750	1577,7	145,18	7494081	689626	6557777	449158	8 578 698
						51,93	35,62	246678	169209	–	635459	
6	118	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 верхний слой до толщины 6см НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 покрытия	19000	172,46	0,02	3276828	446	3273739	2854	3 542 057
						0,14	–	2643	–	–	262375	

7	119	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	т	0,95	165442,11	2069,47	157170	1966	155204	1099	170 930
						–	1071,58	–	1018	–	12662	
8	120	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 покрытия	4750	1771,55	145,18	8414882	689626	7478578	449158	9 573 163
						51,93	35,62	246678	169209	–	709123	

Всего	**31 560 249**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	865 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 028 005
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 018 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 293 565
- накладные расходы, тенге	2 035 044
в т.ч. зарплата, тенге	183 154
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 337 798
Всего	**31 560 249**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	328 227

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	994 920
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**657 668**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**33 541 064**
Скидка-10%	3 354 107,50
Итого	30 186 956,50
НДС (12 %)	3 622 434,78
Всего по акту с учетом НДС	**33 809 391,28**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера **Ашубаев Ж.Б.**

Зам.главного инженера **Азамат Д.К.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник водопроводных сетей **Туменов К.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп" **Молдыбаев К.С.**

Авторского надзора:
Главный инженер проекта
ПрК "Актюбгражданпроект" **Утениязов Е.**

Технадзор
ТОО" Құрылысмаркетинг" **Шадияров Н.М.**
