IT ENGINEERING SA

ОТЧЕТ

О проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за апрель-май месяц 2022 года

Нур-Султан. 2022 г.

IT Engineering SA/ ИТ Инжиниринг СА
Address: 39 Abay Ave., Nur-Sultan 010000 / Адрес: 010000 г. Нур-Султан, пр. Абая 39
Post office/Почта: chancellery@bacontractors.kz
Tel/Тел: +7 717 269-10-33

ОТЧЕТ

О проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за апрель-май месяц 2022 года

ФФ «IT Engineering SA»
(ИТ Инжиниринг СА)
в г. Нур-Султан
Директор Филиала Фирмы

_____ Пистаев А. К.

«10» _____ 2022 г.

Нур-Султан. 2022 г.

Содержание

Ситуационная схема 4
Объекты строительства..... 4
Распределение специалистов авторского надзора..... 5
Выполненные виды работ за отчетный период..... 5-8
Фотоиллюстрации выполненных работ за отчетный период 9-24

Ситуационная схема.

Объекты строительства.

Генеральным проектировщиком ФФ «IT Engineering SA» проводится работа по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Национальный научный онкологический центр в городе Нур-Султан» в рамках Договора №194 от 31.07.2019 года.

Работы по авторскому надзору ведутся под руководством инженеров Істілеу С.С, Суинова А.Б., Симница В.

Представителями авторского надзора и от генерального проектировщика является Істілеу С.С, Суинов А.Б., Симница В.

Экспертам авторского надзора было представлено задание на авторский надзор по строительству вышеназванного объекта от генерального проектировщика согласно Методическому документу Республики Казахстан «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» и оформлен журнал авторского надзора по объекту.

В процессе авторского надзора выполнен объем работ на соответствие производимых работ проектным решениям, действующим строительным нормам и правилам.

- **Распределение специалистов авторского надзора по объекту:**

№	Имя эксперта	Раздел согл. аттестата
1	Ізтілеу Сәбит Сәрсенбекұлы	АР, Нес/Огр
2	Суинов Айтбай Багдатович	ОВиК, ВК , АПТ, АГПТ
3	Симница Ведат	ЭМ, ЭО, ЭС

В отчетный период, по приказу №ЦО-002, №ЦО-003 на оказание услуг по авторскому надзору объекта «Национальный научный онкологический центр в городе Нур-Султан», генеральный проектировщик предоставляет отчет по объектам, пропорционально выполненным строительно- монтажным работам.

В ходе осуществления авторского надзора по строительству объекта «проекту «Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек» г. Нур-Султан, специалистам авторского надзора были освидетельствованы работы, часть которых (наиболее существенные) отражены в таблице:

Месяц	**Апрель-Май**
Специалисты:	**Ізтілеу С.С., Суинов А.Б., Симница В.**
Название объекта:	«Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек»
Генеральный подрядчик:	АФК «B&A Contractors SA»
Генеральный проектировщик:	ФФ «IT Engineering SA»
Выполненные виды работ за отчетный период:	**АР, Нес/Огр** • Устройство подпорной стены в осях R(+7.64м) / 2-3 на отм.-5.30м • Устройство лестниц по оси R(+9.525м)/4-5..,R(+9.525м)/9-10.. на отм. -5,340..,-2,840м • Устройство лестницы П3 в осях К-R/1-2, на отм. -2,920..,-1,320м • Устройство отмостки по периметру здания в осях А-Е/1-11 до отм.-0,200м. • Армирование ж/б стен в осях А-Н 22-28 (Протон-Терапия) • Бетонирование ж/б стен в осях А-Н 22-28 (Протон-Терапия) • Устройство ж/б лестницы С-F/27-28 (Протон-Терапия) • Монтаж металлических конструкций здания медицинских газов на отм. -0,600 • Устройство гранитной плитки наружней лестницы П3 (600х300х40h) в осях К-R/1-2, на отм. -2,920..,-1,320м • Устройство стилобата кровли ЖРО в осях А-D/ 7-17 на отм.-5,72м • Устройство гранитной плитки (600х300х60h) в осях А-Н / 8 -13 до отм. -0.020м ТИП 1

	• Устройство гранитной плитки наружней лестницы (600x300x40h) в осях 28/K-I до отм. -5.120..,-2.420..,.1.820 м • Устройство гранитной плитки наружней лестницы (600x300x40h) по оси R(+9.525м)/4-5..,R(+9.525м)/9-10.. до отм. -4,870..,-2,790м • Устройство брусчатки ТИП 5 (300x300x40h) в осях A-D/7-17 на отм.-5.120 м. • Устройство фасада в осях A/1-2.1..,1/A-C..,C/1-2..,2/A-C..,2.1/A-B с отм.+0.000м до отм.+5.920..,+7.500м. (Мед. газы) • Устройство накрывки парапета в осях H-L/8-25 на отм.+31,000 м. (Блок MB1,MB2) Устройство наружных окон по оси D/11-16 с отм.-3.12 до -1.52 м • Устройство внутренних витражных перегородок (5-этаж) • Устройство внутренних витражных перегородок (4-этаж) • Устройство внутренних окон (5-этаж) • Устройство внутренних окон (4-этаж) • Устройство внутренних окон (2-этаж) • Обшивка армапояса со свинцовыми листами отм.-5,220...-1,070...-0,450 оси 9-14/C-L. • Обшивка армапояса со свинцовыми листами отм. -0.02...+4,150 оси 24-25/K-L. • Обшивка стен гипоскартонными листами тип C-10 в осях 17-22/B-E на отм. -5,120 (радио-терапия) • Монтаж горизонтальной защиты стен WP1 в осях H-L/8-25 на отм.+19,400 • Монтаж вертикальной защиты стен WP4 в осях H-L/8-25 на отм.+19,400 • Облицовка стен керамической плиткой (тип P3) в осях A-K /3-28 отм.-5,120 м (Цоколь) • Отделка стен типа P4.1, P11 в осях 28-32/C-L на отм. -6,280, …, -7,700.(Туннель 1) • Облицовка стен керамической плиткой (тип P3) в осях 18-19/M-O на отм. +4.600. Блок EB1.(2 этаж) • Облицовка стен керамической плиткой (тип P3) в осях 4-6/C-E на отм. +0.000. Блок WB1 (1 этаж) • Облицовка стен керамической плиткой (тип P3) в осях 12-21/L-R на отм. +0.000. Блок EB1 (1 этаж) • Отделка стен (тип FC11) на отм. -5,120 в осях A-D/8-9 (Цоколь) • Отделка стен (тип FC11) на отм. +10,200 в осях L-O/11-22 (Цоколь) • Устройство наливного пола осях A-E/1-4 до отм.-0.003 м. (Тех. блок) Тип F6.1 • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F1.1) в осях H-L/8-25 на отм.+14.800м. (4-этаж) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F8.1) в осях A-G/3-8 на отм.+10.450м. (3-Тех.этаж Блок WB1) • Устройство эпоксидного покрытия пола в осях D-C/10-16 на отм.-9.870м. (ЖРО) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F6.1) в осях H-J/8-25 на отм.+24.350м. (6-Тех.этаж) • Устройство керамической плитки (лестница A) в осях D-E / 4-5 с отм.-

	4.980 м до отм +0.000м. (Тех.блок) • Устройство полов керамической плитки в сан. узлах (ТИП F2.1.B) в осях B-D / 8-10 до отм.-4.980 м (Тех.блок) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F6.1) в осях J-L/8-25 на отм.+24.350м. (6-Тех.этаж) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F1.2) в осях H-L/8-25 на отм.+19.400м. (5-этаж) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F1.2) в осях H-L/8-25 на отм.+14.800м. (4-этаж) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F1.1 B) в осях B-E / 17-22 на отм. -5.120 м (Радио-терапия) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F6.1) в осях A-G/3-8 на отм.+10.450м. (3-Тех.этаж Блок WB1) • Устройство керамической плитки (лестница H) в осях E-G / 7-8 с отм.+0.000 м до отм +10.200m • Устройство керамической плитки (лестница I) в осях A-B / 4-5 с отм.+0.000 м до отм +10.200m • Устройство керамической плитки ТИП F2.4 в осях O-R/ 22-26 до отм.-5.120 м. (Цоколь) • Монтаж аллюминиевого плинтуса ТИП S1,S3 в осях A-R/3-25 на отм.+10.200м.(3-этаж,Блок MB1,MB2,WB1,EB1) • Монтаж аллюминиевого плинтуса ТИП S1,S3 в осях A-R/3-25 на отм.+4.600м.(2-этаж,Блок MB1,MB2,WB1,EB1) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F6.1) в осях L-R/11-22 на отм.+10.2000м. (3-Тех.этаж Блок EB1) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F1.1) в осях H-L/8-25 на отм.+10.2000м. (3-этаж Блок MB1,MB2) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F2.1) в осях H-L/8-25 на отм.+10.2000м. (3-этаж Блок MB1,MB2) •
	ЭМ, ЭО, ЭС
	• Монтаж светильников на отм. +14,70; +19,30. • Монтаж шкафов на отм. +0,62; +10,10; +14,70;+19,30 • Монтаж гибкой гофрированной трубы д.25 для розеточных сетей на отм. +0,62; +4,50; +5,72; 14,70. • Монтаж кабельных лотков. • Монтаж Шинопровода. • Расключение распределительных шкафов на отм. +0,62; +4,50; +10,10; +14,70; 19,30. • Тех. Блок: монтаж кабельных лотков.
	ОВиК, ВК, АПТ

	ВК Устройство системы мониторинга утечки вакуума с сенсорными датчиками системы вакуумной канализации в осях 1-28/A-R. Этаж 0. Монтаж трубопроводов системы вакуумной канализации в осях 8-28/A -R. Этаж 0. Монтаж запорно-регулирующей арматуры. 1~5 этажи. Монтаж раковин. 0-5 этаж. Монтаж раковин в осях 8-25/H-L, 2,4 этажи. Воронки системы К2 основной корпус. Монтаж поручней 1-4 эт. Монтаж трубопроводов К13. Монтаж запорно-регулирующей арматуры К13. **ЖРО** Монтаж запорно-регулирующей арматуры специальной канализации в осях B-C/10-15. 0 этаж Монтаж трубопроводов специальной канализации в осях D-I/11-16. 0 этаж. Монтаж измельчителя пищевых отходов системы специальной канализации в осях F-G/14-15 на отм. -8,700. Устройство душевых кабин системы специальной канализации в осях D-I/11-16 на отм. -5,120; в осях B-C/14-15 на отм. -9,970. Монтаж смесителей для умывальника специальной канализации в осях F-I/14-15. 0 этаж. Монтаж вакуумных унитазов в комплекте специальной канализации в осях D-I/11-16. 0 этаж. Монтаж моек и смесителей для мойки специальной канализации в осях F-H/13-15. 0 этаж. Монтаж смесителей для раковин и душа с водосберегающей системой в осях D-I/11-16. 0 этаж. Монтаж дренажного насоса в приямке для системы специальной канализации в осях B-C/12-13 на отм. -8,700. **ОВ** Монтаж водяных воздухонагревателей. Этаж 1. Монтаж вытяжных линейных решеток. Этаж 1, 2 (Основной блок) Монтаж и установка фанкойлов в осях 29-30/H-K, 0 этаж (Основной блок) Монтаж и установка фанкойлов в осях 4-11/B-E, 1 этаж (Тех блок) Решетки, вентиляторы тех блок. Компрессорная станция. **Медицинские газы** Монтаж оборудования вакуумной станции. Цокольный этаж. Монтаж КОУСа. Цокольный этаж. Монтаж медных труб. С 0 по 5 этаж **Чистый пар** Монтаж нержавеющих труб. 0, 6 этажи

Фото-иллюстрации выполненных работ за отчетный период	**АР, Нес/Огр**

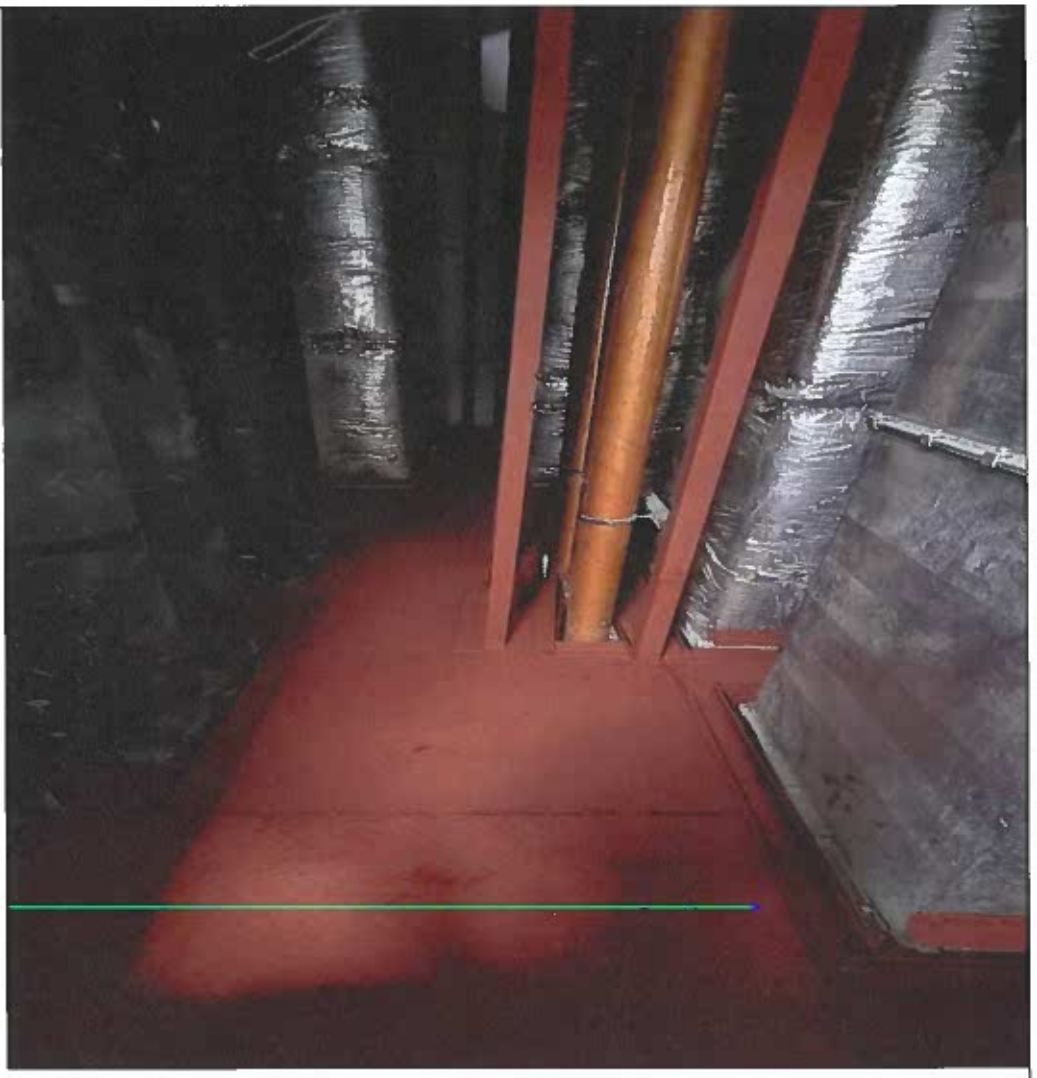

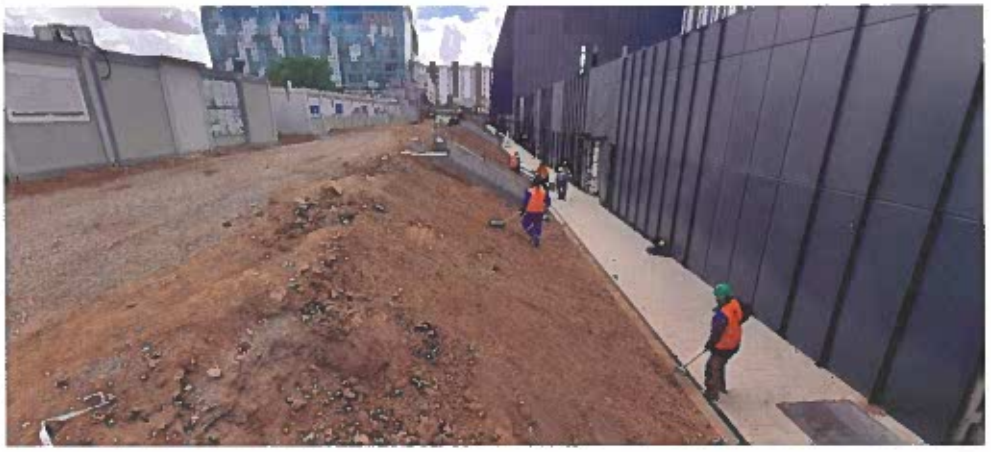

	ЭМ, ЭО, ЭС
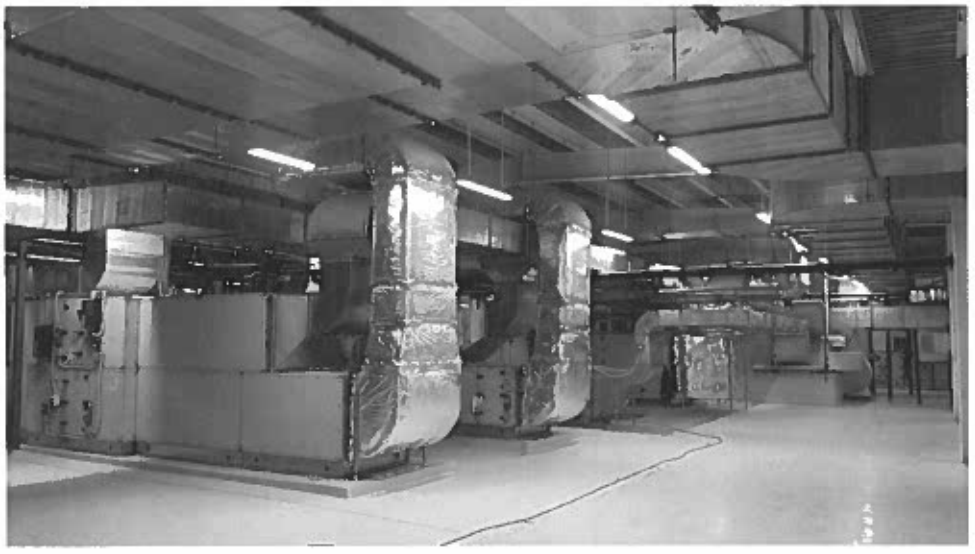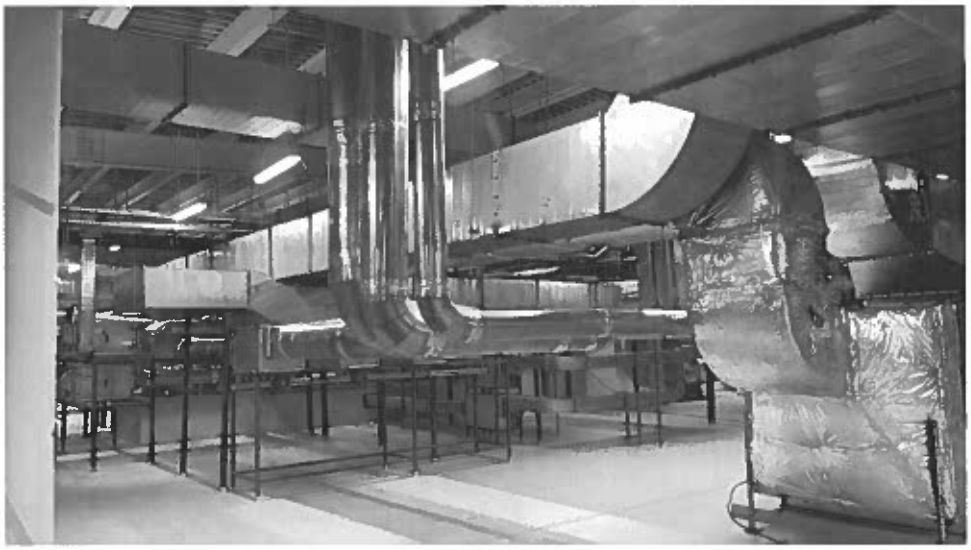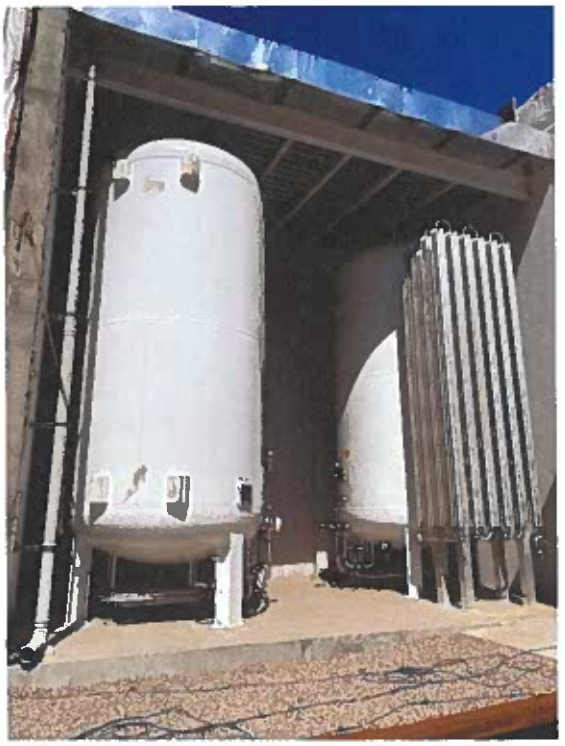
	ОВиК, ВК , АПТ
