Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_7_" _июня_ 2021 года

Заказчик **ТОО «Гелиос», БИН 990940004405, 8(7142)990-223, 050000, Алматинская область, г.Алматы, ул. Карасай батыра 69**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **18.05.2021г. ТОО «ПЛЮС АВД», Масягутов Ринат Габдуллович, г.Костанай, ул.Челябинская, дом №11А, БИН 000740003910, 8(7142) 211-320; +7(777)3782109**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **18.05.2021г. ТОО "Курылысинжиниринг-НС", Некрасов Юрий Федорович, KZ08VJE00047292 от 10.06.2019 г, KZ72VJE00024703 от 03.04.2017 г, БИН 090440002204, 21-13-20**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **18.05.2021 г . ИП «Джумабаев А.А.» Джумабаев Ашимбек Абдуалиевич, аттестат №KZ43VJE00034925 от 07.02.2018 г., г. Астана, район Алматы, ул. Орхон 39. ИИН 630113350276**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

**«Строительство наружного водопровода для АЗС-АГЗС ТОО «Гелиос», уровень ответственности II (нормальный технически несложный)**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:

**Республика Казахстан, Костанайская область село Федоровка Федоровского района, ул. Победы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_11_" __мая__ 2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **" 26 " мая 2020 года. №50**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

**ГУ«Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области», 11.03.2021 г. №KZ15REA00213320**
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) _____
**СПКВО «Намыс». №1/1/2020**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
**08.2020г, №1/1/2020, Филиал ТОО «Гелиос» в г. Костанай №45 от 03.02.2021г**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2020 года;**
окончание работ **март 2021 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5 месяца;**
фактически, месяц: **2,5 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Протяженность сетей водоснабжения** | **м.п** | **1093,0 м.п** | | **1101,0 м.п** | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

САЗС имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | Попроекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | числоквартир | площадьквартир, $м^2$ | | числоквартир | площадьквартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **водопровод проложен методом горизонтально направленного бурения, протяженность 1101,0 м, трубы ПЭ 100 SDR 26 Ø110х4,2-1093,0м; Трубы ПЭ 100 SDR 21 Ø50х2,4-10,0м для мокрых колодцев. Трубы под проезжей частью – стальные д-325х6мм, уложены в стальных футлярах, общее кол-во – 27м;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

**- вода- центральное поселковое водоснабжение.**

**-канализация – септик.**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **21 449,707** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **21 449,707** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **21 449,707** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **21 449,707** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:_ **«Строительство наружного водопровода для АЗС-АГЗС ТОО «Гелиос»**
наименование объекта (комплекса)
- принять в эксплуатацию.

Заказчик **Фаерфас Роман Григорьевич** _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Некрасов Юрий Федорович,**
**специализация: по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей, специализация: по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части инженерных сетей** 18.05.21.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "Курылысинжиниринг-НС", Мухашов Орынгали Абжапарович**,
(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата 18.05.21.

Место печати (при наличии)

**Некрасов Юрий Федорович, специализация: по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей, специализация: по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части инженерных сетей 18.05.21.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **СПКВО «Намыс», председатель Сейдахметов Серикжан Зайналгабденович 18.05.21.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ИП «Джумабаев А.А.», директор Джумабаев Ашимбек Абдуалиевич**,
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) 18.05.21

**Джумабаев Ашимбек Абдуалиевич, специализация: по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций 18.05.21.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) Авторский надзор Джумабаев А.А. 18.05.21 Аттестат № KZ43VJE00034925

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Джумабаев Ашимбек Абдуалиевич, специализация: по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) Авторский надзор Джумабаев А.А 18.05.21 Аттестат № KZ43VJE00034925

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Масягутов Ринат Габдуллович.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

# Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод | | | | |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) | м | 1101 | |
| | 1) из стальных труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из железобетонных труб | м | | |
| | 5) из полиэтиленовых труб | м | 1101 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из стальных труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 4) из полиэтиленовых труб | м | | |
| | 5) | м | | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | 7 | |
| | Задвижка d- 100 | шт | 5 | |
| | " d- 50 | шт | 2 | |
| | " d- | шт | | |
| | Вентили d- | шт | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | " d- | шт | | |
| | " d- | шт | | |
| | Кран d- | шт | | |
| | " d- | шт | | |
| | " d- | шт | | |
| | Гидрант | шт | | |
| | Водопроводный ввод | шт | | |
| | Водоразборная колонка | шт | | |
| | Стальной футляр | шт | | |
| | Питьевой фонтанчик | шт | | |
| Канализация | | | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| | 6) | м | | |
| | 7) | м | | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | | |
| | 1) из керамических труб | м | | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | | |
| | 5) из железобетонных труб | м | | |
| | 6) | м | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | | |
| | Выпуск | шт | | |

| Горизонтальный разрез колодца | Вертикальный разрез колодца |
|---|---|
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |
|  | |

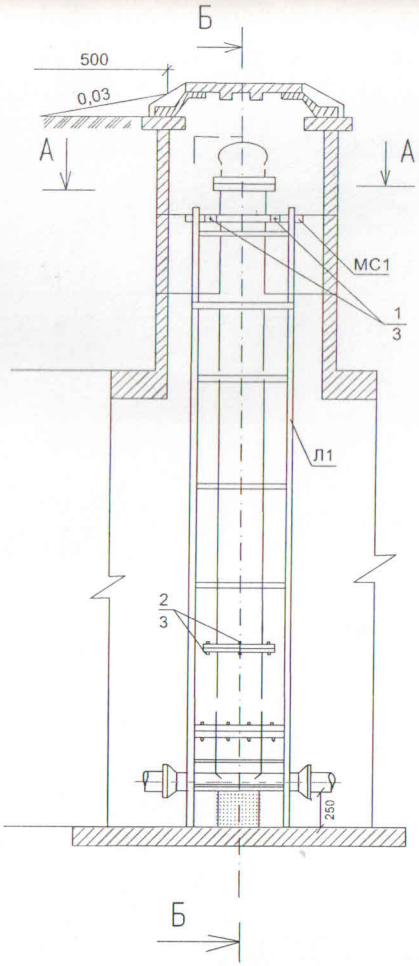


## Разрез Б-Б

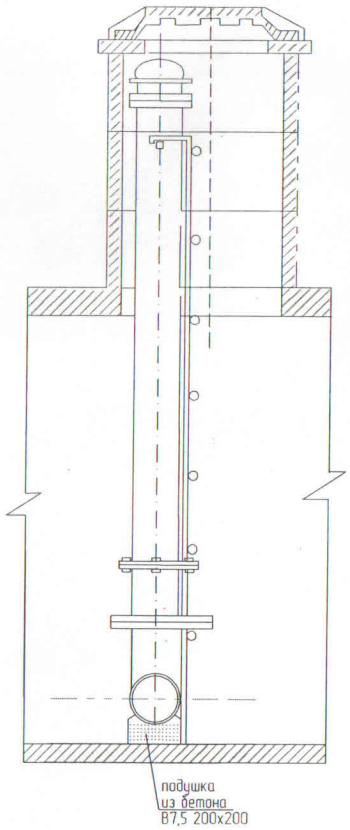


## Разрез А-А

## Спецификация

| Марка | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| МС1 | АСИ 01.00.000 | Полухомут МС1 | 1 | 1,27 | |
| Л1 | АСИ 02.00.000 | Лестница | 1 | 22,1 | |
| 1 | ГОСТ 7798-70 | Болт 20х40.46 | 2 | | |
| 2 | ГОСТ 7798-70 | Болт 20х70.46 | 6 | | |
| 3 | ГОСТ 5915-70 | Гайки М20-7Н5 | 8 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Бетон 7,5 (М100) | 0,01м3 | | |
| | | | | | |

Расстояние от верхней части гидранта до верха люка колодца не должно быть менее 150мм и не более 400мм. ГОСТ 8220-85Е (Высота -2,50м)
Гидранты устанавливаются в колодцах с помощью пожарной подставки по ГОСТ ГОСТ8220-85
Наружные поверхности гидранта окрашиваются водостойкой краской, слой краски должен быть ровным без наплывов, пузырей, трещин и потеков.

Всего -см.Спецификацию НВ.СО

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата 08.2020

Инв. № подл.

| Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГАП | | Сейдахметов К.С. | | | 08.20 |
| ГИП | | Имантаев Б.Т. | | | 08.20 |
| Исполнит | | Ергалиев Е. | | | 08.20 |
| Проверил | | Имантаев Б.Т. | | | 08.20 |
| Нормконтроль | | Исабеков А.Е. | | | 08.20 |

Заказ 1-1/2020 АС

Строительство наружного водопровода по адресу: Федоровский район, п.Федоровка, ул. Победы.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 1 |

Водопроводная сеть

Пожарный гидрант

СПКВО "Намыс" г.Костанай

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Заказчик **Фаерфас Р.Г.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Джумабаев А.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

**Прошнуровано**

**Костанайский филиал ТОО «Гелиос»**

_____

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

# Декларация о соответствии

"18" мая 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ПЛЮС АВД» г.Костанай, ул.Челябинская, дом №11А***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Масягутова Рината Габдулловича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство наружного водопровода для АЗС-АГЗС ТОО «Гелиос»» расположенной по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, село Федоровка Федоровского района, ул. Победы***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО «Гелиос» в лице генерального директора Фаерфас Р.Г.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «ГеоЛайн»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***СПКВО «Намыс» №1/1-2020***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Филиалом ТОО «Гелиос» в г. Костанай № 45 от 03.02.2021г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность участка | м.п | 1093,00 | | 1101,00 | |

ЖС имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***водопровод проложен методом горизонтально направленного бурения, трубы ПЭ 100 SDR 26 Ø110х4,2-1101,0м; Трубы ПЭ 100 SDR 21 Ø50х2,4-10,0м для мокрых колодцев. Трубы под проезжей частью – стальные д-325х6мм, уложены в стальных футлярах, общее кол-во – 27м.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2020 год***;

месяц, год

окончание работ ***март 2021 год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2,5 (два с половиной)***;

фактически, месяц: ***2,5 (два с половиной)***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**Государственное коммунальное предприятие «Водстрой» - Василенко С.В.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство наружного водопровода для АЗС-АГЗС ТОО «Гелиос» расположенной по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, село Федоровка Федоровского района, ул. Победы*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ПЛЮС АВД »***

***директор Масягутов Ринат Габдуллович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО «ПЛЮС АВД», БИН: 000740003910, г. Костанай, ул. Челябинская, строение 11А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157, г. Костанай, ул. Карбышева 12/2, т. 87142273088**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружного водопровода по адресу Федоровский район, пос. Федоровка, ул. Победы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14/12/20** от **14 декабря 2020 года**

# Акт выполненных работ № 1

**за** **март 2021** (месяц, год) на **06-02 Наружный водопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Земельные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 165,5563 | 155,05 | 146,68 | 25670 | 24283 | 0 | 5419 | 33576 | |
| | | | | | | 8,37 | 37,09 | 1386 | 6140 | | 2487 | | |
| 2 | 2 | Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 47,3491018 | 170,56 | 161,35 | 8076 | 7640 | 0 | 1705 | 10563 | |
| | | | | | | 9,21 | 40,8 | 436 | 1932 | | 782 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 | м3 грунта | 1,3257749 | 3963,8 | 0 | 5255 | 0 | 0 | 3784 | 9762 | |
| | | | | | | 3963,8 | 0 | 5255 | 0 | | 723 | | |
| 4 | 4 | Е11-010205-1202 | Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 26,7522425 | 1526,6 | 1526,6 | 40840 | 40840 | 0 | 18534 | 64124 | |
| | | | | | | 0 | 962,2 | 0 | 25741 | | 4750 | | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 191,9311767 | 18,57 | 18,57 | 3564 | 3564 | 0 | 1009 | 4939 | |
| | | | | | | 0 | 7,3 | 0 | 1401 | | 366 | | |
| 6 | 6 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 191,9311767 | 161,94 | 76,73 | 31081 | 14727 | 0 | 16657 | 51557 | |
| | | | | | | 85,21 | 35,33 | 16354 | 6781 | | 3819 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Земельные работы | | | | | | | | | 174521 | |
| | | | Раздел: 2. Водопровод | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 15 | 9920,47 | 5541,55 | 148807 | 83123 | 53739 | 27223 | 190112 | |
| | | | | | | 796,31 | 1036,88 | 11945 | 15553 | | 14082 | | |
| 8 | 8 | С123-010501-1322 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 15 | 13234 | | 198510 | | 198510 | | 214391 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 15881 | | |
| 9 | 9 | Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | | 982 | Страниц - 45411,35 | 2108,62 | 5313946 | 2070665 | 2718304 | 1130781 | 6960305 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 534,6 | 628,54 | 524977 | 617226 | | 515578 | | |
| 10 | 10 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | | 15 | 1294,68 | 7,53 | 19420 | 113 | 2267 | 16904 | 39230 | |
| | | | м трубы, уложенной в футляре | | | 1136,02 | 2,29 | 17040 | 34 | | 2906 | | |
| 11 | 11 | С123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1016,94 | 1646 | | 1673883 | | 1673883 | | 1807794 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 133911 | | |
| 12 | 12 | Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 7644,25 | 4241,35 | 7644 | 4242 | 332 | 4382 | 12988 | |
| | | | | | | 3071,28 | 1354,78 | 3071 | 1355 | | 962 | | |
| 13 | 13 | Е11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | | 5 | 2079,81 | 82,29 | 10399 | 412 | 1637 | 8467 | 20375 | |
| | | | задвижка или клапан | | | 1670,2 | 40,38 | 8351 | 202 | | 1509 | | |
| 14 | 14 | С123-040102-1904 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 5 | 54520 | | 272600 | | 272600 | | 294408 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 21808 | | |
| 15 | 15 | Е11-220901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | | 3 | 1250,35 | 27,43 | 3751 | 82 | 519 | 3158 | 7462 | |
| | | | задвижка или клапан | | | 1049,84 | 13,46 | 3150 | 40 | | 553 | | |
| 16 | 16 | С123-040102-1901 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 29844 | | 89532 | | 89532 | | 96695 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7163 | | |
| 17 | 17 | Е11-221001-0101 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 1 | 2272,82 | 54,86 | 2273 | 55 | 214 | 2011 | 4627 | |
| | | | | | | 2003,94 | 26,92 | 2004 | 27 | | 343 | | |
| 18 | 18 | С123-041011-0501 | Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 33259-2015 | шт. | 1 | 65838 | | 65838 | | 65838 | | 71105 | |
| | | | | | | | | | | | 5267 | | |
| 19 | 19 | С123-041013-0501 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РКТ ОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 31329 | | 31329 | | 31329 | | 33835 | |
| | | | | | | | | | | | 2506 | | |
| 20 | 20 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 12 | 1441,32 | 929,2 | 17296 | 11150 | 0 | 9116 | 28525 | |
| | | | | | | 512,12 | 255,18 | 6145 | 3062 | | 2113 | | |
| 21 | 21 | С123-020302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 1444 | | 14440 | | 14440 | | 15595 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1155 | | |
| 22 | 22 | С123-020302-8006 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 682 | | 1364 | | 1364 | | 1473 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 109 | | |
| 23 | 23 | Е11-221201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 13 | 1095,88 | 69,84 | 14246 | 908 | 796 | 12417 | 28796 | |
| | | | | | | 964,8 | 0 | 12542 | 0 | | 2133 | | |
| 24 | 24 | С123-020103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 23 | 2630 | | 60490 | | 60490 | | 65329 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4839 | | |
| 25 | 25 | Е11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 3 | 570,6 | 34,92 | 1712 | 105 | 63 | 1528 | 3499 | |
| | | | | | | 514,56 | 0 | 1544 | 0 | | 259 | | |
| 26 | 26 | С123-020103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 5 | 1434 | | 7170 | | 7170 | | 7744 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 574 | | |
| 27 | 27 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,01 | 297621,4 | 75052,24 | 2976 | 751 | 10 | 2405 | 5811 | |
| | | | | | | 221613 | 21281,72 | 2216 | 213 | | 430 | | |
| 28 | 28 | С123-010501-1308 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 10,2 | 341 | | 3478 | | 3478 | | 3756 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 278 | | |
| 29 | 29 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,288 | 1378486,66 | 516757,12 | 397004 | 148826 | 103365 | 186435 | 630114 | |
| | | | | | | 502821,6 | 151060,62 | 144813 | 43505 | | 46675 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 30 | 30 | Е11-221001-0103 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 | 2786,72 | 182,89 | 5573 | 366 | 1109 | 4214 | 10570 | |
| 31 | 31 | С123-030103-0909 | Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 2 | 2049,32 | 78,82 | 4099 | 158 | | 783 | | |
| 32 | 32 | Е11-220701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,997 | 50485 | | 100970 | | 100970 | | 109048 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Водопровод | | | 67268,43 | 0 | 67067 | 0 | 9252 | 8078 | | |
| | | | | | | 57989 | 0 | 57815 | 0 | | 57237 | 134248 | |
| | | | Раздел: 3. Колодцы | | | | | | | | 9944 | | |
| 33 | 33 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 11,575 | 22308,81 | 9322,21 | 258224 | 107904 | 30331 | 162240 | 10797835 | |
| | | | | | | 10366,2 | 3791,83 | 119989 | 43890 | | 33637 | 454101 | |
| 34 | 34 | С121-040302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 11342 | | 22684 | | 22684 | | 24499 | Казахстан |
| 35 | 35 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 17155 | | 85775 | | 85775 | 1815 | 92637 | Казахстан |
| 36 | 36 | С121-040301-0104 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 6580 | | 39480 | | 39480 | 6862 | 42638 | Казахстан |
| 37 | 37 | С121-040301-0105 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 9738 | | 58428 | | 58428 | 3158 | 63102 | Казахстан |
| 38 | 38 | С121-040301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 14267 | | 71335 | | 71335 | 4674 | 77042 | Казахстан |
| 39 | 39 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 10 | 17650 | | 176500 | | 176500 | 5707 | 190620 | Казахстан |
| 40 | 40 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 5 | 19869 | | 99345 | | 99345 | 14120 | 107293 | Казахстан |
| 41 | 41 | С121-040302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 5 | 9413 | | 47065 | | 47065 | 7948 | 50830 | Казахстан |
| 42 | 42 | С121-040301-0104 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 6580 | | 39480 | | 39480 | 3765 | 42638 | Казахстан |
| 43 | 43 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 26 | 2322 | | 60372 | | 60372 | 3158 | 65202 | Казахстан |
| 44 | 44 | С123-030101-0506 | Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 7 | 9429 | | 66003 | | 66003 | 4830 | 71283 | Казахстан |
| 45 | 45 | С121-060304-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,12442 | 614966 | | 76514 | | 76514 | 5280 | 82635 | Казахстан |
| 46 | 46 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (упоров) | м3 | 1,05 | 28363,42 | 1163,37 | 29782 | 1222 | 22767 | 6121 | 38136 | |
| 47 | 47 | Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 102,41 | 5517,4 | 269,42 | 5793 | 283 | | 5529 | | |
| 48 | 48 | Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой | | 102,41 | 149 | 2,44 | 15259 | 250 | 8657 | 2825 | 21234 | |
| | | | | | | 62,03 | 0,27 | 6352 | 28 | | 4402 | | |
| | | | | | | 118,61 | 2,44 | 12147 | 250 | 5544 | 1573 | 17873 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | 62,03 | 0,27 | 6352 | 28 | | 1324 | | |
| 49 | 49 | E11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 1,0025 | 9091,79 | 1740,15 | 9115 | 1744 | 4015 | 3852 | 14004 | |
| | | | | м3 подстилающего слоя | | 3346,92 | 740,3 | 3355 | 742 | | 1037 | | |
| 50 | 50 | E11-060101-0101 | Подготовка бетонная (отмостка). Устройство | | 2,99 | 20877,96 | 1106,37 | 62425 | 3308 | 55311 | 4128 | 71877 | |
| | | | | м3 | | 1273,05 | 244,03 | 3806 | 730 | | 5324 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Колодцы | | | | | | | | | 1527644 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 9876137 | 2526530 | 6380817 | 1697939 | 12500000 | |
| | | | | | | | | 968790 | 769071 | | 925924 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1500000 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 14000000 | |

**Сдал (Субподрядчик)**

ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Коробейченко С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "КУРЫЛЫСИНЖИНИРИНГ-НС"

Эксперт(ы) технического надзора:

СПКВО "Намыс"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Генеральный подрядчик)**

ТОО "Плюс АВД", БИН 000740003910

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Масагутов Р.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик ТОО "ПЛЮС АВД"

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружного водопровода по адресу: Федоровский район, п. Федоровка ул. Победы

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за март 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | 14/12/20 | 14.12.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за март) без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство наружного водопровода по адресу: Федоровский район, п. Федоровка ул. Победы | 14 000 000 | 12 500 000 | | | | | | | 1 500 000 | 14 000 000 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | 14 000 000 |

От генерального подрядчика _____ Масягутов Р.Г.

От субподрядчика _____ Коробейченко С.В.
