Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"15" 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания «НурайСтрой», Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, нежилое помещение 1 в, офис 204**

наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице директора**АкмагамбетоваЖанатаКанатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Пообъекту: **Реконструкция системы холодного и горячего водоснабжения 25 микрорайона города Экибастуз**

наименование, местонахождениеобъекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз», руководитель Г.И.Оспанов** наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной истроительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Строй-ЗАСТ» -лицензия № 14003994 от 18.03.2014 года, ТОО «КазЕвроСтрой» - лицензия № 19007070 от 26.03.2019 года, ТОО «СК MEGARON» - лицензия № 011740 от 19.05.2003 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО«ПАВЛОДАРНЕРГОПРОЕКТ», №777-18, №EPVL-0093/18 от 20/08/2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» №169 от 24.08.2018 г**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность хозяйственно-противопожарного водопровода	м	15072,5		15072,5	
Общая протяженность сетей горячего водоснабжения	м	3635,0		3635,0	
Смотровые колодцы	шт	257		257	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В рабочем проекте предусмотрено строительство хозяйственно-противопожарного водопровода. Принята подземная прокладка трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода с трассировкой, учитывающей существующие схемы водоснабжения, подключения потребителей. Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 25 микрорайона является городской объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод. Точки подключения проектируемого водопровода, согласно Технических условий. При необходимости, в месте подключения к существующим сетям водопровода, устанавливаются водопроводные колодцы с отключающей арматурой. Рабочим проектом также предусматривается установка колодцев для подключения индивидуальных жилых домов, а также задания на проектирование, рабочим проектом предусмотрен подвод сетей водопровода к границам участков потребителей. Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов, учитывая агрессивные свойства грунтовых вод к бетону - на сульфатостойком цементе. В местах прохода полиэтиленовых труб через стенки колодцев предусмотрены стальные гильзы, зазор между гильзой и трубопроводом заделывается упругим эластичным материалом,

предупреждающим попадание влаги внутрь колодца. Учитывая высокое стояние грунтовых вод, предусмотрена гидроизоляция колодцев. :

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

началоработ**сентябрь 2019 года;**

месяц,год

окончаниеработ **декабрь 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**8**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**8;**

фактически, месяц:**15**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер ГКП „Горводоканал" Сайботалов Е.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция системы холодного и горячего водоснабжения 25 микрорайона города Экибастуз»**готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АкмагамбетовЖанатКанатович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)
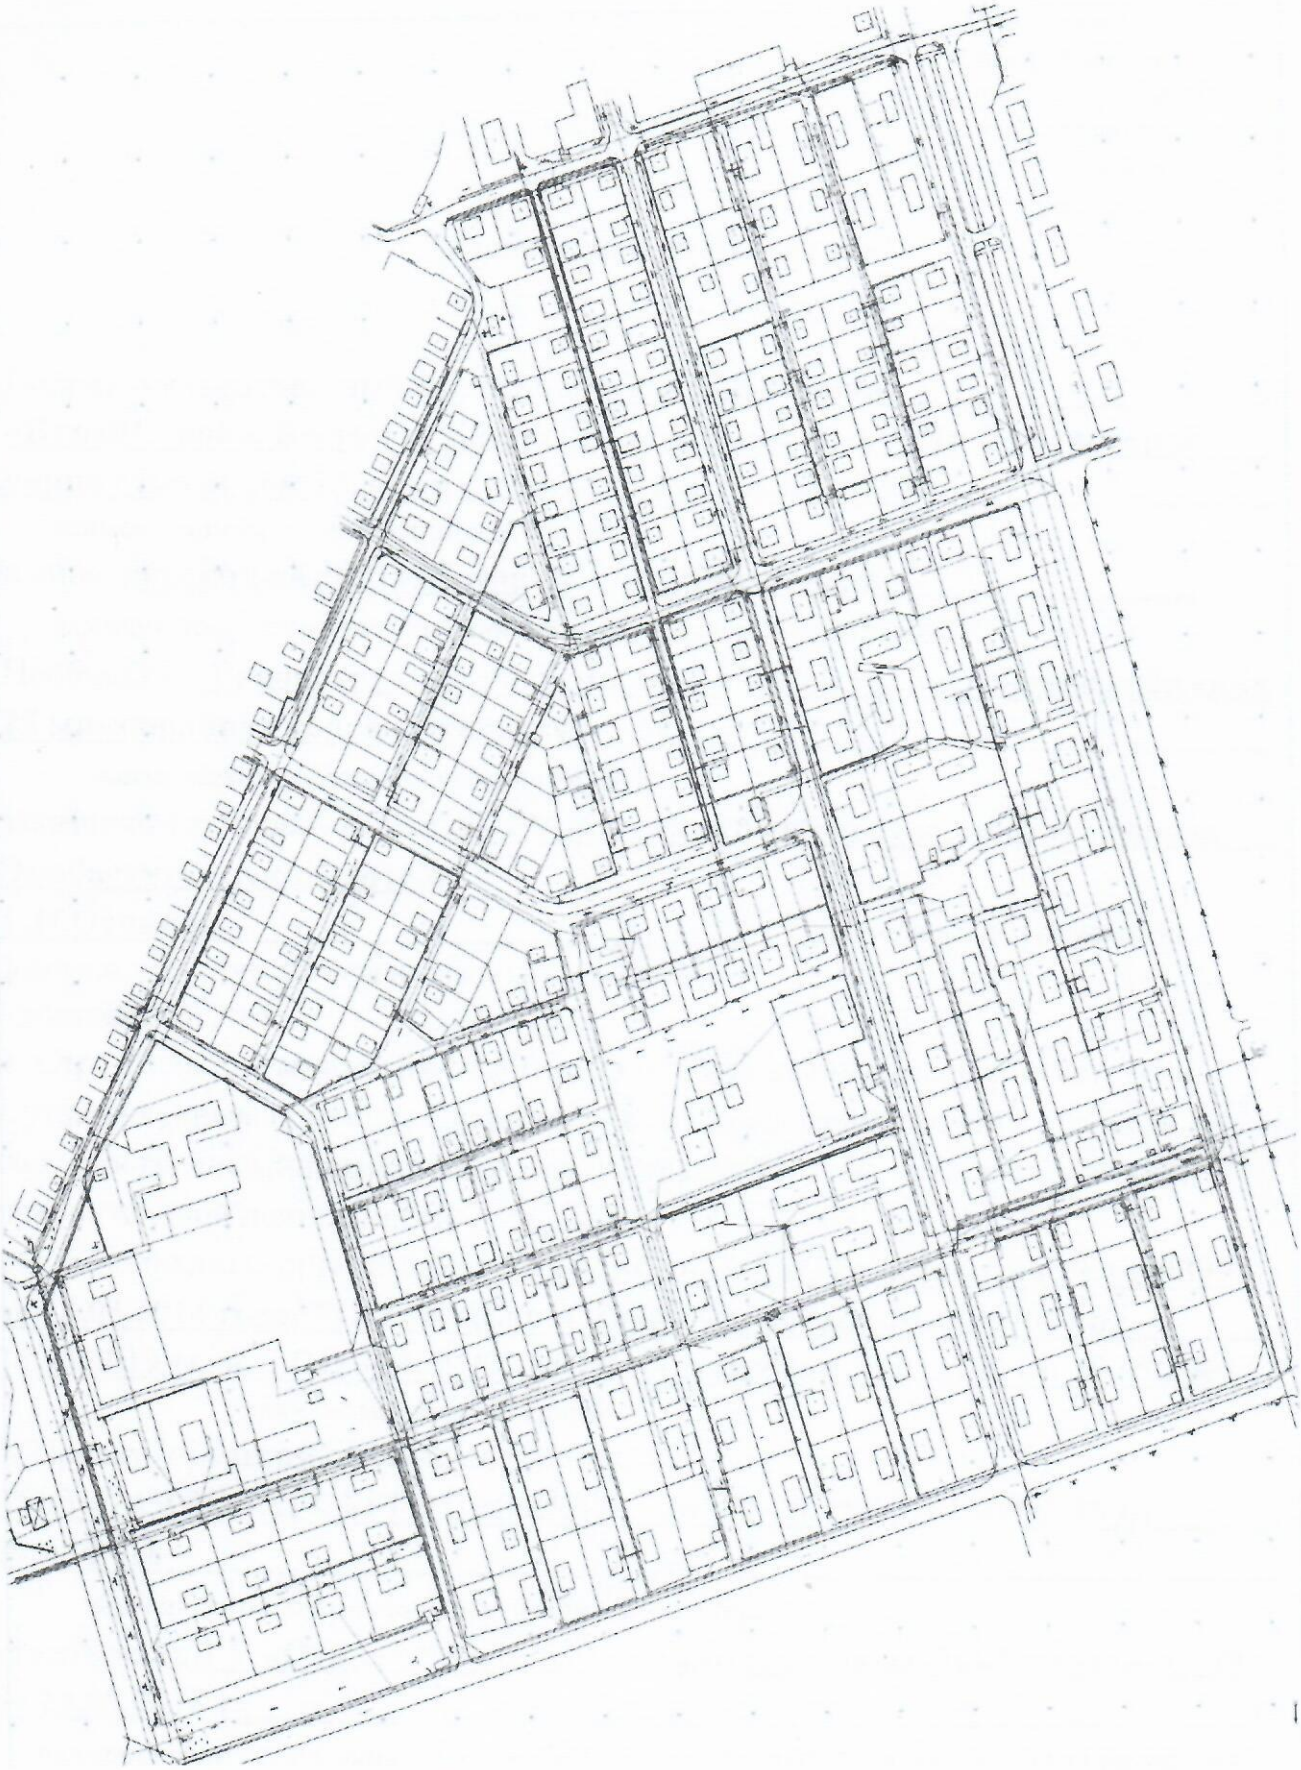
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей.
