Форма 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь 2016 года

Заказчик: ГККП ясли-детский сад "Ертостик" "Аппарат акима сельского округа Шолаккорган Созакского района"
Инженер: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Договор: №35 от 03.06.2016г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт ясли сада "Ертостик" в с.Шолаккорган Созакского района (2-очередь)"

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		За отчетный м-ц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	21 116 071	23 650 000	21 116 071	23 650 000
	В том числе оборудование	2 846 281	3 187 835	2 846 281	3 187 835
	Всего затраты подрядчика	21 116 071	23 650 000	21 116 071	23 650 000
	Итого к оплате:	**21 116 071**	**23 650 000**	**21 116 071**	**23 650 000**

Заказчик:

Заведующая ГККП ясли- детский сад "Ертостик" "Аппарат акима сельского округа Шолаккорган Созакского района"

Ембергенова А.Е.

Инженер:

Директор:
ТОО"Жоба Құрылыс Орталығы"

Егембердиев Д.С.

Подрядчик:

Директор:
ТОО "Отырабат Құрылыс"

Р.Утешов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Заказчик : ГККП ясли-детский сад "Ертостик" "Аппарат акима сельского округа Шолаккорган Созакского района"
Подрядчик : ТОО "Отырабат Курылыс"
Инженер : ТОО "Жоба Курылыс Орталыгы"
Договор : №35 от 03.03.2016г.

12010

Форма N 2в

Наименование объекта : Капитальный ремонт ясли сада "Ертостик" в с.Шолаккорган Созакского района (2-очередь)"

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей и рабочих обслуживающих машины: на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Витражи								
		Витражи ВИ-1 /36шт/								
1	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	182,628	965,99 927,00	28,84 10,15	176417 169296	5268 1854	154025 90	4,98 0,04	909 7
2	С12061-181 Изм. и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	182,628	4472,00 --	-- --	816712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Витражи ВИ-2 /2шт/								
3	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	7,296	965,99 927,00	28,84 10,15	7048 6763	210 74	6154 90	4,98 0,04	36 --
4	С12061-181 Изм. и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	7,296	4472,00 --	-- --	32628 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Витражи ВИ-3/4шт/								
5	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	34,542	965,99 927,00	28,84 10,15	33367 32020	996 351	29134 90	4,98 0,04	172 1
6	С12061-181 Изм. и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	34,542	4472,00 --	-- --	154472 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Стойка Ст-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0,114164	6067,84	3229,46	693	369	309	12,50	1
		т		2115,00	892,56	241	102	90	3,37	--
8	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,114164	2452,13	545,76	280	62	126	5,25	1
		т		1230,75	--	141	--	90	--	--
9	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,10318	172800,00	--	17830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,010984	154200,00	--	1694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-59	Дюбель с шайбой 4,5х60	0,0001464	149300,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1241162	6905			1120
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60230				
		Накладные расходы -	Тенге			189758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1516775				

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ В1

1	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	225	693,07	10,34	155941	2327	23276	0,43	97
		м		76,95	3,87	17314	871	128	0,02	4
2	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	77	336,95	7,90	25945	608	23132	1,29	99
		м		231,75	2,95	17845	227	128	0,01	1
3	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления ср еднего типа наружным диам. 20 мм	98	439,78	12,19	43098	1195	37264	1,64	161
		м		292,50	4,57	28665	448	128	0,02	2
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	20	473,47	39,24	9469	785	6912	1,47	
		1шт		254,25	15,75	5085	315	128	0,07	
5	СПРАЙС ЛИСТстр8	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Б27п1 д-50 мм	8	1222,14	--	9777	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
6	СПРАЙС ЛИСТстр	ВЕНТИЛЬ ПРОПИЛЕНОВЫЙ ППР д-25 мм	7	279,69	--	1958	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
7	СПРАЙС ЛИСТстр	ВЕНТИЛЬ ПРОПИЛЕНОВЫЙ ППР д-20 мм	13	181,57	--	2360	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0117-2-3	Установка смесителей	72	143,32	1,57	10319	113	11612	0,70	50
		шт		126,00	--	9072	--	128	--	--
9	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦАОЦБА центральные, с аэратором и латунными маховичками	60	5360,00	--	321600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
10	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	12	1530,00	--	18360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС ЛИСТстр9	ГИБКАЯ ПРОВОДКА В1/2 L 50 см	102	104,75	--	10685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б 3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	102	266,00	--	27132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7372,57	1,57	22118	5	207	0,30	1
		1кран		54,00	--	162	--	128	--	--
14	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	313,00	--	313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	42,4	21,80	0,05	924	2	222	0,03	1
		м2		5,81	0,02	246	1	90	--	--
16	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	84,8	19,64	0,02	1666	2	239	0,02	1
		м2		3,13	--	265	--	90	--	--
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 50 мм	225	10,99	--	2473	--	3079	0,05	11
		м		10,69	--	2405	--	128	--	--
18	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	14	11863,47	23,09	166089	323	2984	0,90	13
		1кран		157,50	9,00	2205	126	128	0,04	1
19	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1230,00	--	1230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	1201-51	Огнетушитель углекислотный	2	1440,00	--	2880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	72,93	9,93	292	40	328	0,32	--
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
22	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202,00	--	808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Шкаф пожарный разм 840(ширина) х650(высота) х230(глубина)/14 шт/ мм								
23	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	14	164,30	23,87	2300	334	1837	0,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12010
24	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных шт	14	100,35 216,81	9,02 36,97	1405 3035	126 518	120 1849	0,04 0,63	1 9	
25	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2 м2	7,644	96,08 2130,00	13,95 --	1345 16282	195 --	120 --	0,07 --	1 --	
26	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами дл я общественных зданий комплект	14	360,00 --	-- --	5040 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
27	С12067-18	Боковые стенки антресолей СБА 4-4,5; СБА 5-4,5; СБА 6-5,5 м2	9,59	2210,00 --	-- --	21194 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
28	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом м2	7,644	553,28 86,85	2,13 0,81	4229 664	16 6	704 105	0,56 --	4 --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			887517	6267			489	
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			27660					
		Накладные расходы -	Тенге			113645					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58410					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1059572					

РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ ВОДОМЕРНЫЙ БЕЗ ВСТАВКИ КОМПЛЕКТНО

29	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	5	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1728 128	1,47 0,07	7 --
30	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	3500,00 --	-- --	14000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	СПРАЙС ЛИСТстр5	ЗАДВИЖКА 30ч906 бр ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ шт	1	68788,76 --	-- --	68789 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	2	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	164 130	0,32 --	
33	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --	
34	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	3	693,07 76,95	10,34 3,87	2079 231	31 12	310 128	0,43 0,02	
35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диам. до 50 мм м	3	10,99 10,69	-- --	33 32	-- --	41 128	0,05 --	
36	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1счетчик		67,50	–	68	–	128	–	–
37	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	–	8320	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	–	126	–	130	–	–
39	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202,00	–	404	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	–
		комплект		41,72	–	42	–	128	–	–
41	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 20 мм	0,9	364,67	4,19	328	4	71	0,34	–
		м		59,85	1,58	54	1	128	0,01	–
42	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 50 мм	0,9	10,99	–	10	–	12	0,05	–
		м		10,69	–	10	–	128	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			97966	274			11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			68789				
		Накладные расходы -	Тенге			2630				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			102505				

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3

43	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	6	1512,32	97,07	9074	582	10800	7,87	47
		комплект		1370,25	36,00	8222	216	128	0,18	1
44	СПРАЙС ЛИСТстр10	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 200Л	6	31915,19	–	191491	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления ср еднего типа наружным диам. 20 мм	98	439,78	12,19	43098	1195	37264	1,64	161
		м		292,50	4,57	28665	448	128	0,02	2
46	СПРАЙС ЛИСТстр9	ГИБКАЯ ПРОВОДКА В1/2 L 50 см	78	104,75	–	8171	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	78	266,00	–	20748	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			272582	1777			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			199662				
		Накладные расходы -	Тенге			48064				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			327906				

РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОБЫТОВАЯ К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				61725			
48	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	24	9126,62	39,24	219039	942	12372	2,22	53
		комплект		387,00	15,75	9288	378	128	0,07	2
49	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	36	5831,96	17,71	209951	638	12545	1,49	54
		комплект		265,50	6,75	9558	243	128	0,03	1
50	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х24 0-180, 200-175 мм	36	1750,00	--	63000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	24	3977,40	13,90	95458	334	8709	1,56	37
		комплек т		279,00	4,50	6696	108	128	0,03	1
52	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	12	4260,08	54,70	51121	656	2868	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	1998	243	128	0,10	
53	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	35	620,54	0,64	21719	22	4769	0,58	
		м		106,20	0,25	3717	9	128	--	
54	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 м м	106	748,88	1,43	79381	152	13964	0,56	
		м		102,38	0,54	10852	57	128	--	
55	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	48	712,05	10,58	34178	508	7570	0,70	
		м		119,25	3,96	5724	190	128	0,02	
56	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	4,8	218,93	--	1051	--	1187	1,54	
		м3		218,93	--	1051	--	113	--	
57	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,92	122,18	--	235	--	265	0,89	
		м3		122,18	--	235	--	113	--	
58	С130804-46	Ревизия ПНД , Dy-110 мм	0,5	226,00	--	113	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
59	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			778143	3260			
		Накладные расходы -	Тенге			64436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			893133				

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1	Е0122-8-10	Укладка стальны х водопроводных труб диам. 426Х6мм /ФУТЛЯР/	0,0004	270167,88	115634,50	108	46	88	66
		км		126000,00	43681,50	50	17	130	21
2	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,4016	4836,00	--	1942	--	--	
		м		--	--	--	--	--	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1662					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			61725					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0122-8-6	Укладка стальны х водопроводных труб диам. 219х5 мм /ФУТЛЯР/ км	0,0028	154891,68	66009,80	434	185	346	376,00	1
				70200,00	24936,75	197	70	130	121,79	--
4	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм м	2,8112	1751,00	--	4922	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х5 мм/ФУТЛЯР/ км	0,0004	115636,32	31953,19	46	13	41	360,00	--
				66375,00	12071,25	27	5	130	58,95	--
6	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм м	0,4016	1142,00	--	459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х5 мм /ВСТАВКА/ км	0,0004	204666,79	85907,16	82	34	67	504,00	--
				95850,00	32451,75	38	13	130	158,50	--
8	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм м	0,4016	2696,00	--	1083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-8-3	Укладка стальны х водопроводных труб диам. 114Х4,5 мм /ВСТАВКА/ км	0,0032	70153,47	10674,97	224	34	220	270,00	
				48825,00	4032,00	156	13	130	19,69	
10	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм м	3,2128	670,00	--	2153	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
11	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57Х3 мм /ВСТАВКА/ км	0,0004	62566,88	6788,50	25	3	25	253,00	
				45675,00	2565,00	18	1	130	12,52	
12	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	0,4016	250,00	--	100	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
13	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм фланец	8	708,82	102,44	5671	819	5499	2,45	
				524,25	4,50	4194	36	130	0,02	
14	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 шт.	8	1877,00	--	15016	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
15	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	75	156,43	21,43	11732	1607	12285	0,60	
				126,00	--	9450	--	130	--	
16	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	75	384,00	--	28800	--	--		
				--	--	--	--	--		
17	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	8	74,06	9,93	592	79	655		
				63,00	--	504	--	130		
18	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	8	202,00	--	1616	--	--		
				--	--	--	--	--		
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых ВТУЛОК	12	300,57	225,64	3607	2708	2005		

		Накладные расходы -	Тенге			4237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1662				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			61725				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 899 765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
20	С130804-3389 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	2	5418,00	--	10836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	6	552,00	--	3312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек и ли клапанов обратных диам. 100 мм	16	497,61	28,48	7962	456	7348	2,03	32
		шт		342,00	11,25	5472	180	130	0,05	1
24	СПрайс-лист	ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗ ИНЕНЫМ КЛИНОС Belgicast BV-05-47 D-100мм	14	16132,19	--	225851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист	ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗ ИНЕНЫМ КЛИНОС с электроприводом Belgicast BV-05-47 D-100мм	2	284582,94	--	569166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм/ПЕРЕХОД 100х50мм ,ТРОЙНИК 300Х100мм,ТРОЙНИК 100х100 ММ/	0,0792	121294,13	49389,75	9606	3912	8384	312,70	25
		т		62775,00	18657,00	4972	1478	130	91,12	7
27	С130810-113 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100-50 мм	2	338,00	--	676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-157 прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <16 МПа, 300х100 мм	1	3930,00	--	3930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 1 08х4 мм	7	741,00	--	5187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-4	Пожарная подставка Dy 100 мм	2	3630,00	--	7260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	
32	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100мм	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	
		1врезка		1190,25	42,75	1190	43	128	0,20	
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых ОТВОД ОВ	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	
34	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338,00	--	676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Тенге			1662							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			61725							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 899 765							

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

12010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	600,00	--	1200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	261,00	--	522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	4	11001,66	95,97	44007	384	3394	4,90	20
				771,75	36,25	3087	145	105	0,18	1
38	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,128	58881,69	25695,31	7537	3289	6637	194,00	25
				33075,00	6813,45	4234	872	130	26,38	3
39	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	129,28	432,00	--	55849	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,0178	51202,26	20326,01	911	362	837	179,00	3
				30825,00	5353,43	549	95	130	20,64	--
41	С130804-913 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	17,978	142,00	--	2553	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,128	8287,75	--	1061	--	1337	51,50	7
				8032,50	--	1028	--	130	--	--
43	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,0178	8097,13	--	144	--	186	51,50	1
				8032,50	--	143	--	130	--	--
44	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,088	70153,47	10674,97	6174	939	6047	270,00	24
				48825,00	4032,00	4297	355	130	19,69	2
45	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм м	88,352	670,00	--	59196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-19-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,088	191625,64	23876,89	16863	2101	4224	161,00	14
				27900,00	9020,25	2455	794	130	44,05	4
47	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ОТВОД 114Х6мм т	0,005	121294,13	49389,75	606	247	529	312,70	2
				62775,00	18657,00	314	93	130	91,12	--
48	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114x6 мм шт	5	482,00	--	2410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы водопроводные ж/б д-2000мм /3 шт/								
49	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	7,02	21271,45	1879,87	149326	13197	18014	8,86	62
				1435,50	538,43	10077	3780	130	2,06	14

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 7 899 765

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						12000
50	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, крупные(КЗ-20-3 ШТ,П9-1-20-5ШТ) м3	3,42	32800,00	–	112176	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
51	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме мелкого: выше 20 до 22,5 м3	3,42	-134,00	–	-458	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
52	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме мелкого: выше 15 до 20 м3	3,42	-250,00	–	-855	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
53	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dn 2000 мм(КЦ-20-9-6шт) м	5,34	10800,00	–	57672	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
54	С143018-40 Изм. и	Кольца перекрытия смотровых колодцев марки 1КЦО1-1 шт/ шт	3	913,00	–	2739	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
55	С111104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-94 комплект	3	8060,00	–	24180	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-4-6шт/ МС-5/4шт/ МС-8/8шт/) т	0,08568	175710,10	1829,10	15065	156	1054	42,70	4
				8100,00	699,75	694	59	149	3,37	–
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ Д-2000МM, Н-1800ММ/3ШТ/								
57	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторов "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	129,6	27,84	26,18	3607	3392	1114	0,01	1
				1,66	7,20	215	933	97	0,03	3
58	Е0101-064-2 т.ч. п-1 55, п-3 180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	4,02	262,72	–	1056	–	1180	1,85	7
				262,72	–	1056	–	113	–	–
59	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9,3	21,55	4,52	200	42	154	0,31	1
				17,03	–	158	–	97	–	–
60	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	107,4	6,48	6,48	696	696	219	–	–
				–	2,10	–	226	97	0,01	1
61	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	107,4	21,55	4,52	2314	485	1774	0,31	1
				17,03	–	1829	–	97	–	–
62	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	26,22	12,34	12,34	324	324	89	–	
				–	3,50	–	92	97	0,01	
		БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
63	Е0146-33-1	Заделка отверстий БЕТОНОМ В 15 м3	1,5	23313,63	208,73	34970	313	12464	55,36	
				8230,50	78,75	12346	118	100	0,39	

		Предусмотренные затраты -	Тенге			4237					44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1662					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			61725					
						7 899 765					

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12010
				11							
64	Е0106-1-13	Устройство бетонных УПОРОВ В10	0,3	11001,66	95,97	3300	29	255	4,90	1	
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--	
65	Е0106-1-2	Устройство бетонных ОПОР ПОД ЗАДВИЖКИ В 15	0,72	11130,05	98,32	8014	71	554	4,41	3	
		м3		695,25	37,15	501	27	105	0,18	--	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
66	С12021-267	Стремянка С-3	0,0609	133700,00	--	8142	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50,19	245,44	3,82	12319	192	2297	0,21	11	
		м2		37,35	1,44	1875	72	118	0,01	--	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
68	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /10 см/	10,2	234,38	17,83	2391	182	156	0,04	--	
		м2		6,41	5,07	65	52	133	0,02	--	
69	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37к=2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	10,2	-70,05	--	-715	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
70	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,2	416,95	--	4253	--	336	0,14	1	
		м2		24,75	--	252	--	133	--	--	
				Колодцы водопроводные ж/б д-1500мм /4 шт/							
71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,28	21271,45	1879,87	91042	8046	10983	8,86	38	
		м3		1435,50	538,43	6144	2304	130	2,06	9	
72	С143018-24 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КН-15-4ШТ,ПП1-15-1-4ШТ)	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
73	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,6	-134,00	--	-348	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
74	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,6	-250,00	--	-650	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
75	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС-15-9-10шт)	8,9	8530,00	--	75917	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--		
76	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки /КЦО1-1 шт/	4	913,00	--	3652	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
77	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--		
		комплект		--	--	--	--	--	--		

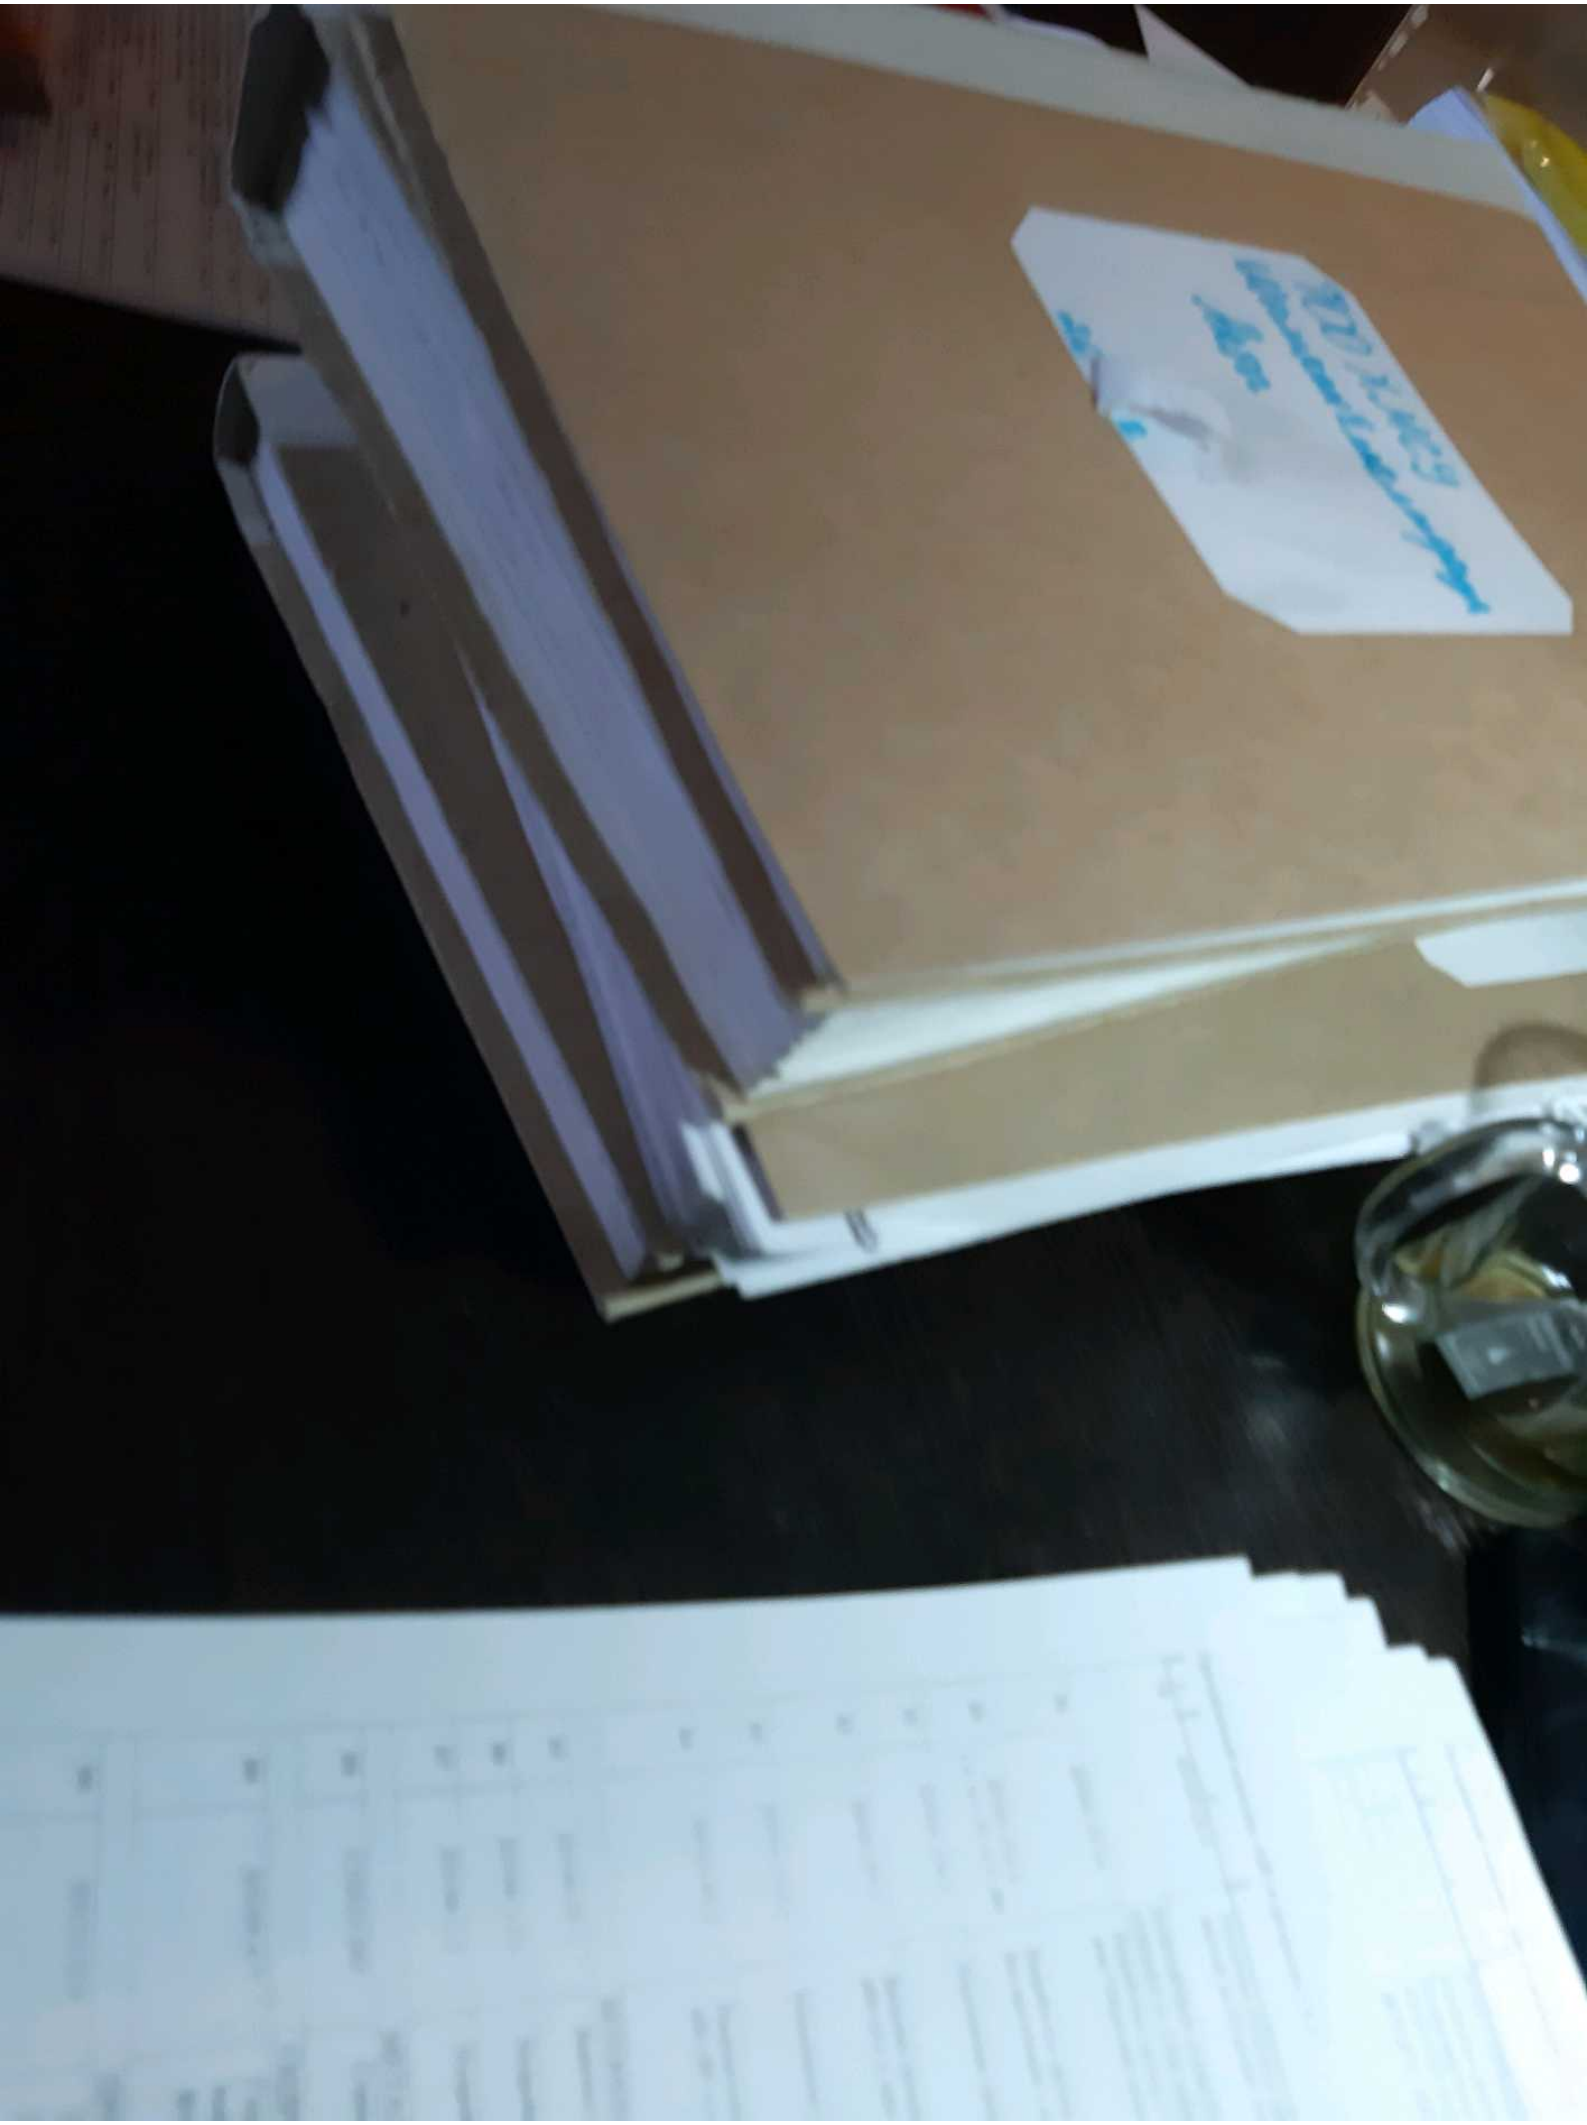

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-3/6шт/,МС-5/4шт/,МС-7/6шт/) т	0,11232	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	19736 910	205 78	1382 140	42,70 3,37	5 --
		ЗАМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ Д-1500ММ, Н-1800ММ/2ШТ/ И Д - 1500ММ Н-2700 ММ /2 ШТ/								
79	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	175,12	27,84 1,66	26,18 7,20	4874 291	4584 1261	1505 97	0,01 0,03	2 4
80	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3 180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	5,42	262,72 262,72	-- --	1424 1424	-- --	1609 113	1,85 --	10 --
81	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	8,8	21,55 17,03	4,52 --	190 150	40 --	145 97	0,11 --	1 --
82	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	156,5	6,48 --	6,48 2,10	1014 --	1014 329	319 97	-- 0,01	-- 1
83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	156,5	21,55 17,03	4,52 --	3372 2665	707 --	2585 97	0,11 --	17 --
84	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	24,06	12,34 --	12,34 3,50	297 --	297 84	82 97	-- 0,01	-- --
		БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
85	Е0146-33-1	Заделка отверстий БЕТОНОМ В 15 м3	2	23313,63 8230,50	208,73 78,75	46627 16461	417 158	16619 100	55,16 0,39	110 1
86	Е0106-1-13	Устройство бетонных УПОРОВ В10 м3	0,4	11001,66 771,75	95,97 36,25	4401 309	38 14	339 105	4,90 0,18	2 --
87	Е0106-1-2	Устройство бетонных ОПОР ПОД ЗАДВИЖКИ В 15 м3	0,64	11130,05 695,25	98,32 37,15	7123 445	63 24	492 105	4,41 0,18	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
88	С12021-267	Стремянка С-3 т	0,0812	133700,00 --	-- --	10856 --	-- --	-- --	-- --	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	57,48	245,44 37,35	3,82 1,44	14108 2147	220 83	2631 118	0,21 0,01	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
90	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	1,36	1524,04 474,75	-- --	2073 646	-- --	794 123	3,10 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	13,6	416,95	–	5671	–	448	0,14	2
		м2		24,75	–	337	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1956449	52978			630
		ВСЕГО: Стоимость оборудования -	Тенге			795016				
		Накладные расходы -	Тенге			142398				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			73054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2156300				

РАЗДЕЛ 7.ФундаментыЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

92	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	355,1	27,84	26,18	9884	9295	3052	0,01	4
		м3		1,66	7,20	589	2557	97	0,03	9
93	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3 180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11	262,72	–	2890	–	1266	1,85	20
		м3		262,72	–	2890	–	113	–	–
94	Е0101-166-1	Устройство подушки из местного мягкого грунта 1 группы	22,9	122,18	–	2798	–	2162	0,89	20
		м3		122,18	–	2798	–	113	–	–
95	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	91,8	122,18	–	11216	–	12074	0,89	81
		м3		122,18	–	11216	–	113	–	–
96	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	91,8	21,55	4,52	1978	415	1506	0,11	10
		м3		17,03	–	1563	–	97	–	–
97	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	249,4	3,35	3,35	836	836	281	–	–
		м3		–	1,16	–	290	97	–	1
98	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2	7,61	7,61	15	15	4	–	
		м3		–	2,31	–	5	97	0,01	
99	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/20 см/	15,9	234,38	17,83	3727	283	243	0,04	
		м2		6,41	5,07	102	81	133	0,02	
100	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37к=8	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	15,9	1120,79	–	17821	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
101	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,3 мм	0,128	58881,69	25695,31	7537	3289	6637	194,00	
		км		33075,00	6813,45	4234	872	130	26,38	
102	С130804-916 Изм. и доп вып 14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,28	432,00	–	553	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
103	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0178	51202,26	20326,01	911	362	837	179,00	

		в т.ч. оборудование	Тенге			7 899 765							
			Тенге			4 060 455							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
104	С130804-913 Изм. и доп. вып. 14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км	17,978	30825,00	5353,43	549	95	130	20,64	–	
				142,00	–	2553	–	–	–	–	
105	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114х4,5 мм с гидравлическим испытанием м	0,088	–	–	–	–	–	–	–	
				70153,47	10674,97	6174	939	6047	270,00	24	
106	С130806-82 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм км	88,352	48825,00	4032,00	4297	355	130	19,69	2	
				670,00	–	59196	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			128088	15434			188	
		Накладные расходы -	Тенге			37720					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9948					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			175756					

РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

107	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм км	0,2313	444788,62	1733,92	102880	401	18527	361,00	83	
				60966,00	650,25	14101	150	130	3,17	1	
108	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм м	231,3	11,76	–	2719	–	3165	0,05	12	
				10,69	–	2473	–	128	–	–	
		Колодцы канализационные ж/б д-1000мм /11 шт/									
109	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	5,83	17959,19	2308,84	104702	13461	23879	13,87	81	
				2286,00	864,68	13327	5041	130	4,22	24	
110	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22 ,5, круглые(ПН-10-11ШТ, ПП1-10-1 -11 ШТ) м3	2,09	32800,00	–	68552	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
111	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех в изде, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,09	-134,00	–	-280	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
112	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,09	-250,00	–	-523	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
113	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КЦ-10-6-10шт) м	5,9	9383,00	–	55360	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
114	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС-10-9-8шт) м	7,12	8530,00	–	60734	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	

Итого 1 069 746

Итого 4 166 455

Продолжение таблицы 4.6.1 к приказу [illegible]

№ п/п	Шифр	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Стоимость всего, руб.					
116	[illegible]	Лист стальной толщиной свыше 4 мм марки [illegible]	т	11	915,00	–	800	–	–	–	–	–	–
117	[illegible]	Лист стальной толщиной [illegible] ГОСТ [illegible]	т	11	800,00	–	800	–	–	–	–	–	–
	[illegible]	Сгущенка	т	4,1194	13 700,00	–	8000	–	–	–	–	–	–
		Контрольная геодезическая [illegible]											
118	[illegible]	Устройство геодезических знаков [illegible]	м3	220	1 900,00	200,00	4500	500	900	1 187	[illegible]	[illegible]	[illegible]
119	[illegible]	Сплав [illegible]	м3		200,00	80,00	1000	500	100	132	[illegible]	[illegible]	[illegible]
120	[illegible]	Подбивка [illegible]	м3	6,07	2 000,00	–	8000	–	–	–	–	–	–
121	[illegible]	Подбивка [illegible]	м3	6,07	400,00	–	400	–	–	–	–	–	–
122	[illegible]	Сплав [illegible]	м3	6,07	200,00	–	400	–	–	–	–	–	–
123	[illegible]	Сплав [illegible]	т	2,67	8 000,00	–	22 000	–	–	–	–	–	–
124	[illegible]	Лист стальной толщиной [illegible] марки [illegible]	т	3	900,00	–	2 700	–	–	–	–	–	–
125	[illegible]	Лист стальной толщиной [illegible] ГОСТ [illegible]	т	3	800,00	–	2 400	–	–	–	–	–	–
126	[illegible]	Сгущенка	т	4,028	13 700,00	–	3 400	–	–	–	–	–	–
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
127	[illegible]	Разработка грунта I группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3429	37,84	34,08	9846	870	3347	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
128	[illegible]	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,6	245,72	–	2705	–	3347	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
129	[illegible]	Разработка вручную из мягкого мелкого грунта I группы	м3	24,9	122,18	–	3042	–	3420	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
130	[illegible]	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	108	122,18	–	13 195	–	3420	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
131	[illegible]	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) л.с., при перемещении грунта I группы до 5 м		296,6	3,35	3,35	726	726	34	–	–	–	–

		Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4	Тенге			8 004 194						
						27 606						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	E0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м		--	1,16	--	252	97	--	1
		м3	4	7,61	7,61	30	30	9	--	--
132	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/20 см/		--	2,31	--	9	97	0,01	--
		м2	11	234,38	17,83	2578	196	168	0,04	--
133	E0127-21-1 т.ч. п-1.37к=8	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменение толщины слоя		6,41	5,07	71	56	133	0,02	--
		м2	11	1120,79	--	12329	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	Тенге			666945	29215			350
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			44820				
						791826				

РАЗДЕЛ 9. Резервуары для воды прямоугольные ж/бетонные сборные емк.100м3.Общестроительные работы

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3	428,74	33,67	32,10	14436	13763	5779	0,01	5
				1,57	12,33	673	5284	97	0,05	21
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	13,26	218,93	--	2903	--	3280	1,54	20
				218,93	--	2903	--	113	--	--
3	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	7	402,75	--	2819	--	3186	2,80	20
				402,75	--	2819	--	113	--	--
4	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 мВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ								
		м3	442	4,85	4,85	2144	2144	722	--	--
				--	1,68	--	744	97	0,01	2
5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 мИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА								
		м3	442	6,01	6,01	2655	2655	893	--	--
				--	2,08	--	921	97	0,01	3

МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б плита днища ПДМ1

10	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В-3,5								
		м3	9,2	9051,97	66,01	83278	607	2132	1,35	1
				195,75	24,93	1801	229	105	0,12	
11	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	9,2	133,00	--	1224	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
12	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	9,2	266,00	--	2447	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
13	E0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей В-15,W-6								
			8	11521,25	672,63	92170	5381	9756	5,83	

		на дополнительные отпуска, 0.4		Тенге			8 004 194				
							27 606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				17							
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	8	927,00	234,39	7416	1875	105	0,93	7	
				133,00	--	1064	--	--	--	--	
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	8	266,00	--	2128	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм т	0,148	55620,00	--	8232	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
17	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,00382	68200,00	--	261	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2246	67700,00	--	15205	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,314	65900,00	--	20693	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм т	0,0168	41200,00	--	692	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			252351	24550				104
		Накладные расходы -	Тенге			25747					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16686					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			294784					
		РАЗДЕЛ 10. ВЫГРЕБ 50 М3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	132,99	27,84	26,18	3702	3481	1143	0,01	2	
				1,66	7,20	221	958	97	0,03	3	
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ДОРАБОТКА/ м3	10,01	262,72	--	2630	--	2972	1,85	18	
				262,72	--	2630	--	113	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ									
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	4,75	9051,97	66,01	42997	314	1101	1,35	6	
				195,75	24,93	930	118	105	0,12	1	
11	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	6,94	12670,28	954,99	87932	6628	10245	6,51	4	
				1075,50	330,44	7464	2293	105	1,34		
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,0441	94,00	--	662	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		

		на дополнительные отпуска, 0,4				27 606					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,0441	266,00	--	1874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,0441	310,00	--	2184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,777	65900,00	--	51204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			193184	10422			72
		Накладные расходы -	Тенге			15460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			221163				
		РАЗДЕЛ 11. НАСОСНАЯ II подъема.Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	105,73	27,84	26,18	2943	2767	909	0,01	1
		м3		1,66	7,20	176	761	97	0,03	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,7	262,72	--	8591	--	9708	1,85	60
		м3		262,72	--	8591	--	113	--	--
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ								
6	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	6	10253,58	367,51	61521	2205	3128	2,37	14
		м3		357,75	138,83	2147	833	105	0,68	4
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,09	266,00	--	1620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3	67700,00	--	20310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,53916	65900,00	--	101431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	3	1524,04	--	4572	--	1752	3,10	9
		м3		474,75	--	1424	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			200988	4973			85
		Накладные расходы -	Тенге			15497				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			229474				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7769194				

		Итого с временными	Тенге							
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	Тенге			104 429				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4	Тенге			8 004 194				
						27 606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. оборудование	Тенге			1 091 128				
		Временные здания и сооружения, 2,72 %	Тенге			181 643				
		Итого с временными	Тенге			7 950 837				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	Тенге			48 018				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			27 439				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			68 597				
		Итого с прочими	Тенге			8 094 891				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742..	Тенге			20 702 031				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			414 041				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			21 116 072				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			2 533 929				
		Итого с НДС	Тенге			23 650 000				
		в т.ч. оборудование	Тенге			3 187 835				

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Нурсейтов П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отырабат Құрылыс"

Утешов Р.
