Договор: № 228 от 09.06.2014г.
Наименование строительства: Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибского района города Алматы
Наименование объекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, Тип-1, сквозной, (пятно 19)

АКТ

выполненных работ за апрель 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Общестроительные работы (АР)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки								
1	E0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	181,3455	1332,83	319,70	241703	57976	124220	3,07	557
		м3		461,25	119,25	83646	21625	118	0,58	105
2	C143003-58 прим.	Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x90мм	25025,679	43,00	–	1076104	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	E0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	17,8726065	4486,93	285,43	80193	5101	76355	20,97	375
		1т		3991,50	77,26	71339	1381	105	0,30	5
4	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	15,71661	50900,00	–	799975	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,40299	50600,00	–	20391	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3022425	50800,00	–	15354	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

	[illegible]	[illegible]								
			1,450764	41200,00	–	59771	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
8	E0108-22-11	Заполнение пустот и камних бетоном В-12,5 и раствором М150	33,246675	302,02	106,27	10041	3533	9268	1,22	41
			м3	195,75	40,50	6508	1346	118	0,19	6
9	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	17,4696165	5150,00	–	89969	–	–	–	–
			м3	–	–	–	–	–	–	–
10	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	16,441992	5110,00	–	84019	–	–	–	–
			м3	–	–	–	–	–	–	–
		Перемычки лист 7АР								
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,4525	13010,10	1826,10	31907	4479	30183	42,70	105
			т	8100,00	690,75	19865	1694	140	3,37	8
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13516	52400,00	–	7082	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
13	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,31734	59500,00	–	137882	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
		Угловые узлы								
14	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	4,8832	4486,93	285,43	21911	1394	20862	20,97	102
			1т	3991,50	77,26	19491	377	105	0,30	1
15	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,636	50900,00	–	235972	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–

17	E0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	т	9,2472	50660,00	–	12508	–	–	–	–	–
18	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	20,6	302,02 195,75	106,27 40,50	6222 4032	2189 834	9743 118	1,21 9,19	25 4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м3	21,032	5110,00	–	107371	–	–	–	–	–
			Тенге		–	–	–	–	–	–	–	–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3038376	74672				1204
		Материалы -	Тенге				204881	27258				131
		Всего заработная плата -	Тенге				3038376					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				18668					
		Местные материалы -	Тенге					232139				
		Накладные расходы -	Тенге				1288937					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1451218					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				266631					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге									
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					39995				133
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				198300					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				3503308					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1468
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					272134				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				3503308					
			Тенге									1468
								272134				

РАЗДЕЛ 2.Стены из блока стандартного

19	E0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	91,884	1332,83 461,25	319,70 119,25	122466 42381	29375 10957	62940 118	3,07 0,58	282 53	
20	С143003-58 прим.	Блок стандартный силлитерный размером 390x190x190мм	шт	6006,312	43,00 –	– –	258271 –	– –	– –	– –	– –	
21	E0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	4,323384	4486,93 3991,50	285,43 77,26	19399 17257	1234 334	18470 105	20,97 0,30	91 1	

	[illegible]	[illegible]	т	3,77208	50000,00	--	191999	--	--	--	--
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,116064	50600,00	--	5873	--	--	--	--
24	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,14508	50800,00	--	7370	--	--	--	--
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,29016	41200,00	--	11955	--	--	--	--
26	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	29,016	302,02 195,75	106,27 40,50	8763 5680	3084 1175	8089 118	1,22 0,19	35 6
27	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	м3	9,86544	5150,00	--	50807	--	--	--	--
28	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	19,73088	5110,00	--	100825	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				777727	33693			408
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				65318	12466			60
		Материалы -	Тенге				777727				
		Всего заработная плата -	Тенге				4113				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					77784			
		Местные материалы -	Тенге				217196				
		Накладные расходы -	Тенге				457407				45
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				89499				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч					13425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				52034				

		[illegible]		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			919260				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			919260	91209			513
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							
				Тенге				91209			513
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
		Балконное ограждение									
29	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	т	2,7817	18611,27 13810,50	2191,29 101,25	51771 38417	6095 282	34828 90	80,96 0,49	225 1
30	С12021-237 т.ч. 4.7	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	2,7817	160340,00 –	– –	446018 –	– –	– –	– –	– –
31	Е0111-39-1 прим.	Устройство поручней деревянных	м	140	12,88 12,04	0,46 0,18	1803 1686	64 25	2104 123	0,08 –	11 –
32	С12069-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	м	140	120,00 –	– –	16800 –	– –	– –	– –	– –
33	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ограждения прокатом	м2	168,3	51,82 48,83	2,99 0,97	8721 8218	503 163	7543 90	0,30 –	50 1
34	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,00372	604700,00 –	– –	2249 –	– –	– –	– –	– –
35	С11011-862 прим.	Сталь листовая, толщина 0,8 мм	т	1,111	50200,00 –	– –	55772 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			583135	6663			286
				Тенге			48320	470			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76625				
		Материалы -		Тенге			53				
		Всего заработная плата -		Тенге				1711			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74822				
		Накладные расходы -		Тенге			2104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83453				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				2026			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			506510				
		Материалы -		Тенге			7259				
		Всего заработная плата -		Тенге				47080			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			446018				
		Накладные расходы -		Тенге			42372				

		[illegible]	[illegible]								
		[illegible]	Тенге					6356			
		[illegible]	Тенге				33733				
		[illegible]	Тенге				581815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата -	Тенге					53435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				665268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата -	Тенге					55462			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство выбросных вентшахт на кровле									
36	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из блоков	31,35	1332,83	319,70	41784	10023	21474	3,07	96
		м3		461,25	119,25	14460	3738	118	0,58	18
37	С143003-58 прим.	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х190мм	2049,3	43,00	–	88120	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,4751	4486,93	285,43	6619	421	6302	20,97	31
		1т		3991,50	77,26	5888	114	105	0,30	–
39	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,287	50900,00	–	65508	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0396	50600,00	–	2004	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0495	50800,00	–	2515	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,099	41200,00	–	4079	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	9,9	302,02	106,27	2990	1052	2760	1,22	12
		м3		195,75	40,50	1938	401	118	0,19	2

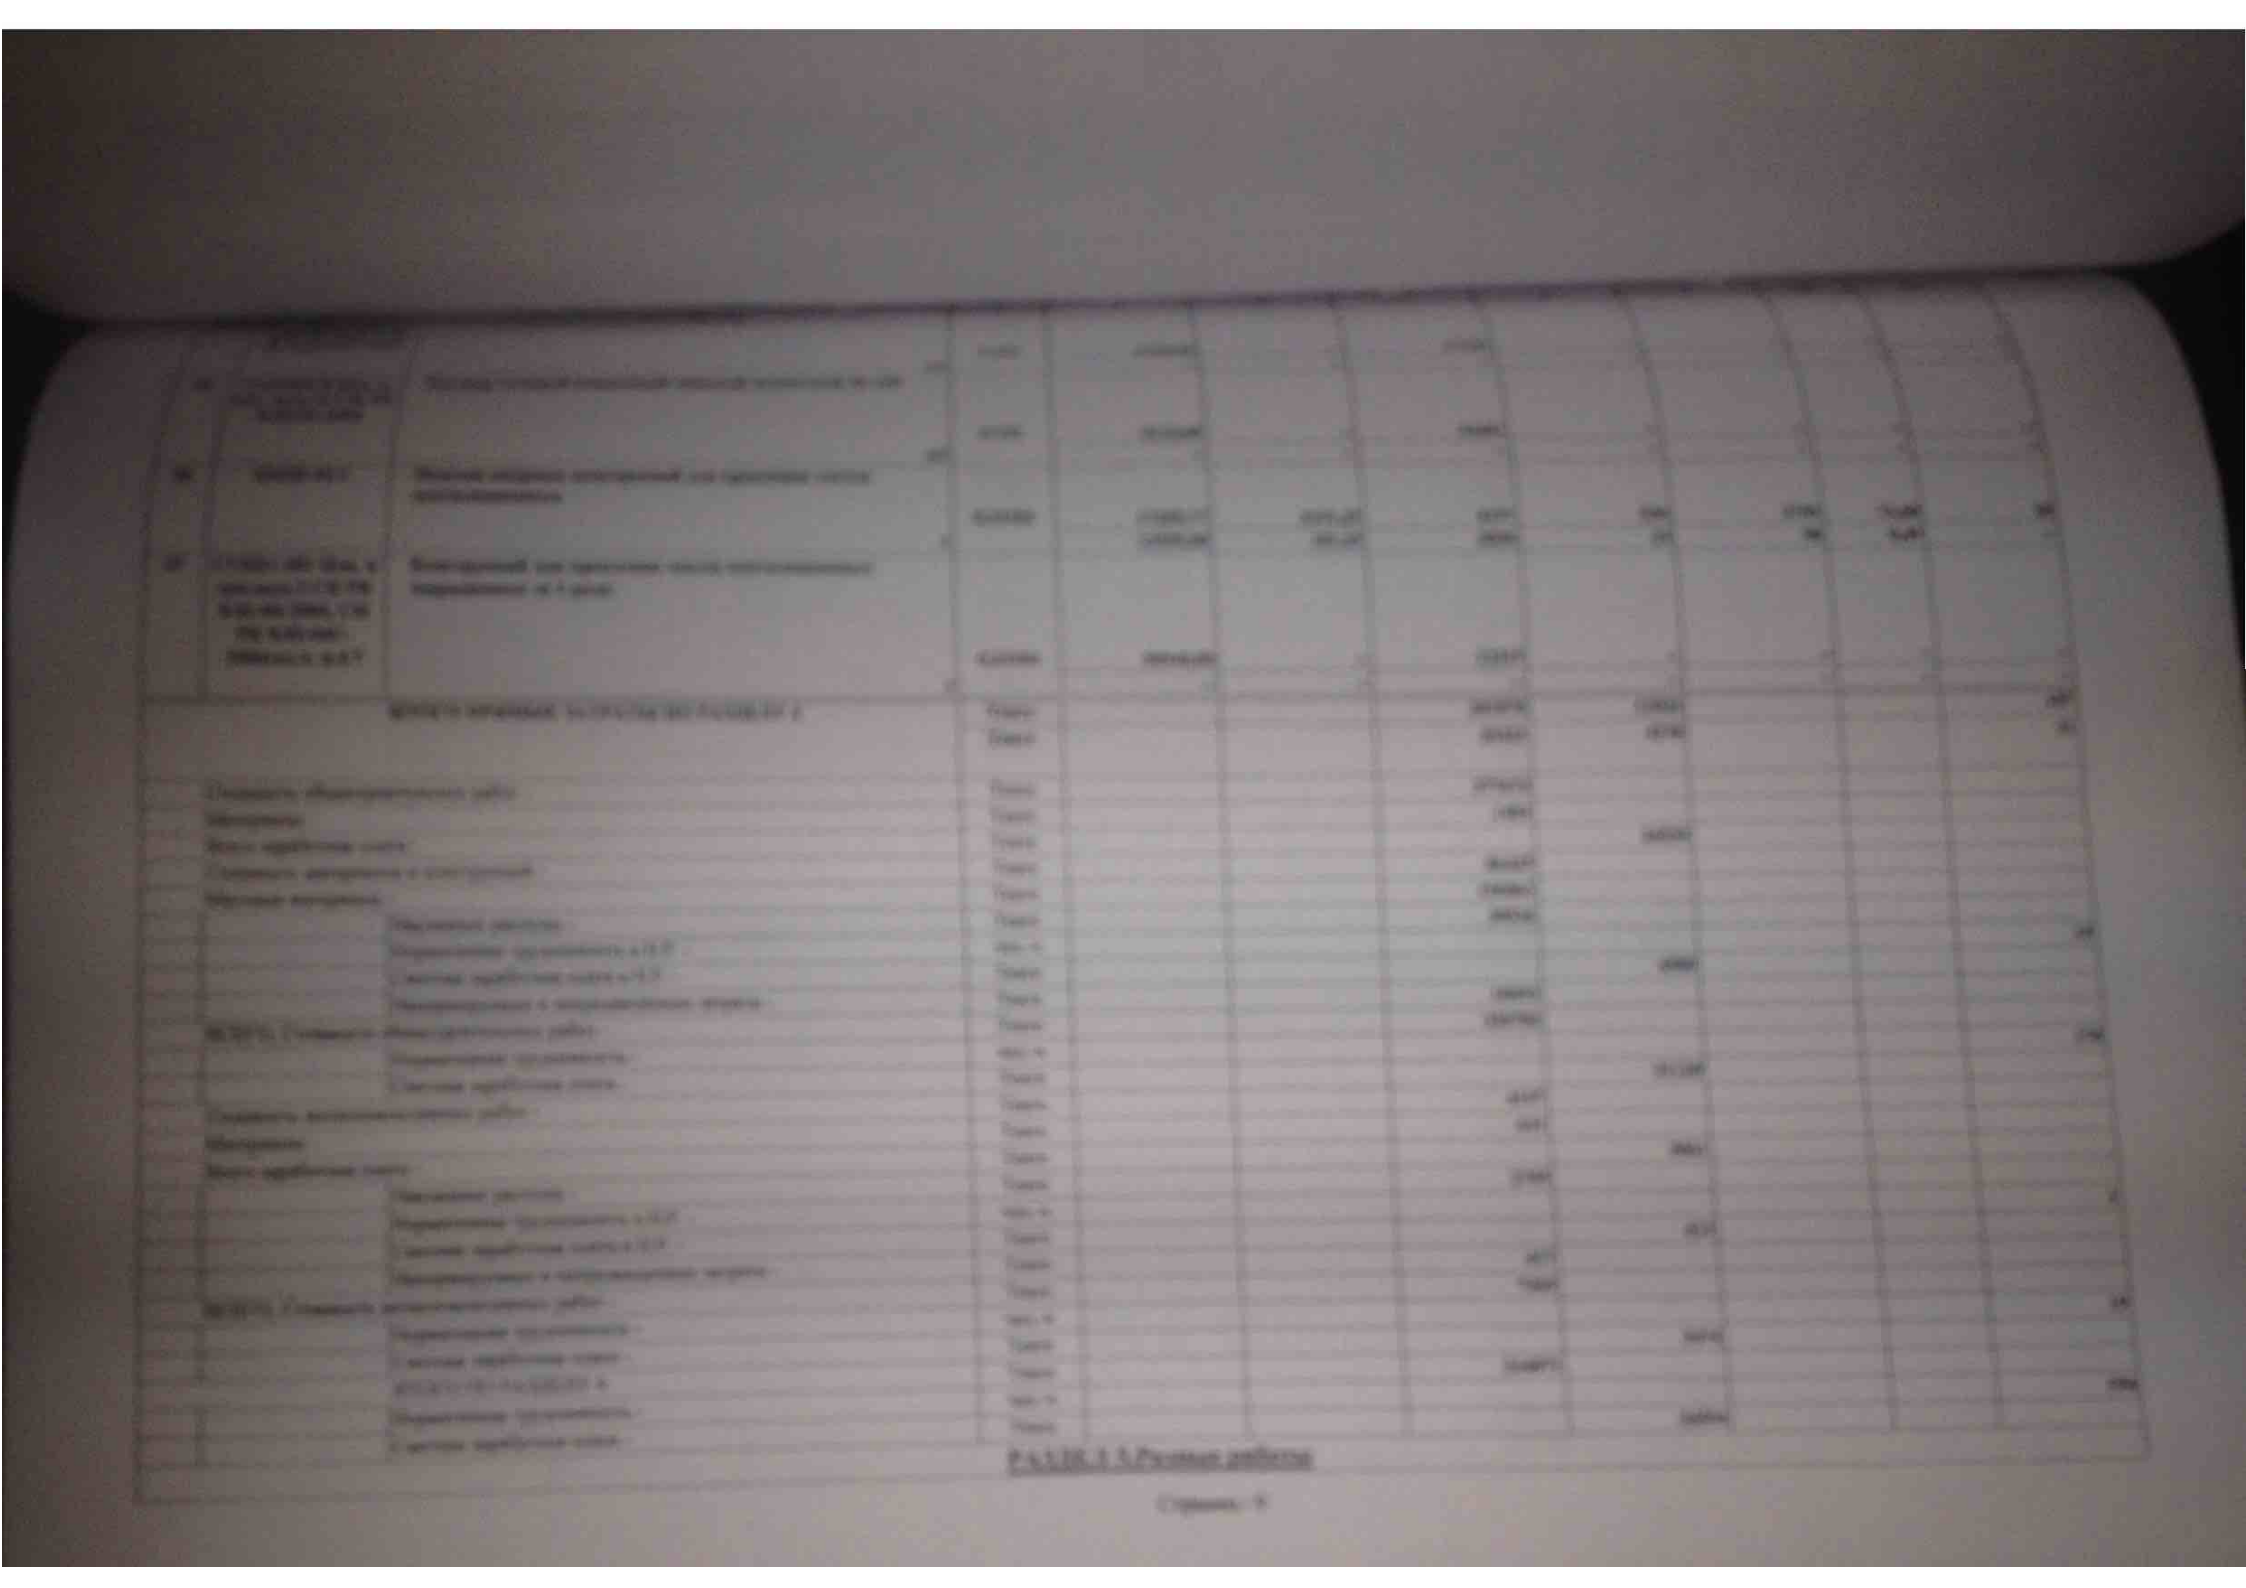

Раздел 3 Ручные работы

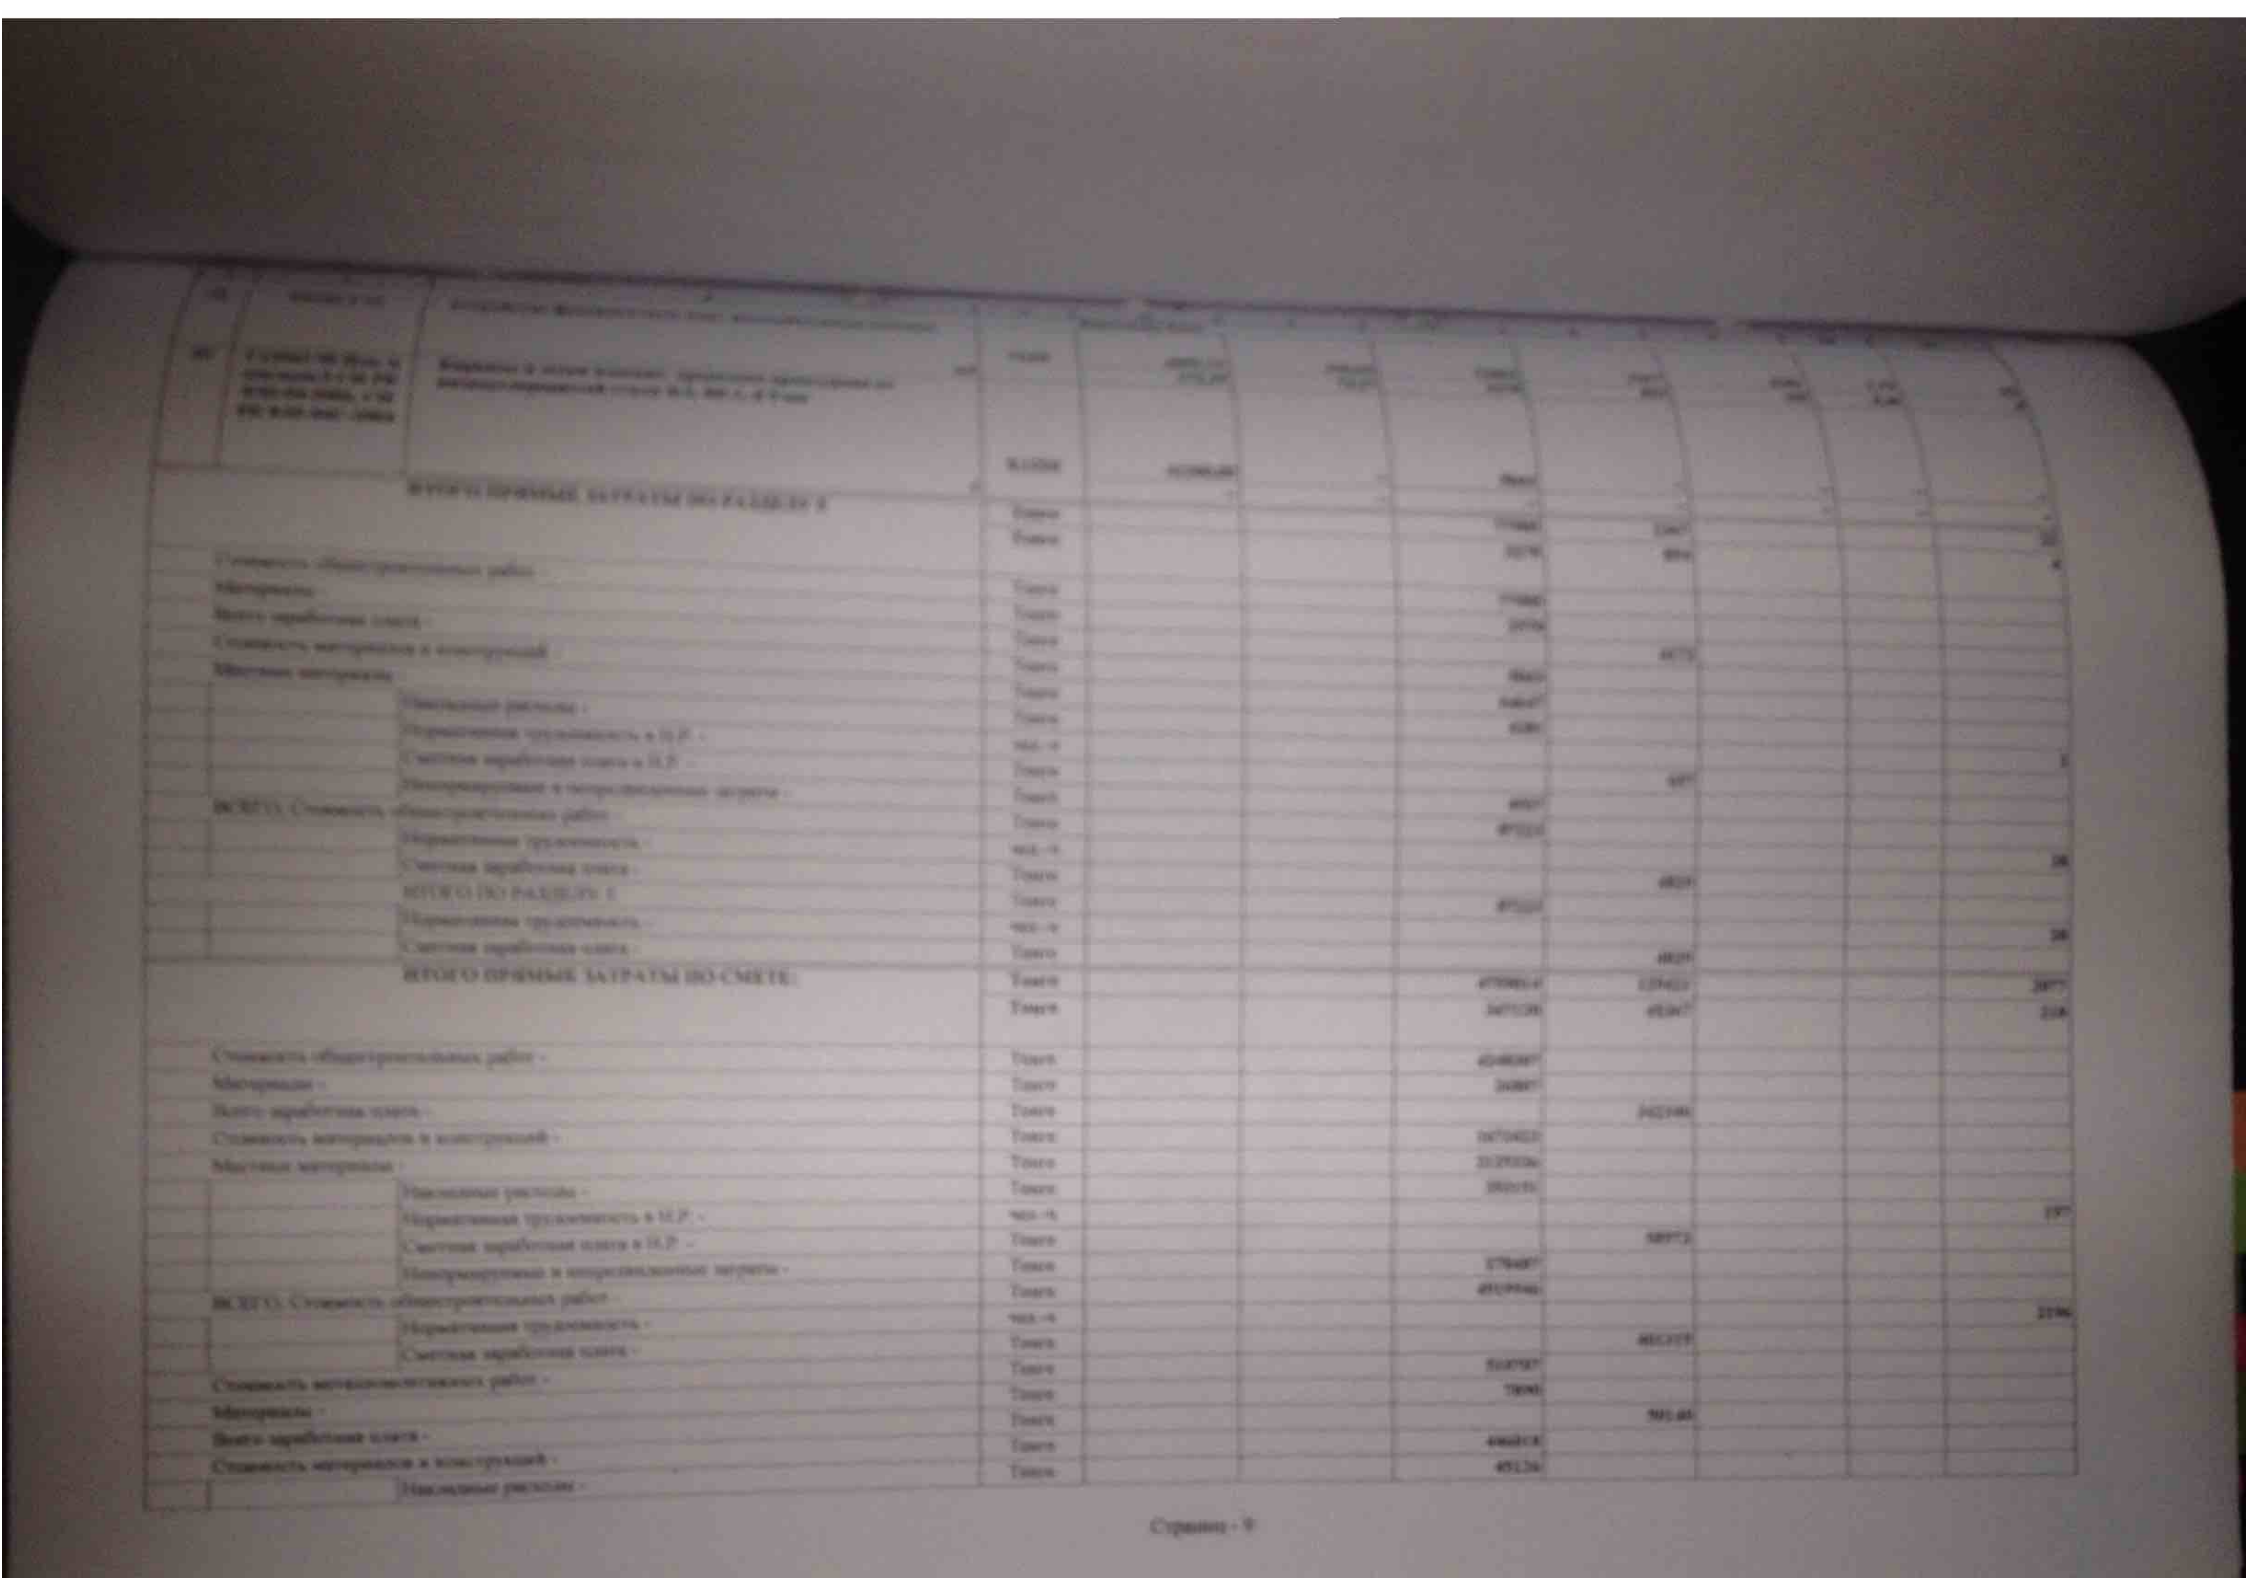

	Нормативная трудоемкость в НДС	чел.-ч								
	Сметная заработная плата в НДС	Тенге								
	Непоправляемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге								
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге								

Итого	5 509 130
Временные здания и сооружения (1,1 %)	60 600
Итого со временными	5 569 730
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	60 153,09
Выслуга лет (1 %)	55 697
Доп. Отпуска (0,4%)	22 279
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 707 860
Итого по акту в текущих ценах 2013 года МРП = 1731 тенге	12 748 781
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	13 003 757
Итого по акту с учетом НДС 12 %	14 564 207

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:

Подрядчик:

АГС-ПЛАСТ
ДЛЯ ФОРМ
№ 2

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЮ
город Алматы Республика Казахстан
