Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" декабрь 2022 года

Заказчик **Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск», руководитель Дуйсенгалиев Жандос Аскатович, БИН 000 340 003 074, тел. 8(7112)50-06-08, город Уральск Аманжолова 69/1**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «28» декабрь **2022 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, БИН 000 340 001 900, тел. 8(7242)21-60-92, город Кызылорда, поселок Тасбугет улица Мустафа Шокая 18**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«28» декабрь 2022 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Консалтинг ЛТД», руководитель Наурыз Ақтілек Ахметұлы, Туйгужина Ержан Елемесовича KZ28VJE00048872 от 22.08.2019г. БИН 090 140 000 871, тел. 8(7112)50-96-70, город Уральск, улица Сарайшык 55**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», Директор Темирбаев Ж.К.; ГИП Абдалиева Г.В., БИН 990 440 005 158, тел. 8(7112)53-51-57, город Уральск, улица Х.Чурина 119Н1,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **« Реконструкция канализационной насоной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г.Уральск, ЗКО », уровень ответственности объекта – I**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **город Уральск, ЗКО**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе

посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **№1576 от "21"июня 2018 года постановление акимата города Уральск Западно-Казахстанской области**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от"___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» № KZ59REA00176929 от 02.06.2020 год

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Уралводпроект» Основной Рабочий проект: заказ 17.049; Корректировка - 22.001**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Заключение госэкспертизы №01-0462/18 от 27.11.2018г г. Астана; корректировка Заключение госэкспертизы №01-0566/22 от 09.11.2022г ___;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«01» июня 2020года** ;

месяц, год

окончание работ **«31» декабря 2022года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **21** месяц;

фактически **21** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Канализация					
Трубопровод из труб «Напорный коллектор» ПЭ100SDR17 800х47,4	м	8 068	8 068	5 604	5 604
Трубопровод из труб «Реконструирумая ветка» ПЭ100SDR17 800х47,4	м	8 037	8 037	8 037	8 037
ПЭ100SDR17 710х42,1	м	78	78	78	78
ПЭ100SDR26 1000х38,2	м	10	10	10	10
Водопровод В1					
ПЭ100SDR21 50х2,4	м	68	68	68	68

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительством предусмотрено строительство канализационной насосной станций; камеры переключения трубопроводов; колодца с отключающей задвижкой; колодца с расходомерами; новое строительство напорного коллектора от КНС19А до приемной камеры КОС труба полиэтиленовая ПЭ100SDR17 800х47,4 - 8,068 км с прямоугольными колодцами; реконструкция напорного трубопровода от КНС до приемной**

камеры городских канализационных очистных сооружений труба полиэтиленовая ПЭ100SDR17 800х47,4 – 8,037км. Площадочные сети В1 труба полиэтиленовая ПЭ100SDR21 50х2,4 – 68м, сети К1, К1Н труба полиэтиленовая ПЭ100SDR17 710х42,1 – 78,0м, труба полиэтиленовая ПЭ100SDR26 1000х38,2-10,0м. Водопроводная сеть запроектирована кольцевой хозяйственно-питьевой-противопожарный. Основанием под трубопроводы служит песок-естественное основание. Соединение труб на сварке, в местах соединения в колодцах-фланцевые, с помощью сварной полиэтиленовой втулкой на конце трубы с отформованным заводским буртиком под свободный фланец и стальных фланцев, стягиваемых болтами. Фасонные части в колодцах приняты из стальных труб с усиленной гидроизоляцией.

Водопроводные и канализационные колодца из сборных железобетонных конструкции по ТП 901-9-11.84

Мощность КНС19А – 35 851 м3/сутки, расчетный максимально-часовой расход Q=2176м3/час. Наземная часть – одноэтажное из красного кирпича с размерами по осям 12,0х15,0 м и высотой 6,0м до перекрытия, подземная часть-железобетонный колодец диаметром 16,0м заглубленный на 7,6м. Технологическое оборудования: погружной насос, горизонтальной сухой установки FLUGT с охлаждающей рубашкой, включая 10м кабеля и многоразового датчика утечки FLS, CZ 3240/SA 8-222, Q=717,4м³/час, Н=69,4м, N=215,0 кВт – 5штук (3 рабочих, 2 резервных), насос для подачи воды на технические нужды Q=5 м³/час, Н=17,2м, N=0,75 кВт, LOWARA 15SV07F0074T– 2штук (1 рабочих, 1 резервный), насос для откачки дренажных вод Q=15 м³/час, Н=8,0м, N=0,897 кВт, LOWARA DIWA– 2штук (1 рабочих, 1 резервный), механическая решетка грабельная с электроприводом Q=2176м3/час, N=0,75 кВт, РКЭ 1418 – 2штуки (1 рабочая, 1 резервная), конвейер винтовой с мотор-редуктором, N=1,5 кВт, КВЭ 2,5/5,9 190 – 1штук, пресс винтовой отжимной с мотор-редуктором, N=3,0 кВт, ПВОЭ 2007 – 1штук, щитовые затворы ЗЩ-Б-800х1200 – 2штук.

По периметру участка КНС выполнено металлическое ограждение, озеленение и благоустройство площадки.

Внешнее электроснабжение: кабельные линии ВЛ 0,4 кВ – 82,0м, КЛ-0,4кВ-398,0м, светильники – 10шт, дизельный генератор АД-800-2РНМ400 – 1шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **2 937 292, 53459** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 098 042, 10459** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **839 250, 430** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 937 292, 53459** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **2 098 042, 10459** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **839 250, 430** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Реконструкция канализационной насоной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г.Уральск, ЗКО»,**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Дуйсенгалиев Жандос Аскатович.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Туйгужин Ержан Елемесович KZ28VJE00048872 от 33.08.2019г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО «Уралводпроект»**

Темирбаев Жумабай Кайсенович. Гос. лицензия

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____ **ГИП Абдалиева Гулмира Валерьевна**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	68,0	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб d-50	м	68,0	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d- 50	шт	1	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		

	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность) К1Н	м	13 719	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)из полиэтиленовых труб d-800	м	13 641	
	7) из полиэтиленовых труб d-700	м	78	
2	Канализационная сеть К1 (общая протяженность)	м	10	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб d-1000	м	10	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	25	
	Выпуск	шт	1	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

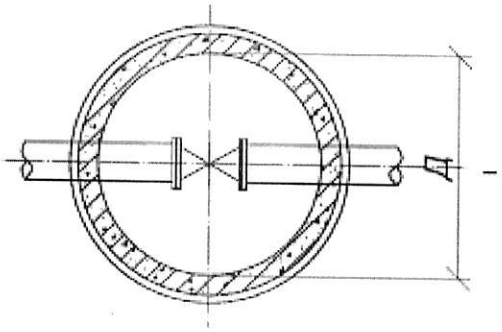

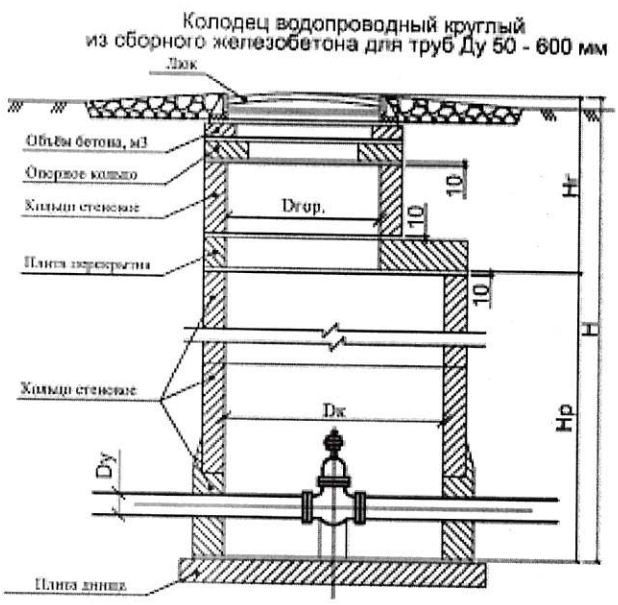

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Колодец смотровой	К1Н	Сборные ж/б конструкции	Ø2000мм	7	
2	Камера 12К	К1	монолитный	2500х2000мм	1	
3	Камера 10К	К1Н	Сборные ж/б конструкции	5200х5800мм	1	

4	Камеры 1; 1а; 10; 13; 15; 5; 15-15а; 17	К1Н	Сборные ж/б конструкции	3000х2400мм	8	
5	Камеры 2; 9; 11; 14; 16	К1Н	Сборные ж/б конструкции	3300х2700мм	5	
6	Камеры 4; 12	К1Н	Сборные ж/б конструкции	2100х2400мм	2	
7	Камера3	К1Н	Сборные ж/б конструкции	2900х2900мм	1	

Заказчик _____ **Ликеров ТемирланАскарович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **АбдалиеваГулмира Валерьевна**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Нарбаева Еркебулан Еликбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **« Реконструкция канализационной насоной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г.Уральск, ЗКО »,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является является **Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск», руководитель Дуйсенгалиев Жандос Аскатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «Технологиялық көмек құрылыс», ГСЛ 21024546 от 18.08.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Есенов Марат Жуманалиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», заказ 17.049**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Канализация					
Трубопровод из труб «Напорный коллектор» ПЭ100SDR17 800х47,4	м	8 068	8 068	5 604	5 604
Трубопровод из труб «Реконструирумая ветка» ПЭ100SDR17 800х47,4	м	8 037	8 037	8 037	8 037
ПЭ100SDR17 710х42,1	м	78	78	78	78
ПЭ100SDR26 1000х38,2	м	10	10	10	10
Водопровод В1					
ПЭ100SDR21 50х2,4	м	68	68	68	68

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительством предусмотрено строительство канализационной насосной станций; камеры переключения трубопроводов; колодца с отключающей задвижкой; колодца с расходомерами; новое строительство напорного коллектора от КНС19А до приемной камеры КОС труба полиэтиленовая ПЭ100SDR17 800х47,4 - 8,068 км с прямоугольными колодцами; реконструкция напорного трубопровода от КНС до приемной камеры городских канализационных очистных сооружений труба полиэтиленовая ПЭ100SDR17 800х47,4 – 8,037км. Площадочные сети В1 труба полиэтиленовая ПЭ100SDR21 50х2,4 – 68м, сети К1, К1Н труба полиэтиленовая ПЭ100SDR17 710х42,1 – 78,0м, труба полиэтиленовая ПЭ100SDR26 1000х38,2-10,0м. Водопроводная сеть запроектирована кольцевой хозяйственно-питьевой-противопожарный. Основанием под трубопроводы служит песок-естественное**

основание. Соединение труб на сварке, в местах соединения в колодцах-фланцевые, с помощью сварной полиэтиленовой втулкой на конце трубы с отформованным заводским буртиком под свободный фланец и стальных фланцев, стягиваемых болтами. Фасонные части в колодцах приняты из стальных труб с усиленной гидроизоляцией.

Водопроводные и канализационные колодца из сборных железобетонных конструкции по ТП 901-9-11.84

Мощность КНС19А – 35 851 м3/сутки, расчетный максимально-часовой расход Q=2176м3/час. Наземная часть – одноэтажное из красного кирпича с размерами по осям 12,0х15,0 м и высотой 6,0м до перекрытия, подземная часть-железобетонный колодец диаметром 16,0м заглубленный на 7,6м. Технологическое оборудования: погружной насос, горизонтальной сухой установки FLUGT с охлаждающей рубашкой, включая 10м кабеля и многоразового датчика утечки FLS, CZ 3240/SA 8-222, Q=717,4м³/час, H=69,4м, N=215,0 кВт – 5штук (3 рабочих, 2 резервных), насос для подачи воды на технические нужды Q=5 м³/час, H=17,2м, N=0,75 кВт, LOWARA 15SV07F0074T– 2штук (1 рабочих, 1 резервный), насос для откачки дренажных вод Q=15 м³/час, H=8,0м, N=0,897 кВт, LOWARA DIWA– 2штук (1 рабочих, 1 резервный), механическая решетка грабельная с электроприводом Q=2176м3/час, N=0,75 кВт, РКЭ 1418 – 2штуки (1 рабочая, 1 резервная), конвейер винтовой с мотор-редуктором, N=1,5 кВт, КВЭ 2,5/5,9 190 – 1штук, пресс винтовой отжимной с мотор-редуктором, N=3,0 кВт, ПВОЭ 2007 – 1штук, щитовые затворы ЗЩ-Б-800х1200 – 2штук.

По периметру участка КНС выполнено металлическое ограждение, озеленение и благоустройство площадки.

Внешнее электроснабжение: кабельные линии ВЛ 0,4 кВ – 82,0м, КЛ-0,4кВ-398,0м, светильники – 10шт, дизельный генератор АД-800-2РНМ400 – 1шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«02» июня 2020года** ;

месяц, год

окончание работ **«31» декабря 2022года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **21** месяц;
фактически **21** месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "Батыс Су Арнасы" Аркенов А
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **« Реконструкция канализационной насоной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г.Уральск, ЗКО »** ,

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор **Нарбаев Еркебулан Еликбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"28" декабря 2022 года

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», директор Темирбаев Жумабай Кабесович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

В лице **ГИП, рук. авторского надзора Абдалиева Гулмира Валерьевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего

на основании №122/д-иои от 05.06.2020г; доп.согл. №4 от 12.12.2022г от

№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г.Уральск, ЗКО. Корректировка» в г. Уральск, ЗКО**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск», руководитель Дуйсенгалиев Жандос Аскатович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **генерального директора Нарбаева Еркебулан Еликбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «Технологиялық көмек құрылыс», ГСЛ 21024546 от 18.08.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Есенов Марат Жуманалиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«01» июня 2020года** ;

месяц, год

окончание работ **«31» декабря 2022года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **21** месяц;

фактически **21** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Уралводпроект», Основной РП заказ 17.049; Корректировка - 22.001

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск», Заключение госэкспертизы №01-0462/18 от 27.11.2018г г. Астана; корректировка Заключение госэкспертизы №01-0566/22 от 09.11.2022г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор: организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект» директор -Темирбаев Ж.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП, **Рук. Авторского надзора ТОО Уралводпроект» Абдалиева Г.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата _____ Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28" декабря 2022 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Консалтинг ЛТД», руководитель НаурызАқтілек Ахметұлы**

наименованиеорганизации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **ТуйгужинаЕржанЕлемесовичаKZ28VJE00048872 от 33.08.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании**№115/д-ок от 16.07.2019г.**

№ договора и дата

по объекту:**« Реконструкция канализационной насоной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г.Уральск, ЗКО »,**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является

Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск», руководитель ДуйсенгалиевЖандосАскатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **генерального директора НарбаеваЕркебуланЕликбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями**Товарищество с ограниченной ответственностью «Технологиялық көмек құрылыс», ГСЛ 21024546 от 18.08.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Есенов Марат Жуманалиевича** фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ**«01»июня 2020года**;

месяц, год

окончание работ **«31»декабря 2022года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства**21** месяц;

фактически**21**месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **2 937 292,53459** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ**2 098 042,10459**тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря**839 250, 430**тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 937 292,53459**тысячтенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ**2 098 042, 10459**тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **839 250, 430** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)**Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», заказ 17.049** наименование проектной организации, номер проекта утвержденным(ой) **Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры,градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежностьна протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) исоответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечениеинтересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация**Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Консалтинг ЛТД», руководитель НаурызАқтілек Ахметұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору**Туйгужина Ержан Елемесовича KZ28VJE00048872 от 33.08.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании**№115/д-ок от 16.07.2019г.**

№ договора и дата

Место печати (при наличии)
