Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

2023 жылғы «31» шілде
«31» июля 2023 года

Тапсырыс беруші / Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» в лице Руководителя Нурашева Санара Сейлхановича, 040800, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:
Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) / Декларации о соответствии (прилагается) **« » 2023 года, ТОО «АЛАУ» в лице директора Найзабекова Галымтай Ибраевича, Область Абай, Аягозский район, с.Баршатас,ул.Балга,40**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) / Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **« » 2023 года, ТОО«МАСТЕР Металл Пласт», в лице директора Женсикбаева Асет Сериковича, Актюбинская область,г.Актобе,проспект Санкибай батыра,173,1**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

в лице, экспертов:
эксперт Бектаева Галыма Алтыналиевча аттестат **№ KZ33VJE00049073 от 03.09.2019г** по объектам второго и третьего уровней ответственности — в части несущих и ограждающих конструкций **№ KZ60VJE00049072 от 03.09.2019** По объектам второго и третьего уровней ответственности — в части инженерных сетей**;** аттестат **№ KZ88VJE00060208 от 09.12.2020г.** 3. По объектам второго и третьего уровней ответственности — в части технологического оборудования;

техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/ фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) / Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **« » 2023 года ТОО«Геодезия сервис», в лице руководителя Приходько О.Д**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
в лице эксперта-авторского надзора – инженер Хациев И.В, на ведение авторского, приказ №20 от 11.04.2022г., на ведение авторского надзора

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған / произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.А.Нусипбекова (Киши-Жаланаш) Кегенского района Алматинской области"**, уровень ответственности сооружения - II (нормальный), не относящиеся к технически и технологической сложности

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды /наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

мекенжайы бойынша / по адресу: **Республика Казахстан, с.А.Нусипбекова (КишиЖаланаш) Кегенского района Алматинской области**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды / проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Объектінің құрылысы / Строительство объекта осуществлено на основании:

1) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе / решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от акт №005931 на право постоянного землепользования на земельный участок, площадью 0,3000 га, с целевым назначением – для обслуживания объекта – врачебная амбулатория (кадастровый номер 03-323-102-917

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі / либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

шешім шығарған органның атауы / наименование органа вынесшего решение

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ**

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» вх.регистрационный номер уведомления :KZ06REA00283516 от 01.07.2022г

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні / наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО "Геодезия сервис " лицензия №17021363 от 20.12.2019 года, прошедшая государственную экспертизу за № ЭЦЛИС-0094/21 от 11.06.2021г**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/ наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым / утвержденного(й); **ГУ «Управление строительства Алматинской области», приказ № 77нқ от 26.06.2021г.**

бекіткен (кайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстардың басталуы/начало работ: **июль 2022 г.**
айы, жылы/месяц, год
жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **июль 2023 г.**
айы, жылы/месяц, год
құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть)**;
нақты, ай/фактически, месяц: 12 (двенадцать);

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,30		0,30	
Площадь застройки	М2	1078,61		1078,61	
Площадь дорожного покрытия	М2	1134,06		1134,06	
Площадь озеленения	М2	1134,06		1134,06	
Этажность	эт	1		1	

Площадь застройки	М2	940,11		940,11	
Общая площадь	М2	781,70		781,70	
Строительный объем	М3	4002,64		4002,64	
Общий расход тепла	кВт	61,06		61,06	
Блочно модульная котельная бмк	здание	1		1	
КТПН-160/10/0,4кВ	компл	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады / Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические решения

Здание врачебной амбулатории одноэтажное и предназначено для оказания квалифицированной помощи больным проектируемого района с численностью ориентировочно -3357 человек.

Врачебная амбулатория запроектирована на 30 посещений в смену и включает взрослое и детское отделения.

Технологическая часть проекта выполнена в соответствии с действующими на

территории РК строительными и санитарными нормами и заданием на проектирование.
В состав взрослого отделения ВА входят: кабинеты доврачебного приёма, кабинеты врача общей практики, физио кабинет и административно-бытовые помещения. При вестибюле предусмотрена регистратура, гардероб для верхней одежды посетителей. Для забора мокроты и кабинет приёма больных с подозрением на туберкулёз, предусмотрен изолировано от помещений ВА.

В состав детского отделения входят: кабинеты педиатра, процедурная, прививочный кабине, фильтр боксы, для детского отделения предусмотрен отдельный вход с гардеробом. Кабинет стоматолога общий для двух отделений и посещение обеспечено в определенное время.

Общеклиническая лаборатория включает стерилизационные помещения.

Физиокабинет предусмотрен на 1 кушетку с помещением обработки прокладок.

В состав административно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, помещения персонала с сан.узлами, бельевую, помещения уборочного инвентаря.

Количество работающих в ВА составляет 10 человек.

Помещения ВА оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью в соответствии с приказом Минздрава, каждый кабинет врача оснащён персональным компьютером и офисной и медицинской мебелью.

Архитектурные решения

Здание амбулатории

Врачебная амбулатория на 30 посещений предназначена для оказания квалифицированной медицинской помощи участку, с численностью населения: взрослых 2703 человек, 654 детей. Набор функциональных подразделений амбулатории, их оснащение в целом, отвечают требованиям, предъявляемым к сельским врачебным амбулаториям.

Одноэтажное, прямоугольное в плане здание, состоит из двух, сблокированных между собой павильонов, имеющих размеры:

Павильон первый - 37,5х12,90 м;

Павильон второй - 24,6х10,00 м;

Высота помещений - 3.3м.

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.

Набор помещений принят согласно штатному расписанию. В здании врачебной амбулатории расположены: вестибюль, регистратура, комната охраны, кабинет врача общей практики, кабинет терапевта, гинеколога, стоматолога, хирурга и невропатолога. Также, предусмотрено отдельно выделенное отделение приема больных туберкулезом и дневной стационар. прививочная, детское отделение с фильтрами-боксами для детей, изолятор, физио-кабинет с процедурными, помещение для взятия проб крови, общеклиническая лаборатория. кабинет доврачебного приема.

Хранение дезинфицирующих средств и стерилизации материалов осуществляется в отдельных помещениях. Стирка грязного белья, сушки и глажки, белья осуществляется в прачечной.

Для доступности в здания ММГН предусмотрен пандус с ограждением снаружи здания.

Окна приняты металлопластиковые, с одинарным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.

Наружные стены из обыкновенного красного кирпича, толщ. 380мм., с утеплением, согласно теплотехническому расчету.

Внутренние стены и перегородки - из обыкновенного красного кирпича, толщиной 380мм и 120 мм соответственно. Так же запроектированы пластиковые ГОСТ 30674-99, алюминиевые ГОСТ 21519-84 остекленные перегородки из ПВХ.

Доски подоконные - пластиковые по ГОСТ 30673-2013.

Двери деревянные - внутренние по ГОСТ 6629-88, наружные из одинарного

стеклопакета в алюминиевой обвязке.

Кровля – четырехскатная, покрытие из металлочерепицы по деревянной конструкции__
Внутренняя отделка помещений предусмотрена в соответствии с их функциональным назначением помещений. Отделка стен и полов выполняется отделочными материалами согласно нормативам СП РК и СН РК. Типы и виды материалов для внутренней отделки помещений врачебной амбулатории используются согласно санитарно- гигиеническим и противопожарным требованиям.
Полы площадок у главного входа устраивается из керамических антискользящих плиток по бетонному основанию.
По периметру здания устраивается бетонная отмостка на щебеночном основании, толщиной 100мм, шириной 1,5м с уклоном 3%..
Котельная
Здание блочно-модульное, заводского изготовления. одноэтажное, без подвала. с размерами в осях 10.0 х 3м. Высота помещения 4.0 м. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
Котельная работает на жидком топливе.
В котельной расположены котельный зал, комната оператора
Полы – бетонные.
Уровень ответственности здания – II (технически и технологически несложный объект).
Степень огнестойкости –II.
Степень долговечности - II.
Класс конструктивной пожарной опасности – С1.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.
Класс сооружения КС2
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған; / Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметаалық құны / Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Барлығы/всего **451192,0** мың теңге/тысяч тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары/ в том числе строительно-монтажных работ **303410,928** мың теңге/ тысяч тенге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар/ оборудования, инструмента и инвентаря **69 310,991** мың теңге/тысяч тенге; басқа шығындар/прочих затрат **78470,0**мың теңге/тысяч тенге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны / Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **414 188 280** теңге02тиын/ тенге02 тиын, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары/ в том числе строительно-монтажных работ **396 699763** теңге94тиын/ тенге94тиын, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар/оборудования, инструмента и инвентаря **69310,991** мың теңге/тысяч тенге; басқа шығындар/прочих затрат **17488516** теңге08тиын/ тенге 08тиын;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада _____ қарастырылған және іс жүзінде _____ орындалды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілер бойынша). / Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Ғимараттың энергия тиімділік класы **высокий** / Класс энергоэффективности здания **высокий**

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды / Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: **«Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.А.Нусипбекова (Киши-Жаланаш) Кегенского района Алматинской области»** ***ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ***

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Нурашев Сапар Сейлханович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, _____ М.П. дата 21 июня 2023г.

Генеральный подрядчик:
Найзабеков Галымтай Ибраевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, _____ М.П. дата 21 июня 2023г.

Технический надзор:
Директор Женсикбаев Асет Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, _____ М.П. дата 21 июня 2023г.

эксперт технического надзора
Бектаев Галым Алтыналиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, _____ М.П. дата 21 июня 2023г.

Авторский надзор:
Руководитель Приходько Ольга Дмитриевна.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, _____ М.П. дата 21 июня 2023г.

эксперт авторского надзора
Хациев Игорь Валерьевич подпись, _____ дата 21 июня 2023г.

Приложение 1 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

ехнические характеристики объекта (индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

аименование ндивидуальный илой дом (холодная ристройка, гараж, аня, летняя кухня, арай и т.п.), дачи, аражи	Единицаизмерения	Общиесведения					
		количествоэтажей (этаж)	площадьзастройки (м2)	объемздания (м3)	количествожилыхкомнат	общаяплощадь (м2)	жилаяплощадь (м2)
	2	3	4	5	6	7	8
рачебная мбулатория		1	1078,61	4002,64	0	781,70	0

Продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Видотопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячеводоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
монолитный железобетон	Керамический кирпич	Деревянные конструкции,металлочерепица	Дизельное топливо	КТПН-160/10/0,4кВ	Централизованное сельское	бойлер	септик	о

Планстроения

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Тамбур	5.02
2	Вестибюль с местом для самозаписи	30.79
3	Регистратура	12.6
4	Комната охраны	8.37
5	Кабинет врача общей практики	10.92
6	Санузел для МГН	4.06
7	Кабинет терапевта	12.95
8	Помещение для хранения дезинфицирующих средств	8.04
9	Помещение для грязного белья	8.6
10	Помещение приема и стирки белья	5.79
11	Помещение сушки и глажки	6.5
12	Бельевая	6.5
13	Комната сбора биоматериалов	4.28
14	Коридор	4.32
15	Коридор	13.25
16, 16*	Санузел для посетителей (1.66*1.55)	3.21
17	Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов	8.38
18	Тамбур-шлюз	7.84
19	Комната для забора мокроты	6.55
20	Комната для временного хранения мед.отходов	4.25
21	Складское помещение	10.63
22	Комната завхоза	11.09
23	Кабинет доврачебного приема	13.28
24	Гардеробная для посетителей	12.45
25	Медицинский архив	7.28
26	Коридор	9.3
27	Коридор	16.82
27*	Электрощитовая	4.14
28, 28*	Санузел для посетителей (1.50*1.62)	3.12
29	Помещение уборочного инвентаря	5.56
30	Коридор	4.89
31	Процедурная	14.15

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помещения
32	Фильтр-бокс для приема детей	10.58	
33,33*	Сан.узел (1.50+1.50)	3	
34	Фильтр-бокс для приема детей	10.54	
35	Тамбур-шлюз	10.81	
36	Тамбур	3.58	
37	Гардеробная детского отделения	4.33	
38	Картотека	10.27	
39	Прививочная	10.04	
40	Кабинет врача-педиатра	12.25	
41	Коридор-анхидальная	31.39	
42,42*	Сан.узел для посетителей (1.93+1.92)	3.85	
43	Помещение для стерилизации материалов	8.07	
44	Кабинет стоматолога-терапевта	14.07	
45	Коридор	23	
46	Сан.узел для персонала	3.82	
47	Комната персонала с гардеробной	10.91	
48	Зона ожидания	35.54	
49	Процедурная с гинекологическим креслом	12.56	
50	Смотровой кабинет	10.24	
51	Изолятор	8.96	
52	Тамбур-шлюз	4.31	
53,53*	Сан.узел (1.92+2.04)	3.96	
54	Физиокабинет	10.09	
55	Помещение для взятия проб крови	9.05	
56	Общеклиническая лаборатория	11	
57	Комната сестры-хозяйки	8.7	

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат.* помещения
58	Комната разогрева и приема пищи	11.34	
59,59*	Сан.узел (2.52+2.52)	5.04	
60	Палата на 4 койко-места (Дневной стационар)	24.36	
61	Тепловой пункт	10.81	
62	Кабинет мед.сестры дневного стационара	10.22	
63	Процедурная	12.34	
64	Моечная	8.16	
65	Стерилизационная	14.14	
66	Кабинет главного врача	11.1	
67	Приемная главного врача	6.35	
68	Помещение уборочного инвентаря	4.47	
69	Коридор	30.02	
	Итого:	716.2	

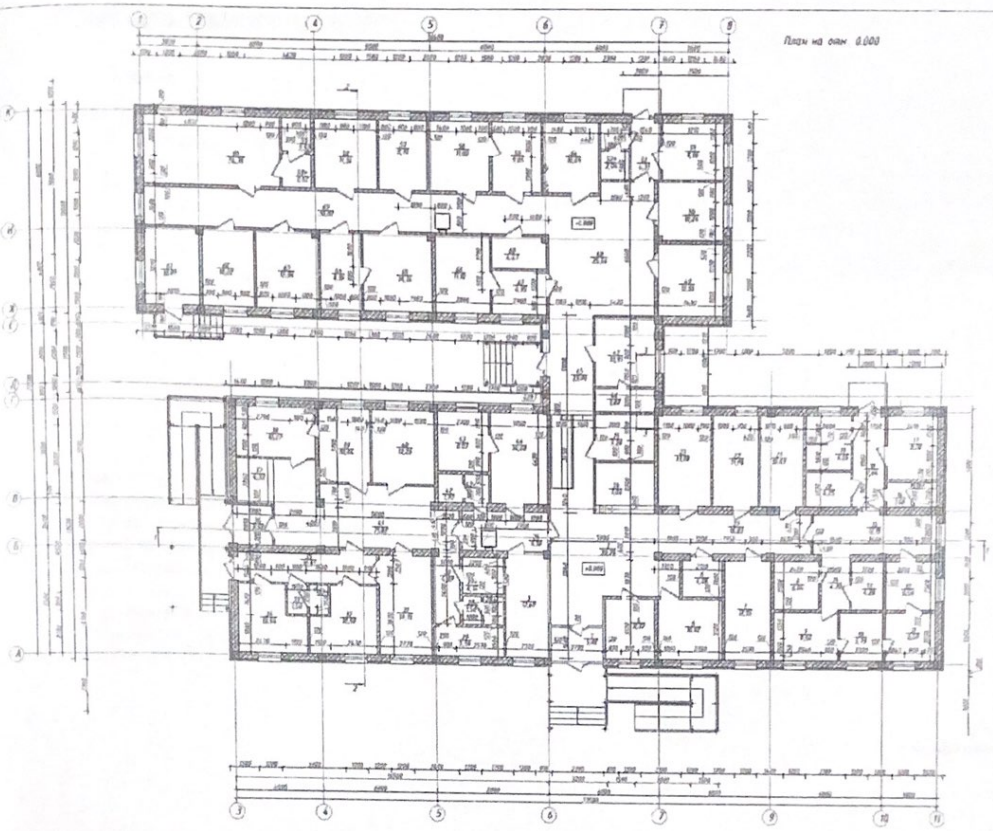

Масштаб _____

Экспликация земельного участка

Общаяплощадь (м2)	В томчисле (м2)					
	застроен- ная	дворовоепокрытие			декоративныйсад	огород
		тротуары	отмостки	грунт		
1	2	3	4	5	6	7
	1078,61	1134,06	172		120	0

План земельного участка

№ 005931

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: **03-323-102-917**
Жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығы
Жер учаскесінің алаңы: **0.3000 га**
Жердің санаты: **Елді мекендердің жерлері (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер)**
Жер учаскесін пысаналы тағайындау:
дәрігерлік амбулатория - пысаныша қызмет көрсету үшін
Жер учаскесін пайдалануғы шектеулер мен ауыртпалықтар: **жоқ**
Жер учаскесінің бөлінуі: **бөлінбейді**

№ 005931

Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ
ПЛАН земельного участка

Учаскенің мекенжайы, мекенжайының пірсу коды (од бар болған кезде): **Алматы облысы, Кеген ауданы, Қарабұлақ ауылдық округі, А. Нүсіпбеков ауылы, Б. Матаев көшесі, 14 жер телімі**
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка:
Алматинская область, Кегенский район, Карабулакский сельский округ, село А. Нусипбекова, улица Б. Матаева, земельный участок 14



Кадастровый номер земельного участка: **03-323-102-917**
Право постоянного землепользования на земельный участок
Площадь земельного участка: **0.3000 га**
Категория земель: **Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)**
Целевое назначение земельного участка:
для обслуживание объекта - врачебная амбулатория
Ограничения в использовании и обременения земельного участка: **нет**
Делимость земельного участка: **неделимый**

Масштаб _1:1000_____

Заказчик
Руководитель управления строительства
С Нурашев 31.07.2023г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Геодезия сервис" Приходько О.Д
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта 31.07.2023г.
Место печати (при наличии)

ГУ «Управления строительства Алматинской области»

Руководитель управления _____ С.Нурашев

Прошнуровано, пронумировано 7 листов
