План контейнера

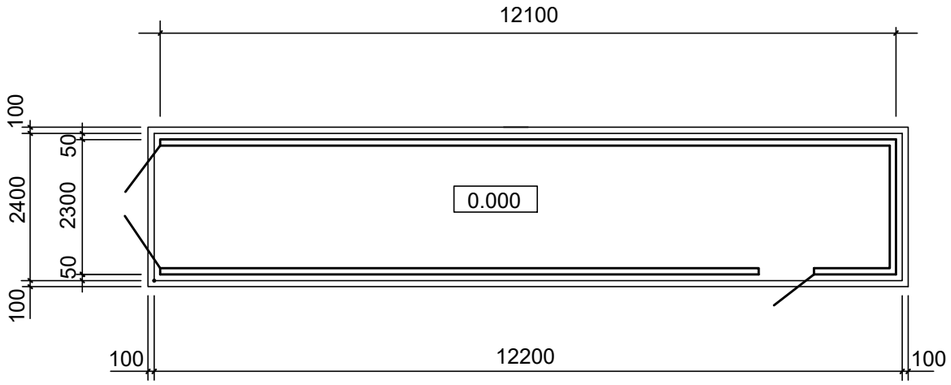

Схема раскладки фундаментных блоков

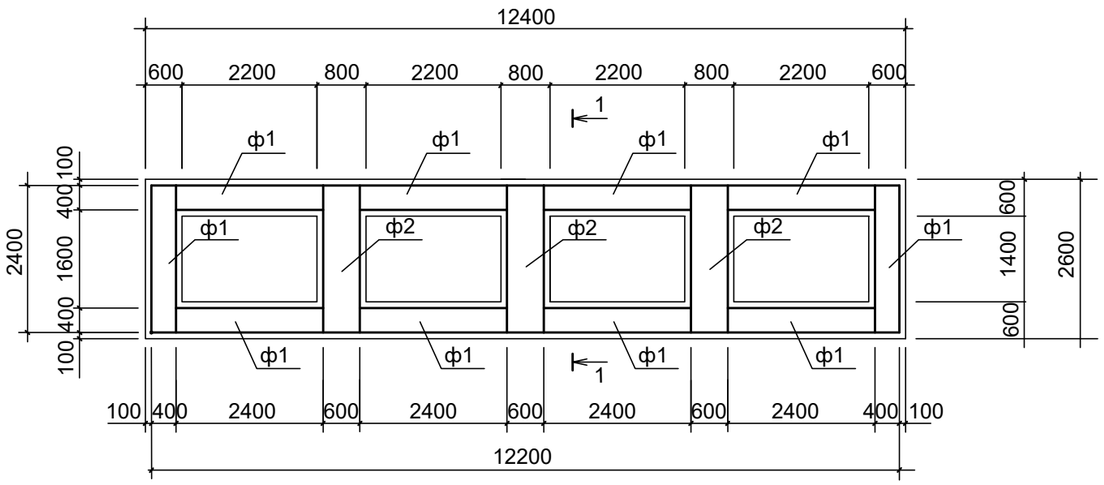

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес. ед. кг.	Примечание
		Ленточный фундамент под контейнер			
		Фундаментный блок			
Ф1	ГОСТ 13579-78*	ФБС24.4.6-Т	10	1300	
Ф2	ГОСТ 13579-78*	ФБС24.6.6-Т	3	1960	
		Материалы:			
		Цем.песчаный р-р М 100	0.42		м3
		Подготовка из бетона кл. В7.5	3,2		м3

1. Данные по инжинерно-геологическим заключениям см. на листе общие данные.
2. Горизонтальная гидроизоляция выполнять из цементно-песчаного раствора марки М100, толщиной 30мм, на отм.-0,030
3. Под фундаментный блок выполнить бетонную подготовку из бетона кл. В7.5 толщ. 100мм.
4. Контейнер установливается на фундаментный блок.
5. Вокруг фундамента выполнить отмоска шириной 1000мм из бетона.
6. Боковые поверхности фундамента соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за два раза - 41,5 м2.

1-1

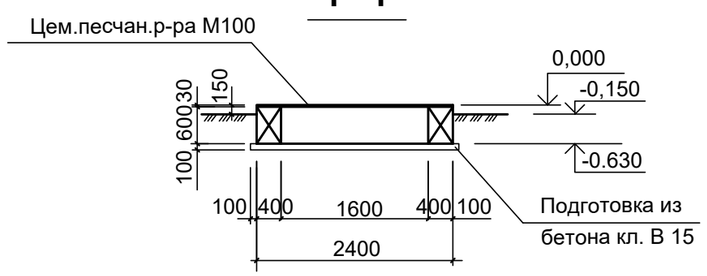

Взам. инв.№	Подл. и дата	Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	12-06-2023-АС		
						"Реконструкция водоочистного сооружения села Актогай Махамбетского района Атырауской области"		
ГИП						Фундамент под контейнер	Стадия: РП	Лист: 1 / Листов: 1
Проверил						Схема расположения фундамента под контейнера	ТОО «Redline Pro» г. Шымкент 2023г.	
Исполнил		Мамадраймова						
Н. контр.								
