ОТЧЕТ

О проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за август и сентябрь 2023 года

Астана 2023 г.

IT Engineering SA/ ИТ Инжиниринг СА
Address: 39 Abay Ave., Astana 010000 / Адрес: 010000 г. Астана, пр. Абая 39
Post office/Почта: chancellery@bacontractors.kz
Tel/Тел: +7 717 269-10-33

ОТЧЕТ

О проделанной работе по авторскому надзору в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан за август и сентябрь 2023 года

ФФ «IT Engineering SA»
(ИТ Инжиниринг СА)
в г. Астана
Директор Филиала Фирмы

Пистаев А. К.

«__» _____ 2023 г.

Астана 2023 г.

Содержание

Ситуационная схема 4
Объекты строительства..... 4
Распределение специалистов авторского надзора..... 5
Выполненные виды работ за отчетный период..... 5-6
Фотоиллюстрации выполненных работ за отчетный период 6-15

Ситуационная схема.

Объекты строительства.

Генеральным проектировщиком ФФ «IT Engineering SA» проводится работа по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Национальный научный онкологический центр в городе Нур-Султан» в рамках Договора №194 от 31.07.2019 года.

Работы по авторскому надзору ведутся под руководством инженеров Істілеу С.С, Суинова А.Б., Симница В.

Представителями авторского надзора и от генерального проектировщика является Істілеу С.С, Суинов А.Б., Симница В.

Экспертам авторского надзора было представлено задание на авторский надзор по строительству вышеназванного объекта от генерального проектировщика, согласно Методическому документу Республики, Казахстан «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» и оформлен журнал авторского надзора по объекту.

В процессе авторского надзора выполнен объем работ на соответствие производимых работ проектным решениям, действующим строительным нормам и правилам.

- **Распределение специалистов авторского надзора по объекту:**

№	Имя эксперта	Раздел согл. аттестата
1	Ізтілеу Сәбит Сәрсенбекұлы	АР, Нес/Огр
2	Суинов Айтбай Багдатович	ОВиК, ВК , АПТ, АГПТ
3	Симница Ведат	ЭМ, ЭО, ЭС

В отчетный период, по приказу №ЦО-002, №ЦО-003 на оказание услуг по авторскому надзору объекта «Национальный научный онкологический центр в городе Нур-Султан», генеральный проектировщик предоставляет отчет по объектам, пропорционально выполненным строительно- монтажным работам.

В ходе осуществления авторского надзора по строительству объекта «проекту «Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек» г. Нур-Султан, специалистам авторского надзора были освидетельствованы работы, часть которых (наиболее существенные) отражены в таблице:

Месяц	**Август, сентябрь**
Специалисты:	**Ізтілеу С.С., Суинов А.Б., Симница В.**
Название объекта:	«Национальный научный онкологический центр. Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек»
Генеральный подрядчик:	АФК «B&A Contractors SA»
Генеральный проектировщик:	ФФ «IT Engineering SA»
Выполненные виды работ за отчетный период:	**АР, Нес/Огр** • Снос здания кислородной станции с резервуарами "Литер Д" • Снос здания трансформаторной подстанции "Литер Е" • Демонтаж здания "ДГУ" • Снос здания котельной "Литер К" • Демонтаж ж/б резервуара топливохранилища • Снос резервуара водохранилища с насосной станцией "Литер Ж" • Демонтаж металлического ограждения (забор) • Засыпка грунта с послойным уплотнением в осях С-Е/3-2 с отм. -7.82м до отм.-3.32 м. (Платформа чиллера) • Устройство щебня под основание фундамента в осях С-Е/3-2 до отм. -3.17м. (Платформа чиллера) • Устройство бетонной подготовки под основание фундамента в осях С-Е/3-2 до отм. -3.07 м. (Платформа чиллера) • Армирование ж/б фундамента в осях С-Е/3-2 на отм. -3.07 м. (Платформа чиллера) • Бетонирование ж/б фундамента в осях С-Е/3-2 до отм. -2.37 м. (Платформа чиллера)

	• Засыпка грунта с уплотнением в осях С-Е/2-1 с отм. до отм.-3.32 м. (Платформа чиллера) • Устройство щебня под основание фундамента в осях С-Е/2-1 до отм. -3.17м. (Платформа чиллера) • Устройство бетонной подготовки под основание фундамента в осях С-Е/2-1 до отм. -3.07 м. (Платформа чиллера) • Армирование ж/б фундамента в осях С-Е/2-1 на отм. -3.07 м. (Платформа чиллера) • Бетонирование ж/б фундамента в осях С-Е/2-1 до отм. -2.37 м. (Платформа чиллера) • Монтаж вывесок на фасаде здания (световые буквы 1 компл) • Отделка стен тип Р10 (Main Holl) +0.000/+26.884 • Устройство полеуретанового покрытия пола (ТИП F6.5) в осях А-F/24-25 до отм.+0.000м. (1-этаж,Протон-Терапия) • Устройство эпоксидного покрытия пола (ТИП F6.1) в осях А-G/20-28 до отм.+4.600м. (2-этаж Тех.этаж) • Монтаж жалюзийных металлических ограждений площадки чиллера с отм. +0.000...,+3,500 (Чиллер)
	ЭМ, ЭО, ЭС
	Протонная терапия, основное здание: • Прокладка силового кабеля. • Монтаж светильников. • Монтаж розеток.
	ОВиК, ВК, АПТ
	• Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры системы т91-92 от технический блок до чиллерная • Монтаж шумоглушителей системы вентиляция в осях 9-10/D-E этаж 0. Технический блок • Монтаж мембранных расширительных баков системы отопление, вентиляция и холодоснабжения в осях 8-25/H-L этаж 6; 3-8/A-G этаж 3; 11-22/O-R этаж 3
Фотоиллюстрации выполненных работ за отчетный период	**АР, Нес/Огр**

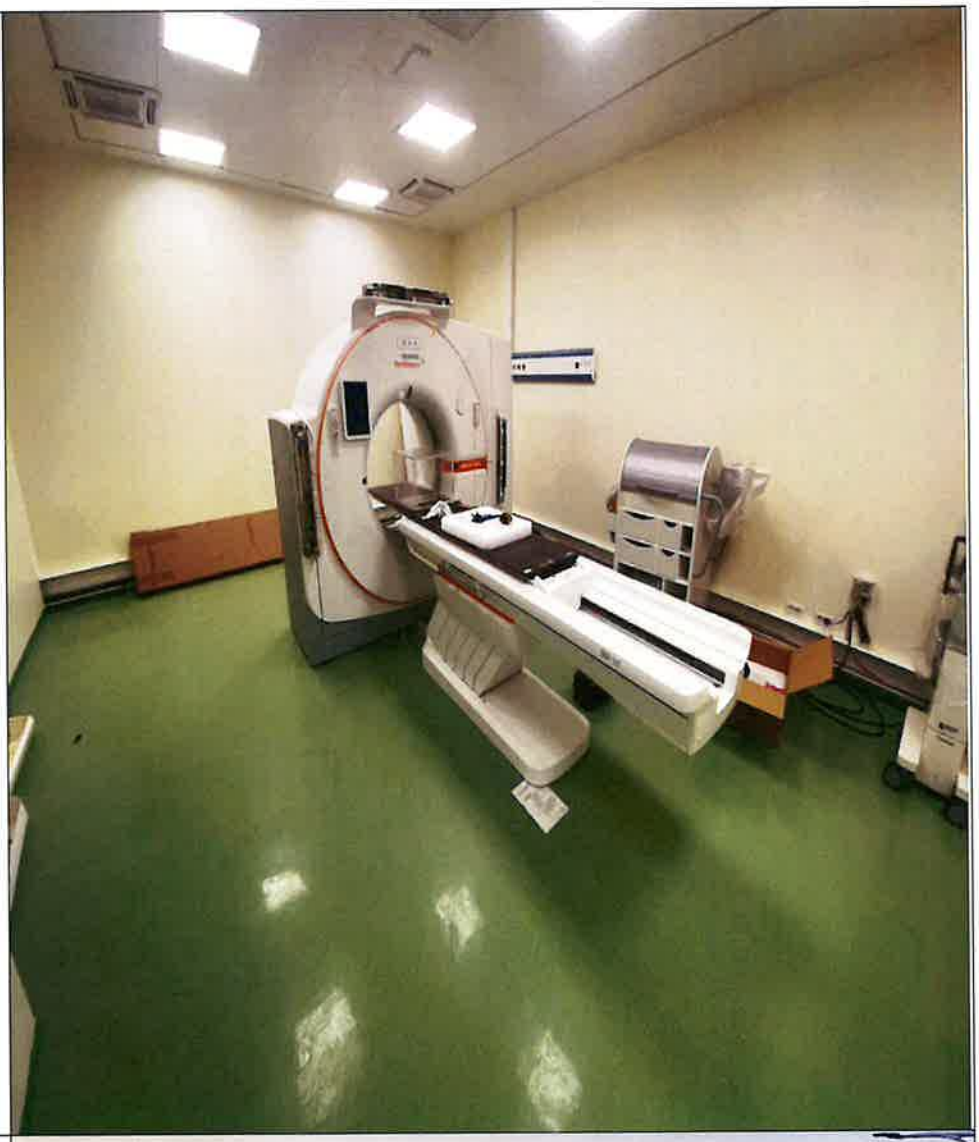

Фотоиллюстрации выполненных работ за отчетный период	ЭМ, ЭО, ЭС

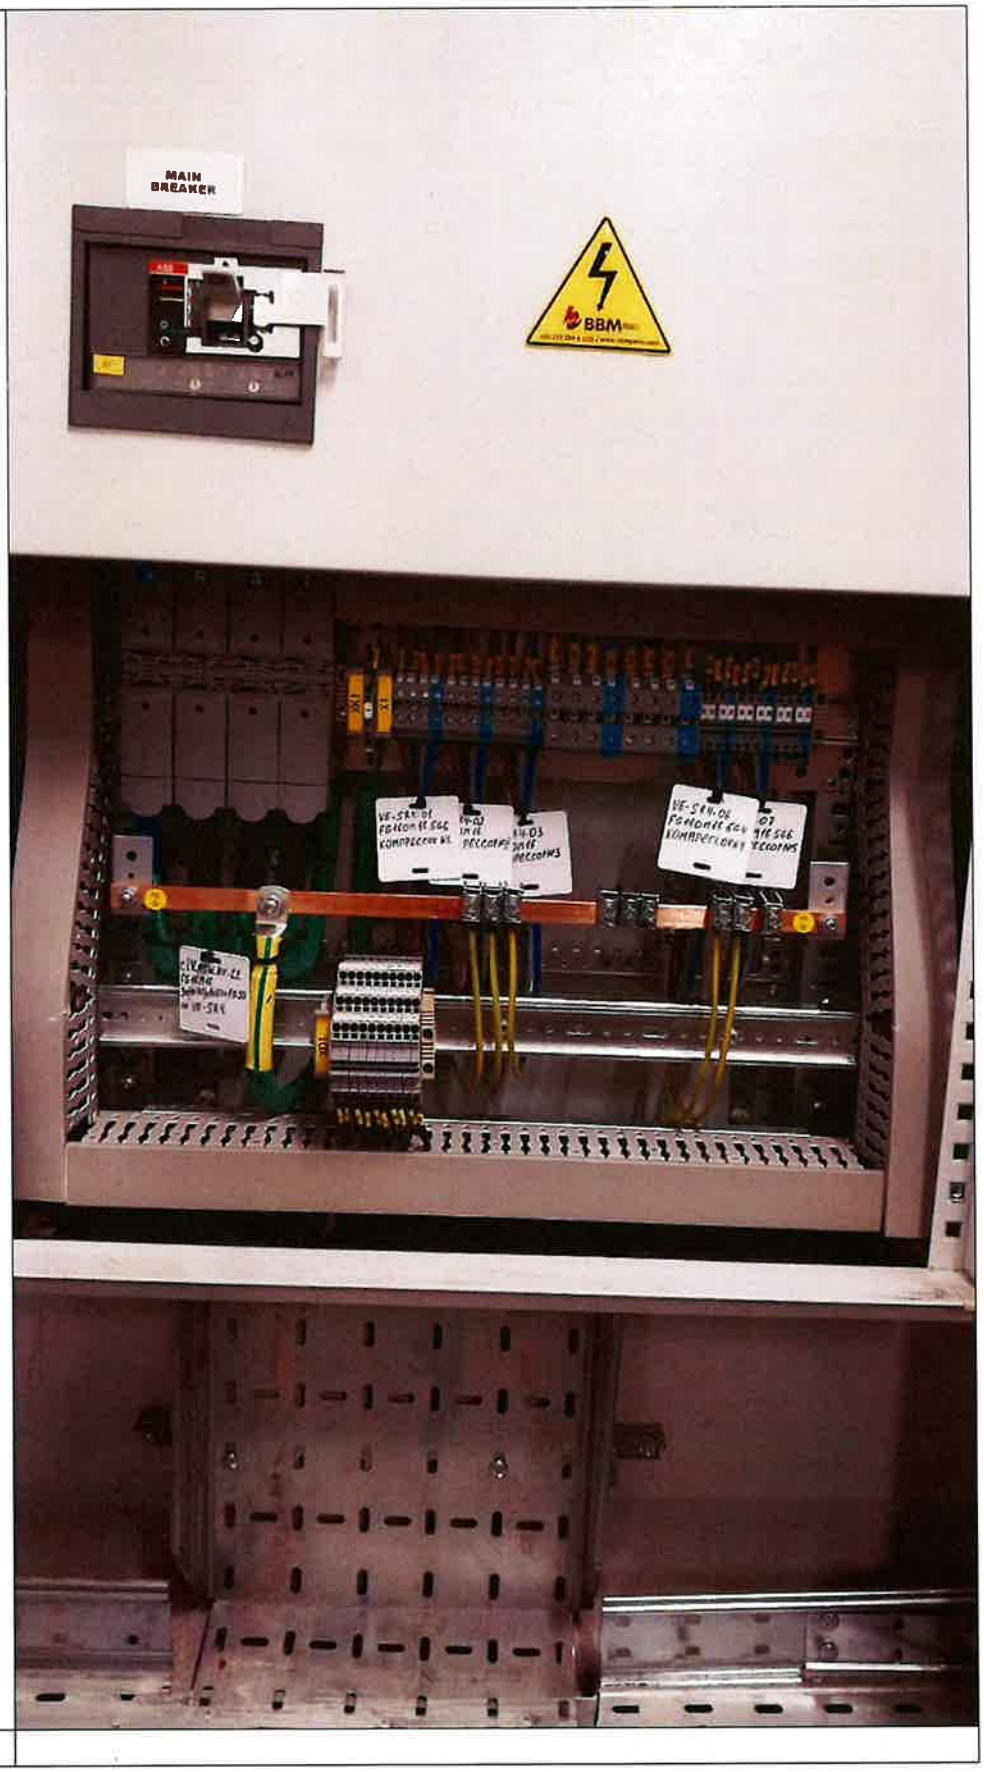
MAIN
BREAKER
BBM

Фотоиллюстрации выполненных работ за отчетный период	**ОВиК, ВК, АПТ**
