Утверждаю
Заместитель генерального директора
директор по производству
Государственного коммунального предприятия
на праве хозяйственного ведения «Алматы Су»
управления энергоэффективности и инфраструктурного
развития города Алматы
_____А. Юсупов
«___»_____20___г.

г. Алматы

Дефектный акт №

По объекту: «уличная канализационная сеть д=150-200-300 мм от к/к № 28 по пр. Суюнбая, 306 в Турксибском районе города Алматы»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия утвержденных приказом **№03-02/336/1 от 07 сентября 2022 года** в составе

Председатель комиссии:

Д. Биманов – директор департамента водоотведения

Члены комиссии:

Б. Тулегулов - руководитель управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

Е. Артамонова - начальник отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

М. Мураткан- заместитель директор департамента водоотведения;

К. Калиева – начальник производственно – технического отдела департамента водоотведения;

Б. Айтбаев - начальник отдела по обслуживанию электрооборудования департамента водоотведения;

Б. Жакупов - начальник Северо-Восточного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения;

Д. Абдрахманов- инженер I категории Северо-Восточного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения;

Ж. Есенкулов - ведущий инженер отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

Секретарь комиссии:

А. Ибраимов - инженер I категории производственно – технического отдела департамента водоотведения.

Составили настоящий акт по адресу г. Алматы уличная канализационная сеть д=150-200-300мм от ж/дома № 28 по пр. Суюнбая между колодцами № 28-8

Инвентарный код по бухгалтерии:

Инвентарный номер по бухгалтерии: **д-150мм=87880. Д-200мм-250мм-300мм=87865**

Год постройки: **1956**

Диаметр, протяжённость**: d=150мм, L=293,18п.м. от колодца №28-17. d=200мм L=248,01 п.м. от к/к № 17 до к/к № 11. d=250мм L=21,58 п.м. от к/к № 11 до к/к № 10. d=300мм L=63,77 п.м. от к/к № 10 до к/к № 8 Lобщ=626,5 п.м.**

Количество к/к(шт):21 шт**;**

Глубина заложения (м):

Материал труб: **керамика**

Балансовая принадлежность: **ГКП "Алматы Су" Управления энергоэффективности и Водоснабжения города Алматы департамента водоотведения;**

Пересечение: **3 2-х этажных домов, 2 4-х этажных домов ведомственные сети.**

Наличие грунтовых вод (глубина , м):**-нет;**

Покрытие: **асфальт;**

Расположение: **уличная канализационная сеть**

.

Имеющиеся дефекты: Частные подпоры на канализационной сети, зарастание корнями, разрушение стыков, ухудшение пропускной способности. Амортизация составляет-85%..

Предложения по акту:

В связи с изношенностью канализационной сети и канализационных колодцев (на данном участке)необходимо запроектировать и выполнить строительно-монтажные работы (СМР) открытом способом данного участка. Восстановить элементы благоустройства и асфальтное покрытие 648 ,9х0 ,1=64 ,89м3

верхний слой (дорога)-1859,6м2/ нижний слой (дорога)-697.35м2

верхний слой (тротуар)-460,0м2/ нижний слой (тротуар)-276,0м2

№	Наименование	Диа-метр, мм	Мате-риал труб	Протя-жённость (п.м.)	Демон-тажные работы	Монтажные работы	примечание
1	Уличная кан/сеть по пр. Суюнбая от ж/дома №306	150 200 250 300.	керамика	293,18 248,01 21,58 63,77	нет	Разработка грунта и устройства	Протяжённость сетей при реконструкции уточнить при разработке рабочего проекта

Приложение: схема к дефектному акту

Подписали:

Председатель комиссии:

Директор департамента водоотведения Д. Биманов

Члены комиссии:

Руководитель управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства; Б. Тулегулов

Начальник отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства Е. Артамонова

Заместитель директора департамента водоотведения М. Мураткан

Начальник производственно – технического отдела департамента водоотведения К. Калиева

Начальник отдела по обслуживанию электрооборудования департамента водоотведения — Б. Айтбаев

Начальник Северо-Восточного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения — Б. Жакупов

Инженер I категории Северо-Восточного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения — Д. Абдрахманов

Ведущий инженер отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства — Ж. Есенкулов

Секретарь комиссии:

Инженер I категории производственно – технического отдела департамента водоотведения. — А. Ибраимов

пр. Суюнбая, 312
пр. Суюнбая, 314
пр. Суюнбая, 651
пр. Суюнбая, 653а
пр. Суюнбая, 649
пр. Суюнбая, 647
пр. Суюнбая, 645
пр. Суюнбая, 643
пр. Суюнбая, 306
пр. Суюнбая, 308
пр. Суюнбая, 344а
ведомственный
пр. Суюнбая

②

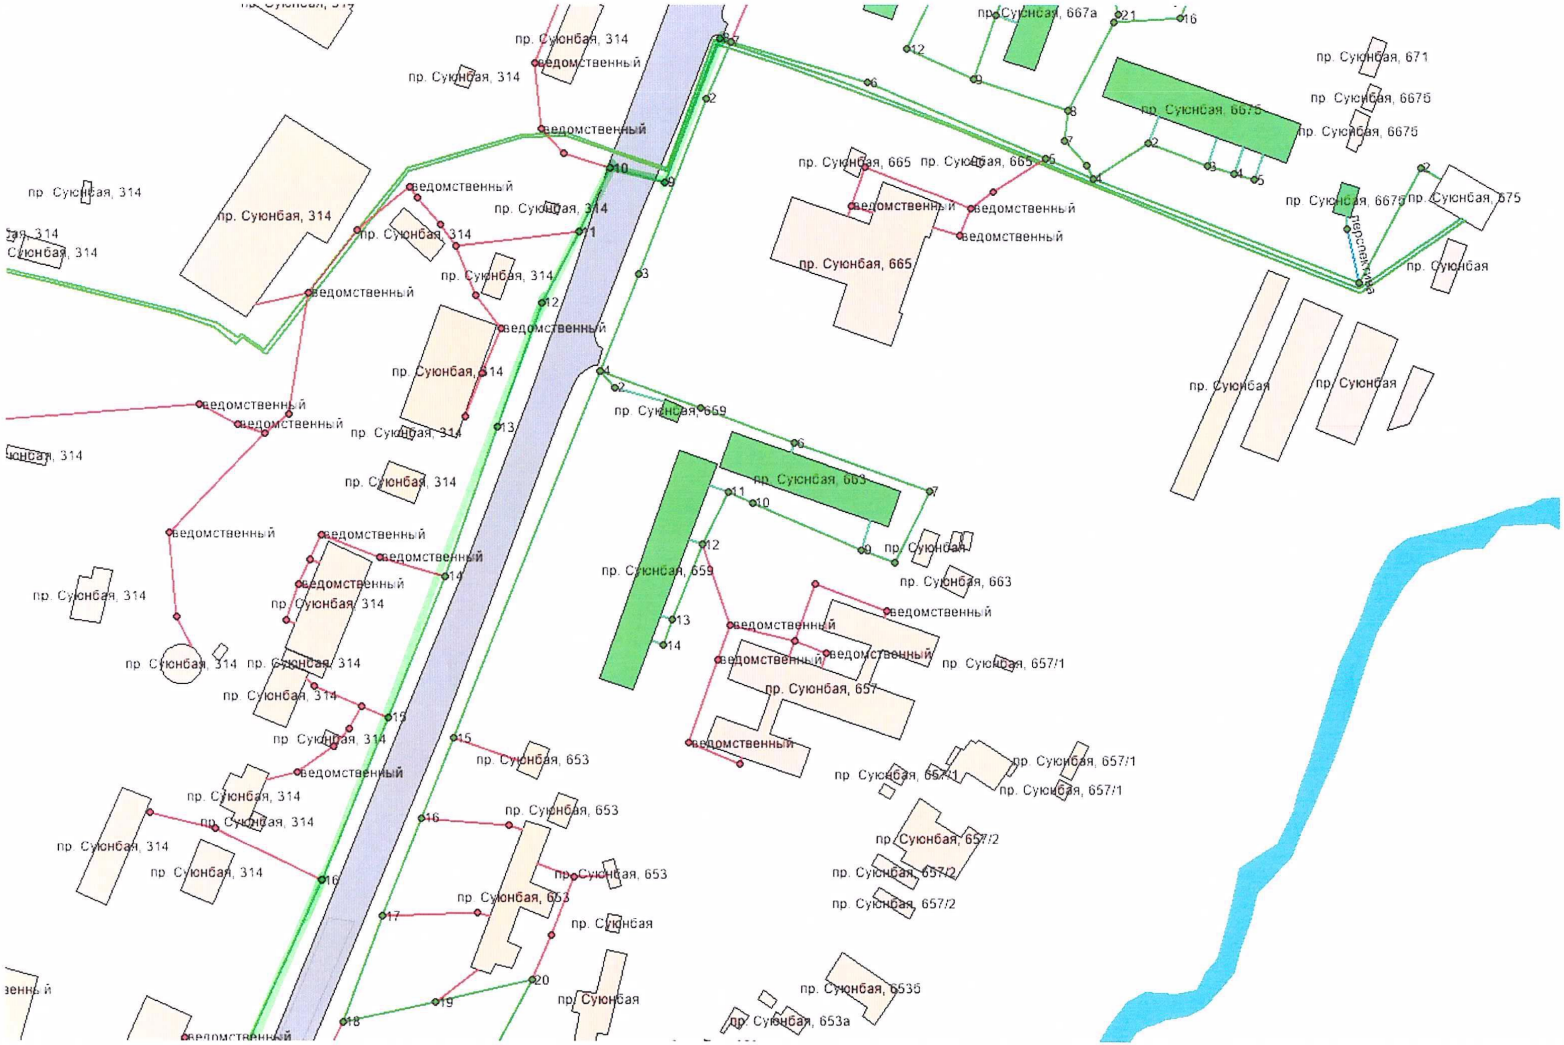
пр. Суюнбая, 314
ведомственный
пр. Суюнбая, 667а
пр. Суюнбая, 671
пр. Суюнбая, 667б
пр. Суюнбая, 665
пр. Суюнбая, 675
пр. Суюнбая, 659
пр. Суюнбая, 663
пр. Суюнбая, 657
пр. Суюнбая, 657/1
пр. Суюнбая, 657/2
пр. Суюнбая, 653
пр. Суюнбая, 653б
пр. Суюнбая, 653а
пр. Суюнбая
