Утверждаю
Заместитель генерального директора
директор по производству
Государственного коммунального предприятия
на праве хозяйственного ведения «Алматы Су»
управления энергетики и водоснабжения
города Алматы
_____А. Юсупов
«____»_____20___г.

г. Алматы

Дефектный акт №

По объекту: «дворовая канализационная сеть д=150мм от детского сада по адресу микрорайон-1, 72, Ауэзовском районе города Алматы»

. Мы, нижеподписавшиеся комиссия утвержденных приказом **№ 03-02/336/1 от 07 сентября 2022 года** в составе:

Председатель комиссии:

Д. Биманов – Директор департамента водоотведения.

Члены комиссии:

М. Мураткан- заместитель директора департамента водоотведения;

Б. Тулегулов – руководитель управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

Е. Артамонова – начальник отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

Д. Мамонов – начальник проектно-сметного отдела управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

К. Калиева – начальник производственно-технического отдела департамента водоотведения;

Б. Айтбаев – начальник отдела по обслуживанию электрооборудования водоотведения департамента водоотведения;

М. Несипбеков – начальник Юго-западного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения;

Ж. Есенкулов – ведущий инженер отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

А. Сарыбай – инженер I категории Юго—западного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения;

Секретарь комиссии:

А. Ибраимов - инженер I категории производственного-технического отдела водоотведения.

Составили настоящий акт по адресу г. Алматы дворовая канализационная сеть д=150мм от детского сада микрорайон-1, 72 между колодцами № 20-2

Инвентарный код по бухгалтерии: **и2-юз-4к-6у-1в**

Инвентарный номер по бухгалтерии: **14983**

Год постройки: **1964**

Диаметр, протяжённость**: d=150мм, L=79,05 п.м. от колодца №20-2**

Количество к/к(шт): **к/к;**
Глубина заложения (м): **от 2,46м**
Материал труб: **керамика**
Балансовая принадлежность: **ГКП "Алматы Су" Управления Энергетики и водоснабжения города Алматы департамента водоотведения;**
Пересечение: **При проектировании уточнить**
Наличие грунтовых вод (глубина , м):**-;**
Покрытие: **балласт;**
Расположение: **дворовая**

Имеющиеся дефекты: Данные канализационные сети работают в аварийном режиме так как произошли проломы керамических труб, нарушение пропускной способности, деформация диметра трубы частые засоры на данной сети.

Предложения по акту:
В связи с изношенностью канализационной сети и канализационных колодцев (на данном участке) необходимо запроектировать и выполнить строительно-монтажные работы (СМР) открытом способом данного участка.

Восстановить элементы благоустройства и асфальтное покрытие: нижний слой - 72 м^2, верхний слой - 144 м^2.

№	Наименование	Диа-метр, мм	Мате-риал труб	Протя-жённость (п.м.)	Демон-тажные работы	Монтажные работы	примечание
1	Дворовая кан/сеть от детского сада микрорайон-1, 72	150.	керамика	79,05	Демонтаж колодцев. с обратной засыпкой 3 шт(5,4м^3)	Разработка грунта. Перекладка между колодцами №20-2	Протяжённость сетей при реконструкции уточнить при разработке рабочего проекта

Демонтаж асфальтового покрытия: 7,2 м^3.

Приложение: схема к дефектному акту

Подписали:

Председатель комиссии:
Директор департамента
водоотведения Д. Биманов

Члены комиссии:
Заместитель директора департамента
водоотведения М. Муртакан

Руководитель управления капитального
строительства и реконструкции департамента
капитального строительства Б. Тулегулов

Начальник отдела капитального строительства
управления капитального строительства и
реконструкции департамента капитального строительства Е. Артамонова

Начальник проектно-сметного отдела
управления капитального строительства и
реконструкции департамента капитального строительства Д. Мамонов

Начальник производственно – технического
отдела департамента водоотведения К. Калиева

Начальник отдела по обслуживанию
электрооборудования водоотведения департамента
водоотведения Б. Айтбаев

Начальник Юго-западного районного
эксплуатационного участка департамента водоотведения М. Несипбеков

Ведущий инженер отдела капитального
строительства управления капитального
строительства и реконструкции департамента
капитального строительства Ж. Есенкулов

Инженер I категории Юго—западного
Районного эксплуатационного участка
департамента водоотведения А. Сарыбай

Секретарь комиссии:

Инженер I категории производственного-технического
отдела водоотведения А. Ибраимов

Микрорайон-1, 72

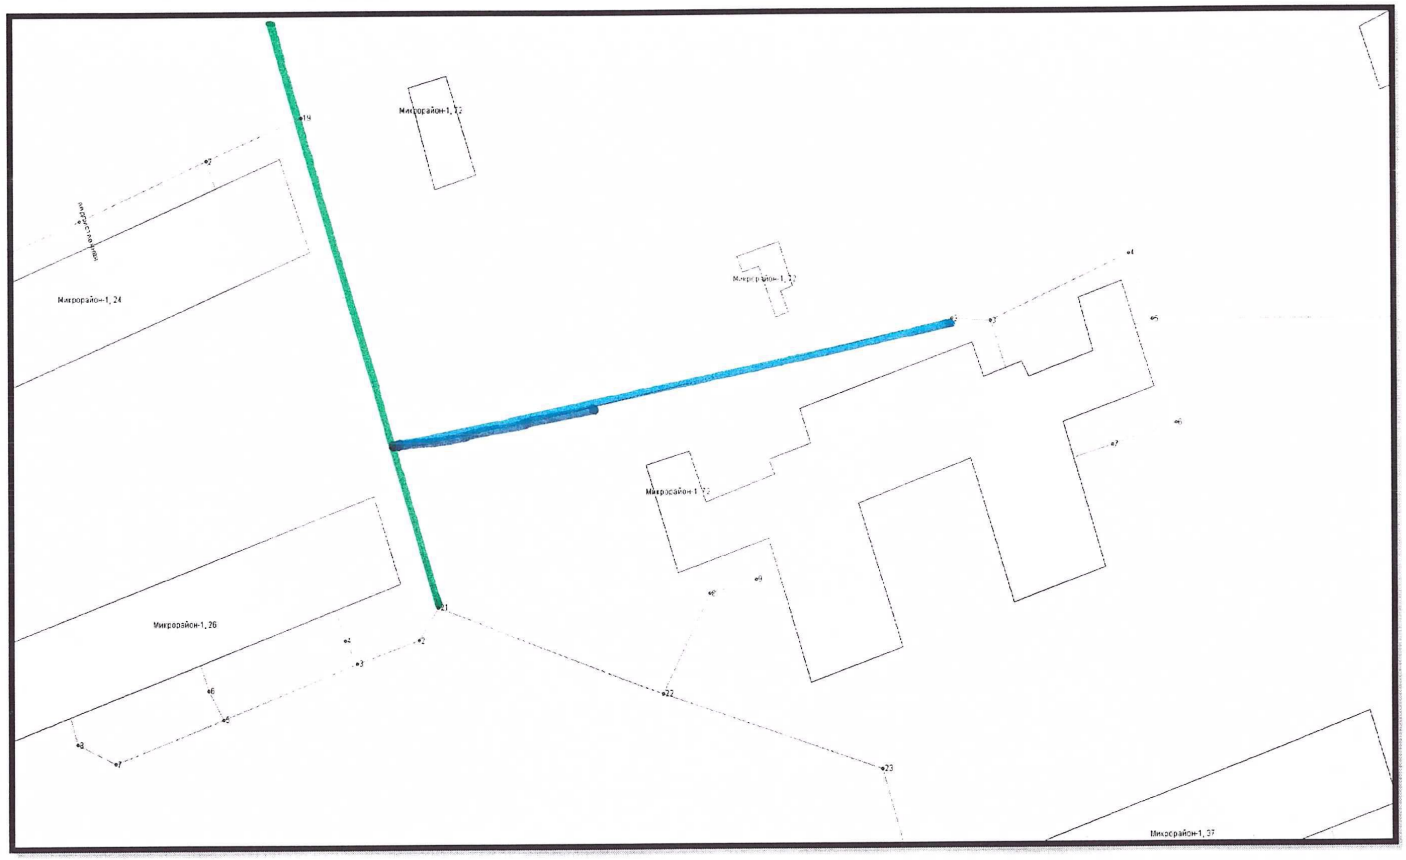

Канализационные сети ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭ и В г. Алматы

Проектируемая кан/сеть
