Утверждаю
Заместитель генерального директора
директор по производству
Государственного коммунального предприятия
на праве хозяйственного ведения «Алматы Су»
управления энергоэффективности и инфраструктурного
развития города Алматы
_____А. Юсупов
«____»_____20___г.

г. Алматы

Дефектный акт №

По объекту: «дворовая канализационная сеть д=200 мм от ж/дома № 28а по ул. Латыфа Хамеди, в Медеуском районе города Алматы»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия утвержденных приказом **№03-02/336/1 от 07 сентября 2022 года** в составе:

Председатель комиссии:

Д. Биманов – директор департамента водоотведения

Члены комиссии:

Б. Тулегулов - руководитель управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

Е. Артамонова - начальник отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

М. Мураткан- заместитель директор департамента водоотведения;

К. Калиева – начальник производственно – технического отдела департамента водоотведения;

Б. Айтбаев - начальник отдела по обслуживанию электрооборудования департамента водоотведения;

Б. Жакупов - начальник Северо-Восточного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения;

Д. Абдрахманов- инженер I категории Северо-Восточного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения;

Ж. Есенкулов - ведущий инженер отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства;

Секретарь комиссии:

А. Ибраимов - инженер I категории производственно – технического отдела департамента водоотведения.

Составили настоящий акт по адресу г. Алматы дворовая канализационная сеть д=200мм от ж/дома № 28а по ул. Латыфа Хамеди между колодцами № 11-5

Инвентарный код по бухгалтерии: **и2-св-5к-7у-1в-1д**

Инвентарный номер по бухгалтерии: **131694**

Год постройки: **1971**

Диаметр, протяжённость**: d=200мм, L=207,83п.м. от колодца №11-5**

к/к(шт): **7 к/к;**

Глубина заложения (м): **от 3,49-2,01**

Материал труб: **керамика**

Балансовая принадлежность: **ГКП "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы департамента водоотведения;**
Пересечение: **водопроводные сети, газовые сети**
Наличие грунтовых вод (глубина , м):**-нет;**
Покрытие: **асфальт;**
Расположение: **дворовая канализационная сеть**

Имеющиеся дефекты: Частные подпоры на канализационной сети, зарастание корнями, разрушение стыков. Истек срок эксплуатации, ухудшение пропускной способности. Амортизация составляет-80-90%.

Предложения по акту:

В связи с изношенностью канализационной сети и канализационных колодцев (на данном участке)необходимо запроектировать и выполнить строительно-монтажные работы (СМР) открытом способом данного участка.

Восстановить элементы благоустройства и асфальтное покрытие: нижний слой - 37,5 $м^2$ и верхний слой - 75,0 $м^2$ толщиной 0,1 м; а также восстановление брусчатки - 15 $м^2$ (без стоимости материала) и бордюра - 60 м (без стоимости материала). Восстановление арыка - 3 м (0,096 $м^3$).

№	Наименование	Диа-метр, мм	Мате-риал труб	Протя-жённость (п.м.)	Демон-тажные работы	Монтажные работы	примечание
1	Дворовая кан/сеть от от ж/дома №28а по ул. Латыфа Хамеди	200.	керамика	207.83	Демонтаж колодцев. с обратной засыпкой 7 шт - 12,6 $м^3$	Разработка грунта. Реконструкция канн/сети между к/к №11-5	Протяжённость сетей при реконструкции и уточнить при разработке рабочего проекта

Приложение: схема к дефектному акту

Подписали:

Председатель комиссии:
Директор департамента водоотведения Д. Биманов

Члены комиссии:

Руководитель управления капитального строительства
и реконструкции департамента капитального строительства; Б. Тулегулов

Начальник отдела капитального строительства
управления капитального строительства
и реконструкции департамента капитального строительства Е. Артамонова

Заместитель директора департамента водоотведения М. Мураткан

Начальник производственно – технического отдела департамента водоотведения К. Калиева

Начальник отдела по обслуживанию электрооборудования департамента водоотведения Б. Айтбаев

Начальник Северо-Восточного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения Б. Жакупов

Инженер I категории Северо-Восточного районного эксплуатационного участка департамента водоотведения Д. Абдрахманов

Ведущий инженер отдела капитального строительства управления капитального строительства и реконструкции департамента капитального строительства Ж. Есенкулов

Секретарь комиссии:

Инженер I категории производственно – технического отдела департамента водоотведения. А. Ибраимов

ул. Латыфа Хамеди, 28

Инвентарный номер по бухгалтерии: **131694**

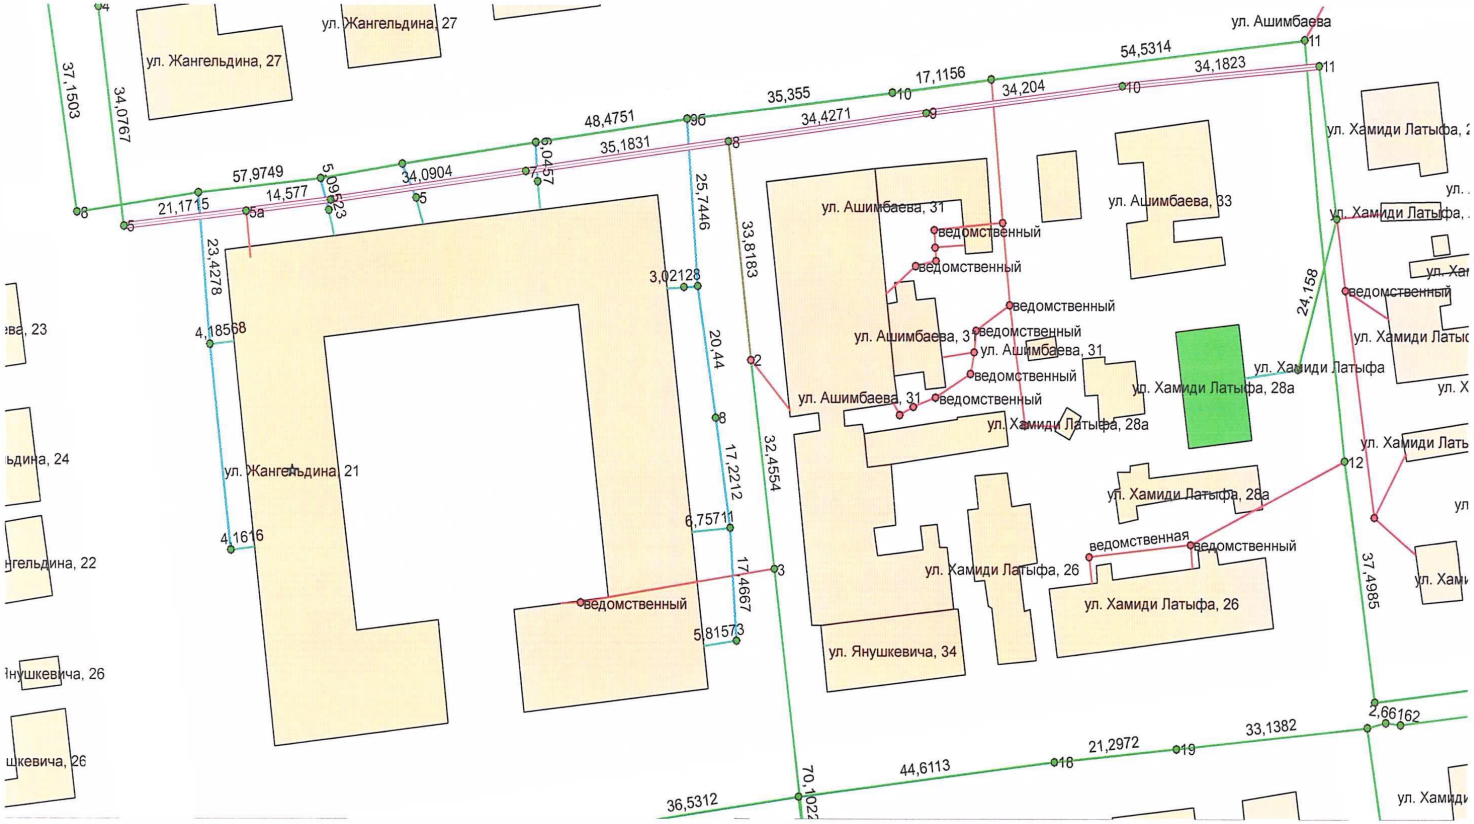

К **Канализационные сети ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭ и ИР г. Алматы**

К **Ведомственная кан/сеть**
