Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г.)

Декларация о соответствии

«30» 03 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Нурлы Тау ЛТД»,
120014, город Кызылорда, ул. Байсеитова 97/99.
наименование организации, юридический адрес

в лице: Досмаханов Руслан Аманаевич – директор ТОО «Нурлы Тау»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
- Обустройство месторождении Карабулак при пробной эксплуатации. 2 очередь. Электроснабжение скв.18, 23, 29, Спутников 3 и 4. (**Электроснабжение скважины 29).**
По адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение Карабулак.
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»
Чжао Сяомин – председатель правления
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), разработанным проектной группой АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:
- Проект 15-13-02. Обустройство месторождении Карабулак при пробной эксплуатации 2 очередь. Электроснабжение скв.18, 23, 29, Спутников 3 и 4,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ №31-П от 24.02.2016 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность воздушной линии ВЛ-6кВ до скважины 29	метр	115		115	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-Объем работ по проекту электроснабжения скважины состоит в следующем:

Строительство ответвительной линий ВЛ-6кВ от существующей линий ВЛ-6кВ до скважины №29 м/р Карабулак с установкой КТПН-6/0,4 кВ.

На существующей линии ВЛ 6кВ производится демонтаж анкерной опоры и заменяется на угловую анкерную опору. На концевой опоре ЛЭП 6 кВ электроснабжение установлен линейный разъединитель РЛНД-10/400 и для питания электроприёмников скважины установлена комплектная трансформаторная подстанция тип КТПН-6/0,4 кВ.

Строительство включает:

-ВЛ 6 кВ

-КТПН-6/0,4 кВ

-Система заземления.

КТПН установлен на два фундаментных блока ФБС24.4-6т. под основания фундамента устроено щебеночная подготовка 100мм с пропиткой битума, боковые поверхности железобетонных конструкций соприкасающиеся с грунтом так же обмазоны горячим битумом. Глубина заложения фундаментов 0,4 м.

Воздушная линия электропередач выполнена сталеалюминиевым проводам марки АС-50, подвешанные на железобетонных опорах выполненных на базе ж/б стоек СВ 105-5 и металлоконструкций типа траверс ТМ-24 на промежуточных опорах с ординарным креплением проводов и траверс ТМ6 на анкерных опорах. На промежуточных опорах используются штыревые изоляторы ШФ-20, на опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных изолирующих подвесок, содержащих два подвесных изолятора типа ПФ70В(ПС70Д) и подвесной линейной арматуры. Закрепление опор выполнена без ригеля, в сверленные котлованы на глубину 2,5 м. диаметром 350-450 мм.Искуственные заземлители выполнены из стальных стежней диаметром 16мм ввинченного вертикально в землю на глубину 5м, горизонтальные заземлители выполнены из стальных полос 40х4мм глубина заложения 0,7м.

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- КТПН 6/0,4кВ, мощностью 100 кВА - 1 комплект,

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: январь 2019 года;

месяц, год

окончание работ: март 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

- по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1.
- фактически, месяц: 14.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):
– прилагается.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
-не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись руководителя, дата м.п

.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
- не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
-не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата м.п

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
- Обустройство месторождении Карабулак при пробной эксплуатации 2 очередь. Электроснабжение скв.18, 23, 29, Спутников 3 и 4. (**Электроснабжение скважины 29**),

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Досмаханов Руслан Аманаевич – директор ТОО «Нурлы Тау ЛТД»:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись.) М.П

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «НурлыТау Лтд» Товарищество с ограниченной ответственностью

Исполнительная схема
трассы ВЛ-6кВ на м/р Карабулак.
Скважина №29

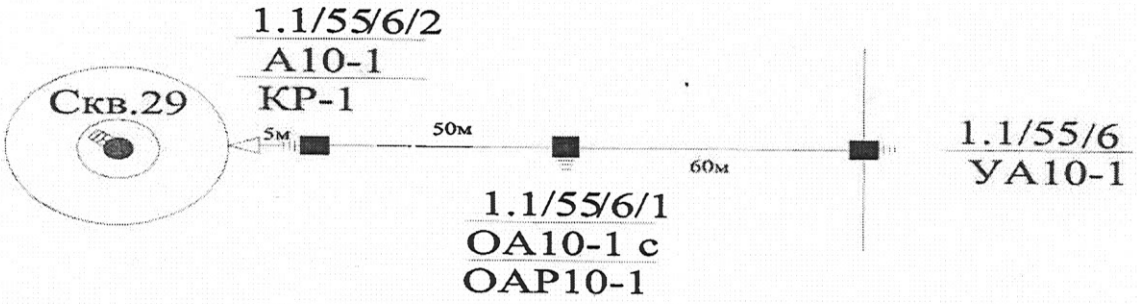

При строительстве ВЛ 6кВ применены:

1. Железобетонная стойка СВ105 в кол. 4шт
2. Провод АС 50/8

   Протяженность ВЛ 6кВ - 115м

Ведущий инженер
по надзору за строительством ОКС АО "ПККР" _____ Байдуйсенов С./Накыпбаев Е.

Ведущий инженер
ОКС АО "ПККР" _____ Абдыкалыков К./Санин М.

Нач.участка ТОО "Нурлытау ЛТД" _____ Нурлыбаев Д.

Авторский надзор ГИП ПГ АО"ПККР" _____ Токшылыкова Г.

	Проект №15-13	ПГ АО "ПККР"
	Проект №15-13 "Электроснабжение скв.№29 на м/р Карабулак"	заказчик: АО "ПККР"
	Исполнительная схема трассы ВЛ-6кВ на м/р Карабулак. Скв. №29	подрядчик: ТОО "Нурлытау ЛТД"
