Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
(с изменениями от 09.08.2019 г. от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«10» 02 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Нурлы Тау ЛТД»,
120014, город Кызылорда, ул. Байсеитова 97/99.
БИН: 070240019013, тел: 8 (7242) 26-30-88
наименование организации, юридический адрес

в лице: Денеев Габит Жумагалиевич – директор ТОО «Нурлы Тау ЛТД»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
- Электроснабжение скважин 232,275 на месторождение Арыскум.
(Электроснабжение скважины 232).
По адресу: Кызылординская область, Жалагашский район, м/р Арыскум,
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: АО «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз»,
Чжао Сяомин – председатель правления,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана отделом проектов АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»:
- Проект 20-25-02. Электроснабжение скважин 232,275 на месторождении Арыскум,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ № 101-П от 10.06.2021 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятия)	в том числе пускового комплекса	Общая (с учетом ранее принятия)	в том числе пускового комплекса
Протяженность воздушной линии ВЛ 6кВ до скважины №232	метр	65		65	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
- Источником электроснабжения объекта является существующая воздушная линия ВЛ-6кВ.
Воздушные линии ВЛ-6 кВ электроснабжения скважин выполнены сталеалюминиевыми проводами марки АС сечением 50 мм2, подвешенными на железобетонных опорах.
Опоры под воздушную линию выполнены на железобетонных стойках СВ-105-5. Закрепление стоек выполняются без ригеля, в сверленные котлованы на глубину 2,5 м. диаметром 350-450 мм. На промежуточных опорах используются штыревые изоляторы ШФ20-В, применяемые в районах загрязнения солончаковой пылью. На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных изолирующих подвесок, содержащих два подвесных изолятора типа ПФ 70В (ПС-70Д). Для питания электроприёмников скважин предусмотрена установка комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН, смонтированные на сборные бетонные блоки. Под подошвой фундаментов выполнена подготовка из щебня толщиной 100мм., пропитанная битумом до полного насыщения. В качестве мер безопасности эксплуатации электроустановки предусматривается устройство системы защитного заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом для оборудования КТПН-6/0,4кВ. Искусственные заземлители выполнены из стальных стержней диаметром 16мм, длиной 5м., ввинченных вертикально в землю. Верхние концы стержней заглублены на 0,5м от поверхности земли и электрически соединены между собой сталью диаметром 16мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
- КТПН 6/0,4кВ - 1 комплект.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 25.10.2021 года;
месяц, год
окончание работ: 23.12. 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1.
фактически, месяц: 2.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации — % и фактически применено — % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):
-прилагается.

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
- не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись руководителя, дата м.п.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
- не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
-не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата м.п

подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
- Электроснабжение скважин 232,275 на месторождение Арыскум.
(Электроснабжение скважины 232),

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Денеев Габит Жумагалиевич – директор ТОО «Нурлы Тау ЛТД»:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата М.П.

Исполнительная схема
трассы ВЛ-6кВ на м/р Арыскум скважины №232.

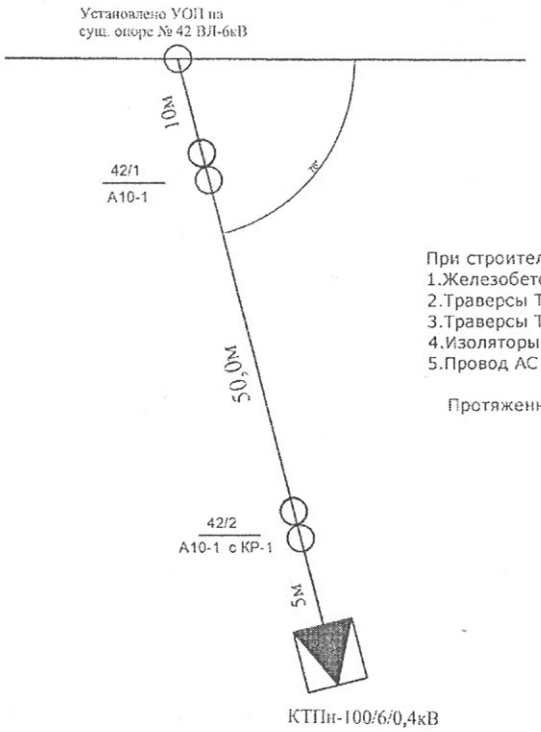

При строительстве ВЛ-6кВ применены:
1.Железобетонные стойки СВ-105 в кол-ве 4шт
2.Траверсы ТМ-6 в кол-ве 2шт
3.Траверсы ТМ-2 в кол-ве 1шт
4.Изоляторы ШФ-20 в кол-ве 15шт
5.Провод АС 50 /8 в кол-ве 250м.

Протяженность ВЛ-6кВ L= 65м

скв.№232

Авторский надзор ГИП ПГ АО "ПККР" _____ Оразбахов Н.

Начальник участка ТОО "Нурлытау ЛТД " _____ Атабаев Ж .

Вед.инженер ОКС
(Электрическая часть и КИПиА) АО "ПККР" _____ Абдыкалыков К..

Вед. инженер по надзору
за строительством ОКС АО "ПККР" _____ Байдуйсенов С../ТлеубергеновР.

Проект AR 20-25/02	ПГ АО "ПККР"
"Электроснабжения скв. №232 на м/р Арыскум".	Заказчик: АО "ПККР"
Исполнительная схема Электроснабжение скважины №232.	Исполнитель: ТОО "Нурлытау ЛТД"
