Отчет о ходе строительства и качестве выполняемых работ (технический надзор)

1. Номер отчета в системе

a4aebd9d-efc3-4063-9f7f-a616d4979ad1

2. Отчетный орган

Акимат Кызылординской области

3. Отчетный период

202311

4. Время сдачи отчета

30.11.2023 08:56:59

5. Талон-уведомление о начале деятельности производства СМР

KZ55REA00362368 от 19.06.2019

6. Наименование объекта

Қызылорда қаласы, Бұқарбай батыр көшесі, 57 мекенжайы бойынша қолданыстағы қойманы кеңейте отырып, дүкеннің бір бөлігін спорттық жабдықтар коймасы ретінде қайта құру

Адрес: г.Кызылорда

Уровень ответственности: II-го (нормального) уровня ответственности

Источник финансирования: Частные инвестиции

7. Заказчик

630620402728 - УРКИМБАЕВА МИРАМКУЛЬ САКТАГАНОВНА

8. Генеральный подрядчик

170340006092 - ТОО "Гор Сервис Проект"

9. Субподрядные организации

Субподрядные организации не указаны

10. Генеральный проектировщик

210140030761 - ТОО "ПСК Qabylet"

11. Авторский надзор

210140030761 - ТОО "ПСК Qabylet"

12. Технический надзор

071040005342 - ТОО "НИиПК"Каздоринновация"

13. Эксперты

- 610411401511 - Киялбаева Р.К.

14. Готовность объекта

- Общая: 100%
- Фундамент: 100%
- Каркас: 100%
- Кровля: 100%

15. Состояние исполнительно-технической документации

Ведется в полном объеме согласно СН РК 1.03-00-2011

16. Соответствие выполненных СМР календарному графику производства работ

Соответствует

17. Содержание строительной площадки и соблюдение требований НТД при производстве СМР

- Паспорт объекта: Соответствует СН РК 1.03-00-2011
- Ограждение: Не соответствует ГОСТ 23407-78, СП РК 3.02-142-2014
- Отсутствует пункт мойки колес (при необходимости)
- Отсутствует устройства или бункер для сбора мусора (при необходимости)
- Отсутствуют твердые покрытия внутриплощадочных проездов
- Соблюдаются требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасности строительных работ для окружающей территории и населения при производстве СМР

18. Задействованный ИТР состав

ФИО/ИИН	Специализация	Организация
850625301052 - Абилов Турлан Умирбекович	Нач.участка Аттестат №Аттестат №E00965 от 2019-12-17T10:25:16.225Z Выдан ТОО "Инжиниринговый центр SHEBER"	ТОО "КАСПИЙ КУРЫЛЫС ЛТД", БИН 060740001628

19. Изменения в проекте

Изменения отсутствуют

20. Выданные замечания

Выданные замечания отсутствуют

21. Примечание

22. Фотофиксация на объекте

1) WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.49.56 (1).jpeg

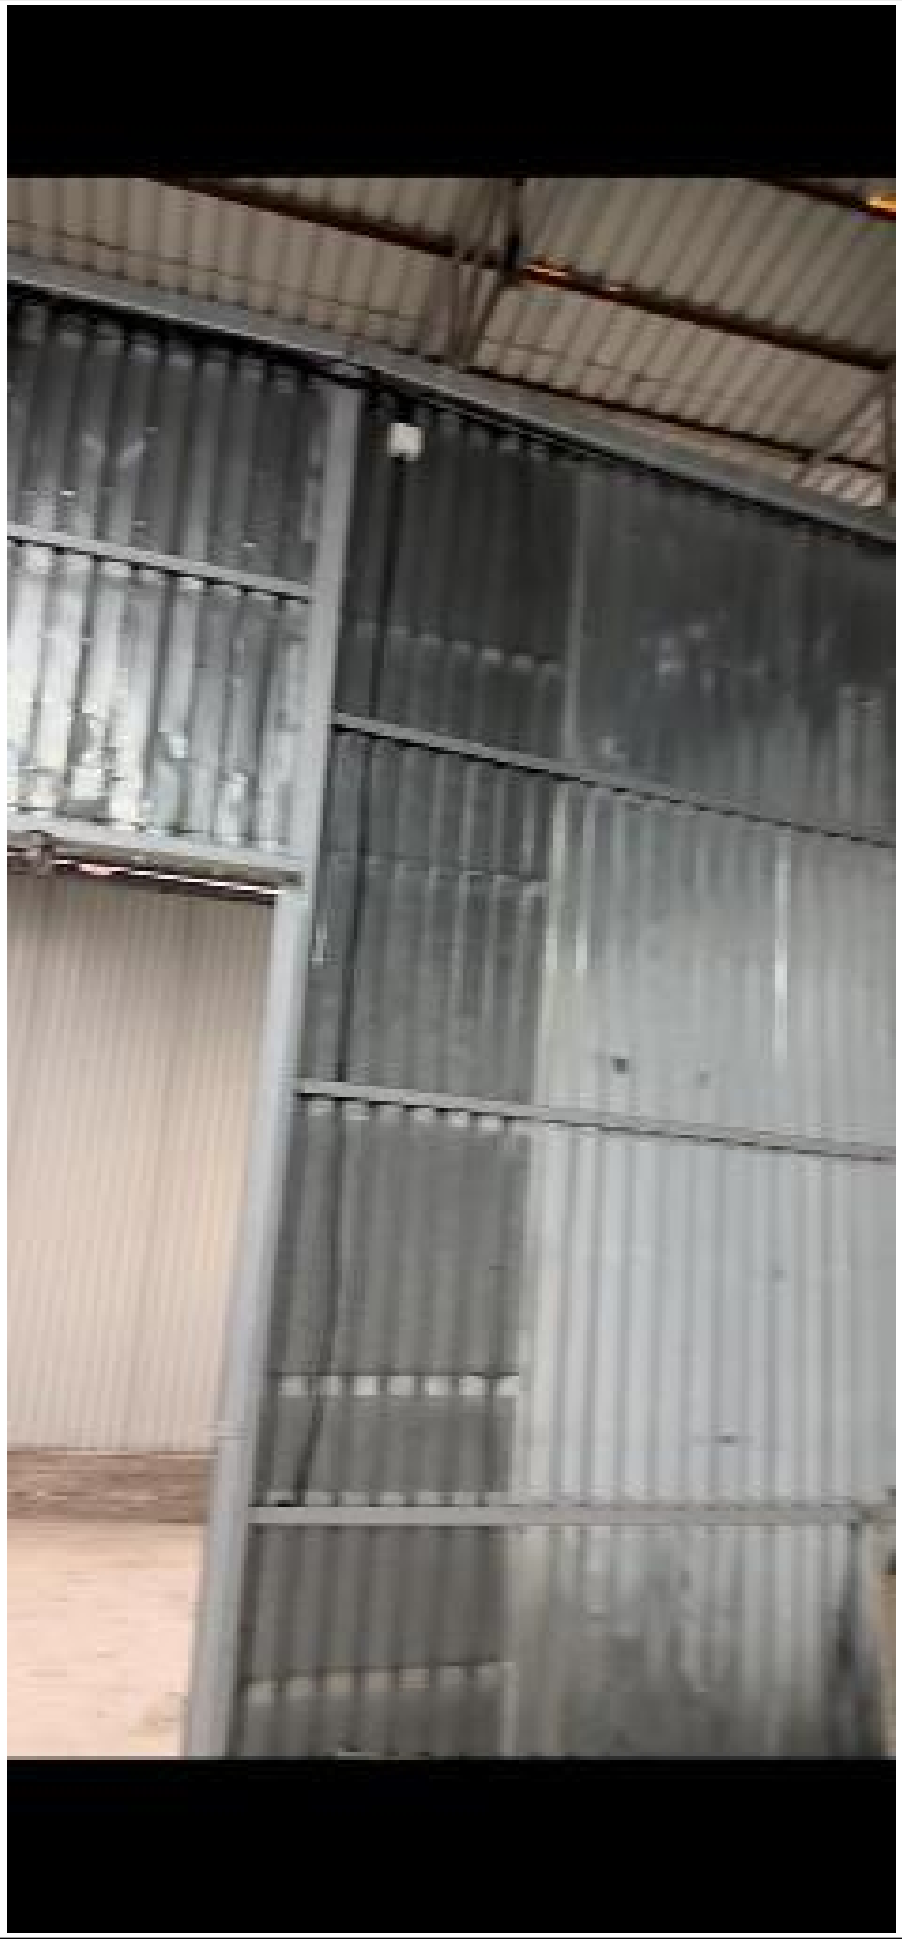

2) WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.49.56 (2).jpeg

3) WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.49.56.jpeg

4) WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.49.57 (1).jpeg

5) WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.49.57.jpeg

23. Фотофиксация в замечаниях

Фотофиксации в замечаниях не загружены

Обо все изменениях, связанных с приведенными в настоящем отчете сведениями,
обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
За достоверность сведений, содержащихся в отчете и (или) прилагаемых к отчету документа несу полную ответственность.

Лист согласования

Подписант	Дата постановки ЭЦП
Эксперт ТН: ИИН 591208350536 - АБДУРАХМАНОВ БАХОДИР АБДУРАШИДОВИЧ	30.11.2023 08:56:59
Руководитель ТН: ИИН 670719301055 - АСМАТУЛАЕВ РУСЛАН БОРИСОВИЧ	30.11.2023 09:03:04

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
