Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение 1
К приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632

Утвержденный приказом
ГУ «Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Атырауской области» № 145
от «29» «декабря» 2023 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» декабря 2023 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» БИН 050140003056, индекс 060004 по адресу Атырауская область, Атырау Г.А., Г.Атырау, улица Әйтеке Би, дом 77, руководитель Кусайнов Н.М.

(фамилия, имя, отчество, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: «20» от декабря 2023г., ТОО «Декор», РК, Атырауская область, г.Атырау, Гурьев, 5В БИН 960840000720, тел: 8(7122)324542

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «20» от декабря 2023г., ТОО «ТК и З», РК, г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Капал Батыра, улица Ондиристик Д.45, эксперт Каюпов П.Т. аттестат KZ50VJE00057691 от 25.09.2020г; KZ77VJE00057690 от 25.09.2020г; KZ80VJE00071798 от 24.01.2022г. БИН 000540006284, тел: 87053585577

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «28» от декабря 2023г., ТОО «СуҚұрылысПроект»., РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Жибек жолы, 43, 10, эксперт Абдикеримов О.С. аттестат №0000253 от 13.01.2017г, БИН 100440011822, тел: 87252392242

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, Енбекшиский с.о., с.Кадырка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____2022 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **решение акима сельского округа Енбекши Курмангазинского района №43 от 02.09.2022 года.**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № _____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области области» KZ72REA00353235 от 22.09.2023 г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СуҚұрылысПроект» №20-2022**

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» приказ №38 от 14.02.2023 года;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2023 год;**
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, _____ **месяц**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____ **месяц;**
фактически, месяц: _____ **месяц;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1		1	
Общая площадь здания	м2	266,35		266,35	
Площадь застройки	м2	380,0		380,0	
Полезная площадь	м2	266,35		266,35	
Расчетная площадь	м2	237,48		237,48	
Строительный объем	м3	2650,0		2650,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Прививочный кабинет и процедурный кабинеты – оснащены мебелью (стол письменный, стол-приставка, стул), специальным медицинским оборудованием (кушетка, шкаф, стерилизатор, облучатель бактерицидный, пеленальный столик, штатив), холодильник однокамерный;

Комната среднего медицинского персонала - оснащены мебелью (стол, стулья, шкафы), специальным медицинским оборудованием (кушетка, ростомер, весы, облучатель бактерицидный);

Ординаторская – оснащена мебелью (столы, стулья, шкаф); Кабинет акушера – оснащена мебелью (стол стулья) специальным медицинским оборудованием (кушетка, шкаф, кресло смотровое, ширма);

Комната для забора материала и проведение исследований – оснащена мебелью (столы, стулья, шкафы);

Помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих средств – оснащена мебелью (стол, стулья, шкафы):

Аптека – оснащена мебелью и оборудованием (стол, стулья, шкафы, холодильник): Холл – мебель (диван).

Здание медпункта запроектирована в отдельно стоящем одноэтажном здании с размерами по осям 14,4мх22,0м. Общая площадь – 336 м2.

Здание конструктивно одно этажное, без основного цокольного этажа, здание медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района в плане имеет прямоугольную форму с размерами по осям – 14,4мх22,0м. Высота этажа - 3,04 м. Общая высота здания – 7,01 м.

Покрытие – деревянная балка сечением 200х220 мм, пропитанная огне-био защитной краской.

Наружные стены - из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ по ГОСТ 530-2012 растворе М50, облицовка наружной стены - кирпич керамический пустотелый КР-л-по 250х120х65/1НФ/100/1,4/50/530-2012 на растворе М50 с утеплением минераловатной плитой ISOVER толщиной 80мм.

Полы – согласно ведомости полов – линолеум на основе, керамическая плитка Окна – металлопластиковые, согласно ГОСТ 30674-99, предусмотрены москитные сетки во всех помещениях;

Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88; Двери наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 6629-88;

Перемычки над внутренними дверными проемами - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84;

Кровля – четырехскатная, с покрытием из металлочерепицы по деревянным стропилам и обрешетке.

Стропила приняты согласна расчета сеч. 50х180 мм. Обрешетка сеч. 100х32 мм сплошная;

Утеплитель кровли – мин.плита, толш.150мм.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **243,313 млн.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **179,318 млн.тенге**, оборудования **23,892 млн.тенге,** прочие **40,103 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **216,216 млн.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **152,221 млн.тенге**, оборудования **23,892 млн.тенге,** прочие **40,103 млн.тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _С+ (нормальный)_;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» Кусайнов Нурберген Маликович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____ «_____» _____2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТК и З»,

Директор Кульсеитов Курбан Жайлауович

«_____» _____2023г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт Каюпов Парасат Талгатович аттестат KZ50VJE00057691 от 25.09.2020г; KZ77VJE00057690 от 25.09.2020г; KZ80VJE00071798 от 24.01.2022г.

«_____» _____2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

_____ «_____» _____ 2023г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «СуҚұрылысПроект»,

Директор Абдикеримов Олжас Сейсенхулович

«_____» _____ 2023г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Абдикеримов Олжас Сейсенхулович аттестат №0000253 от 13.01.2017г

«_____» _____ *2023*г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____ «_____» _____ *2023*г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Декор»

Директор Аскаров Пангерей Аскарулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинский пункт	1			380,0	2650,0	266,35	266,35			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Блочный	из ракушеблока, облицовка – силикатный кирпич	Четырехскатная, покрытие из металлочерепицы	Автономное	Централизованное, от внутрисельских сетей	Центральный водопровод	Автономное	ПВХ и ПЭ трубы	от существующего подземного газопровода среднего давления

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

			266,35					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы

ПЛАН ЭТАЖА В М 1:100

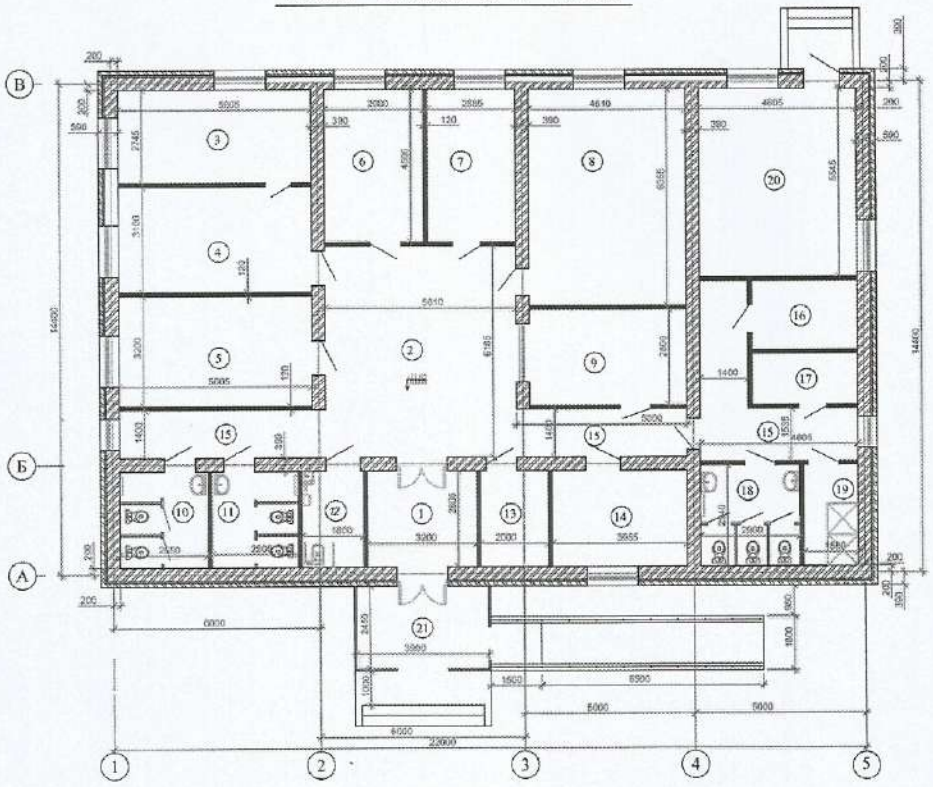

Общая площадь Медпункта – 284,3м²

2. Экспликация к поэтажным планам

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. помещения
1	Вестибюль	8,98	
2	Холл	34,7	
3	Прививочный кабинет	15,39	
4	Кабинет процедуры	17,38	
5	Комната для забора материала и проведений исследований	17,94	
6	Средний мед.персонал	13,05	
7	Ординаторская	11,63	
8	Кабинет акушера	22,91	
9	Аптека	10,081	
10	Санузел женский для посетителей	7,15	
11	Санузел мужской для посетителей	7,01	
12	Санузел для инвалидов колясочников	5,05	
13	Гардеробная	5,61	
14	Помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих средств	11,09	
15	Коридоры	19,31	
16	Помещение технического персонала	6,2	
17	Кладовая уборочного инвентаря	4,6	
18	Санузел для персонала (женский)	8,53	
19	Душевая для персонала (женский)	4,65	
20	Котельная	25,53	
21	Тамбур	9,56	
	ИТОГО:	266,35	

Экспликация земельного участка (м2)

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка

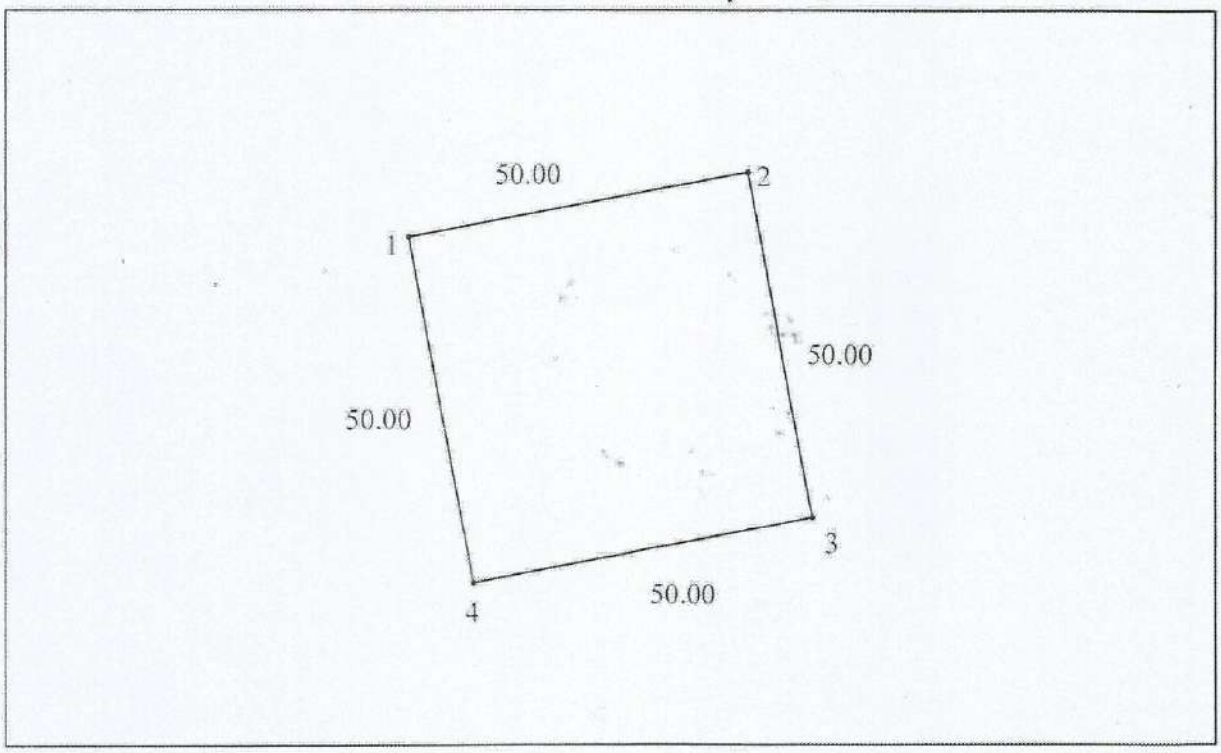

Масштаб 1: 1000

Шектесу учаскелерінің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*:
1-1 дейін -Елді мекен жері

Кадастровые номера (категории земель) смежных участков*:
От 1 до 1 -Земли н.п

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
				асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями			
1	2	3	4	5	6	7
0,25	390,56			845,43		

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Вестибюль	8,98		8,98	

	2		Холл	34,7		34,7	
	3		Прививочный кабинет	15,39		15,39	
	4		Кабинет процедуры	17,38		17,38	
	5		Комната для забора материала и проведений иследований	17,94		17,94	
	6		Средний мед.персонал	13,05		13,05	
	7		Ординаторская	11,63		11,63	
	8		Кабинет акушера	22,91		22,91	
	9		Аптека	10,081		10,081	
	10		Санузел женский для посетителей	7,15		7,15	
	11		Санузел мужской для посетителей	7,01		7,01	
	12		Санузел для инвалидов колясочников	5,05		5,05	
	13		Гардеробная	5,61		5,61	
	14		Помещение для приготовления и хранения дезинфирующих средств	11,09		11,09	
	15		Коридоры	19,31		19,31	
	16		Помещение технического персонала	6,2		6,2	
	17		Кладовая уборочного инвентаря	4,6		4,6	
	18		Санузел для персонала (женский)	8,53		8,53	
	19		Душевая для персонала (женский)	4,65		4,65	
	20		Котельная	25,53		25,53	
	21		Тамбур	9,56		9,56	

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
	266,35						

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			блочный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			из ракушеблока, облицовка – силикатный кирпич
	2) перегородки			кирпич силикатный
3	Перекрытия	чердачное		деревянная балка сечением 200х220 мм, пропитанная огне-био защитной краской.
		междуэтажное		
4	Крыша			четырехскатная, покрытие из металлочерепицы по деревянным стропилам и обрешетке
5	Полы	1-го этажа		Линолеум, керамическая плитка
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		металлопластиковые
		двери		внутренние - деревянные, входные – металлические, пластиковые
7	Отделочные работы	внутренние		штукатурка цементным раствором, шпатлевка, улучшенная окраска водоэмульсионными моющими составами.
		наружные		облицовка из силикатного кирпича с утеплителем
8	Горячее водоснабжение			автономное от котла водогрейного КВа-35ГН (ВВ-300GA)
9	Водопровод			Центральный водопровод
10	Канализация			ПВХ и ПЭ трубы
11	Электроосвещение			Централизованное, от внутрисельских сетей
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		Автономное, от существующего подземного газопровода среднего давления
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек		
	КТПНГ	Беседка	Мусоросборник
Площадь (м 2)	24	18	10
Высота строения (м)			
Объем строения (м 3)			

Фундамент			
Стены			
Перекрытия			
Крыша			
Полы			
Окна			
Двери			
Внутренняя отделка			
Наружная отделка			
Печи			

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
Выгреб	3,3	3	9,9	3,45	10	бетон

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		

Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», Руководитель Кусайнов Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «СуҚұрылысПроект»,
Директор Абдикеримов О.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,110
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	0,83
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3)деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	4
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,057
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АСБ 3х50мм^2 напряжением КЛ-10кВ	км	1,27
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	1
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», Руководитель Кусайнов Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «СуҚұрылысПроект»
Директор Абдикеримов О.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2		
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт		
12	Кусты (Ель)	шт	48	
13	Кустарники (сосна)	шт	675	
14	цветники			
15	газоны	м2		
16	порода деревьев			
17	возраст	год		

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», Руководитель Кусайнов Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «СуҚұрылысПроект»,
Директор Абдикеримов О.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	161	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	161	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-25	шт		
	" d- 50	шт	2	
	" d-	шт		
	Вентили d-25	шт		
	" d- 32	шт	2	
	" d-	шт		
	Кран d-25	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	65	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	65	
3	Прочие устройства			

	Смотровой колодец	шт	2	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», Руководитель Кусайнов Н.М._____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «СуҚұрылысПроект»,
Директор Абдикеримов О.С._____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	460	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	460	
	1) в проходных каналах	м	460	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 32	шт		
	d =63	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =32	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =32	шт	1	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», Руководитель Кусайнов Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «СуКұрылысПроект»,
Директор Абдикеримов О.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)
