Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" 12 2020года

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», г. Костанай, улица Байтурсынова, 55 Мусин Наурызбай Жасланович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения);

на основании:

декларации о соответствии (прилагается) **от 21.12.2020 года**
ТОО «Интерстиль» Сарибекян Гнел Левикович; Республика Казахстан, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии 36,

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от
ТОО «АДС САПА» «АДС САПА » эксперт технического надзора Галымбекулы Асылан, аттестат №KZ47VJE00038442 от 31.05.2018

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 22.12.2020 г.
ТОО "Промстройпроект " ГИП Пивоваров Александ Николаевич,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***"Реконструкция II вывода котельной №3 до ВУ2,участка тепломагистрали ТМ-15 от ТК15.02 до ТК14.02 и участка тепломагистрали ТМ16 от места соединения с ТМ-15 до ВУ-1 в г. Костанай.»***

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу)(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) постановления акимата города Костанай Костанайской области от 26 декабря 2017 года № 3880 о разрешению на реконструкцию

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 08.08.2018 г. №360 KZ57REA00143500 от 28.08.2018 г ,

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Промстройпроект» гос.лицензия № 15012337 заказ № 24.,3-629/17

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказом №934 от 8 октября 2018 г ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания»;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2020 г; месяц, год

окончание работ; декабрь 2020 г ; месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,2

фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность теплосети Д-720 мм (в двухтрубном исполнении)	м	1698,5	1698,5	1727,5	1727,5
в канале	м	294,5	294,5	338	338
бесканально	м	266	266	275	275
надземно	м	1138	1138	1114,5	1114,5
Протяженность теплосети Д-	м	20	20	18,8	18,8

530 мм (в двухтрубном исполнении)					
надземно	м	20	20	18,8	18,8
Протяженность перемычки Д-720 мм (в однотрубном исполнении)	м	76	76	76	76
в канале		28,3		28	28
надземно		24		48	48
Протяженность подпиточной линии Д-530 мм (в однотрубном исполнении)	м	42,6	42,6	42,6	42,6
в канале	м	42,6	42,6	42,6	42,6
надземно					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____ _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 256 170 730 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 156 432 766 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 38 191 225 тысяч тенге; прочие 61 546 739 тенге

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 088 223 740,83 тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 009 325 366,91 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 38 191 225 тенге; прочие 40 707 148,92 тенге

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция II вывода котельной №3 до ВУ2,ьучастка тепломагистрали ТМ-15 от ТК15.02 до ТК14.02 и участк тепломагистрали ТМ16 от места соединения с ТМ-15 до ВУ-1 в г. Костанай.»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Мусин Наурзбай Жасланович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Галымбекулы Асылан
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Пивоваров Александр Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Сарибекян Гнел Левикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы в двухтрубном исполнении	м	Ду-720-1727,5м Ду-530-18,8 м	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	Ду-720-1114,5м Ду-530-18,8м	
	1) на эстакадах	м	Ду-720 -60 м	
	2) на опорах	м	Ду-720-1054,3м Ду-530-18,8м	
	Количество опор	шт	Ду-720-186 Ду-530-4	
	Протяженность подземной прокладки:	м	Ду-720-613,2м	
	1) в проходных каналах	м	Ду-720-51,4м	
	2) в непроходных каналах	м	Ду-720-286,8	
	3) бесканальная прокладка	м	Ду-720 –275 м	
	Протяженность тепловой трассы в однотрубном исполнении (Подпиточная линия и перемычка)	м	Ду-720-76м Ду-530-46м	
2	Количество колодцев (камер)	шт	Проектируемых-3 Существующих -2	
3	Количество компенсаторов	шт	Ду-720-32шт	
4	Количество неподвижных опор	шт	52	
5	Количество вводов	шт	1	
6	Количество задвижек	шт	Ду-720-4шт - проектных 2шт-существующих Ду-530- 2 шт проектных	

Горизонтальный разрез колодца (камеры) прилагается	Вертикальный разрез колодца (камеры) прилагается
Масштаб 1:100	Масштаб 1:100

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1.	Труба стальная прямошовная	ППУ-ОЦ	Сталь	720х8	2100	
2	Труба стальная прямошовная	ППУ-ПЭ	Сталь	720х8	911,7	
3.	Труба стальная прямошовная	ППУ-ОЦ	Сталь	530х7	38	
4.	Труба стальная прямошовная	ППУ-ПЭ	Сталь	530х7	24	
5.	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией	ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16,	Нерж.сталь.	DN 700 ГОСТ 27036-86	8	
6.	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку с изоляцией	ППУ/ОЦ, Т от -260°С до +850°С, PN 16,	Нерж.сталь	DN 700 ГОСТ 27036-86	24	
7.	Неподвижная опора Ст 720-1100х50-1	ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	Сталь	720х8	14	
8.	Неподвижная опора Ст 720-1100х50-1	ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	Сталь	720х8	38	
9.	Отвод Ст 720х8-90°-1	ППУ-ОЦ-90° ГОСТ 30732-2006	Сталь	720х8	29	
10.	Отвод Ст 720х8-90°-1	ППУ-ПЭ-90° ГОСТ 30732-2006	Сталь	720х8	28	
11.	Отвод Ст 530х7-90°-1	ППУ-ОЦ-90° ГОСТ 30732-2006	Сталь	530х7	4	
12.	Отвод Ст 530х7-90°-1	ППУ-ПЭ-90° ГОСТ 30732-2006	Сталь	530х7	2	
13.	Отвод нестандартный -ППУ-ОЦ	ППУ-ОЦ-140°	Сталь	720х8	8	
14.	Отвод нестандартный	ППУ-ПЭ-140°	Сталь	720х8	4	
15.	Отвод стальной сварной сегментный 720х8		Сталь	720х8	5	
16.	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода	720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	Сталь	720х8	4	
17.	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции	Ст 720х8-ППУ-ОЦ	Сталь	720х8	2	
18.	Тройник с металлической заглушкой изоляции	Ст 720х8-273х7-1 ППУ-ПЭ	Сталь	720х8	1	
19.	Тройник с металлической заглушкой изоляции	Ст 720х8-219х6-1 ППУ-ПЭ 200	Сталь	720х8-219х6	8	

20.	Тройник с металлической заглушкой изоляции	Ст 720х8-530х7-1 ППУ-ПЭ	Сталь	720х8-530х7	1	
21.	Тройниковое ответвление с металлической заглушкой изоляции	Ст720х8-530х7-1 ППУ-ПЭ	Сталь	720х8-530х7	1	
22.	Тройник с металличекой заглушкой изоляции Ст 720х8-57х3-ППУ-ОЦ	Ст 720х8-57х3-ППУ-ОЦ	Сталь	720х8-57х3	8	
24.	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	30с41нж	Сталь	250	1	
25.	Задвижка стальная запорная 30с964нж д.700	30с964нж	Сталь	700	4	
26.	Задвижка стальная запорная 30с964нж д.500	30с964нж	Сталь	500	2	
27.	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	30с41нж	Сталь	150	2	
	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	30с41нж	Сталь	80	2	
28.	Кран шаровый под приварку д.50	КШ.П.050.40.01	Сталь	50	14	

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Прилагается.

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Мусин Н.Ж. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «Промстройпроект» Пивоваров А.Н. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ **УТ-1** (тип 8)

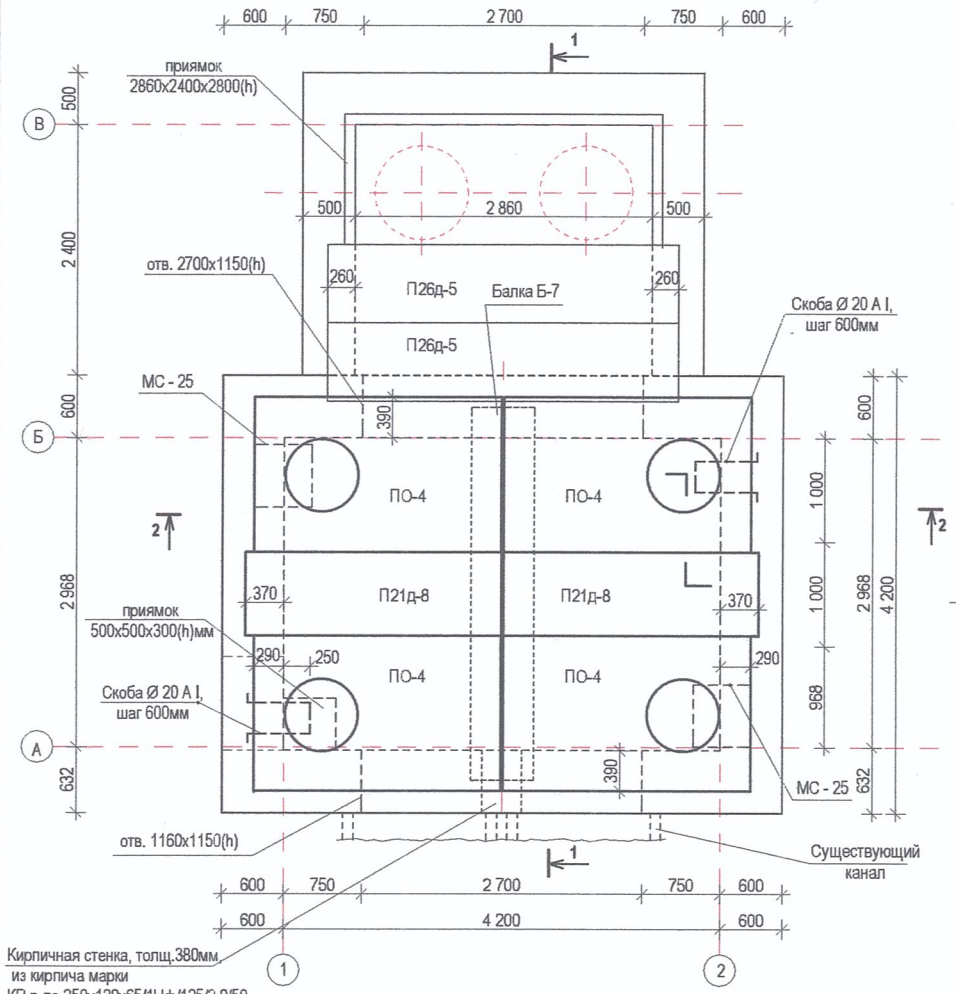

1-1

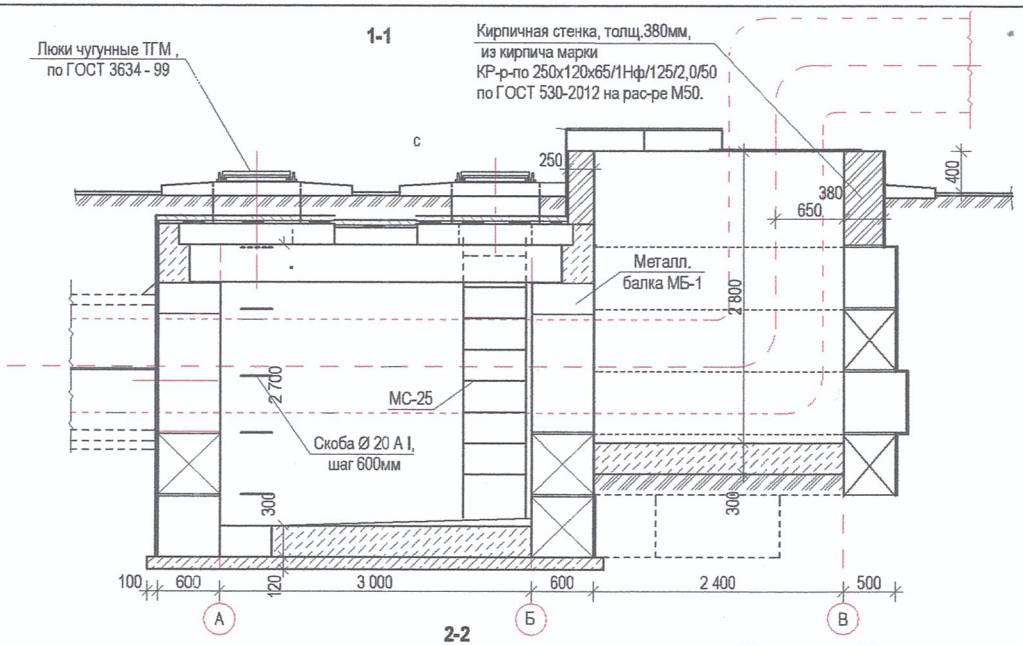

2-2

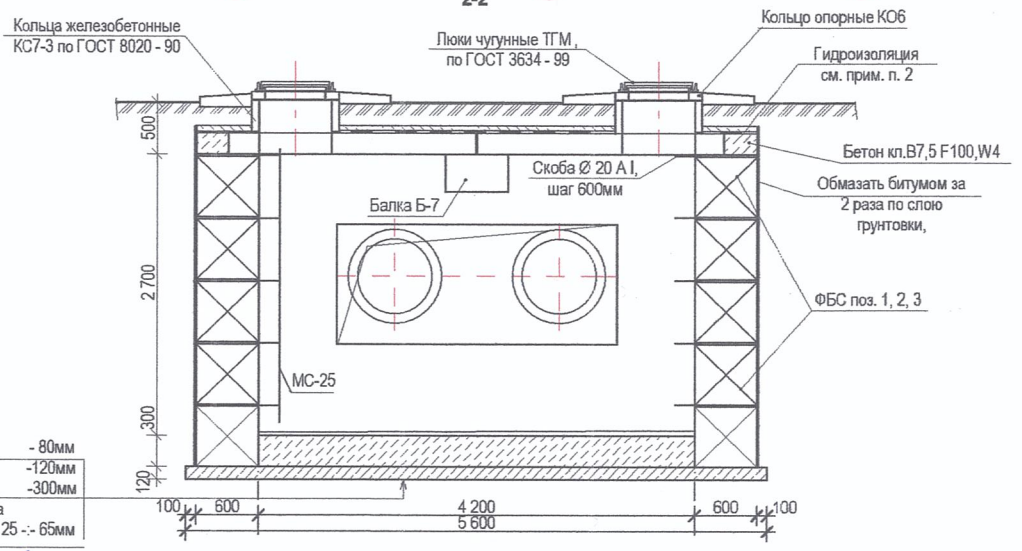

уплотненный щебнем грунт основания на глубину	- 80мм
подготовка из бетона кл. В15 F100, W4	-120мм
монолитный слой из бетона кл. В7,5 F100, W4	-300мм
штукатурка с железнением цементным раствором состава 1:2 на 3%-ом растворе алюмината натрия по уклону	- 25 -:- 65мм

Выполнил начальник участка ТОО "Интерстиль" _____ Яцкив Н.В.

ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ **УТ-2** (тип 18)

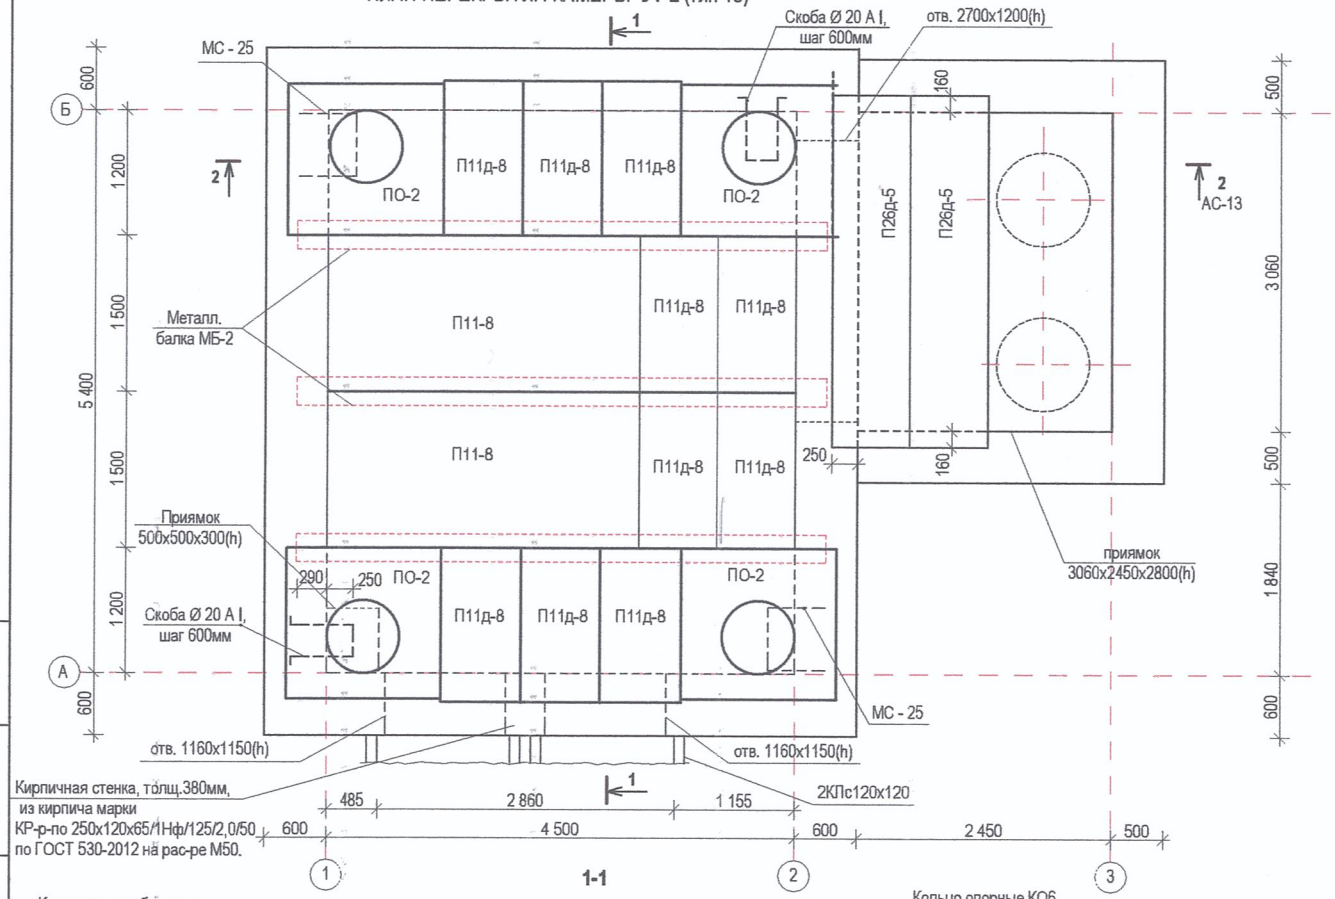

1-1

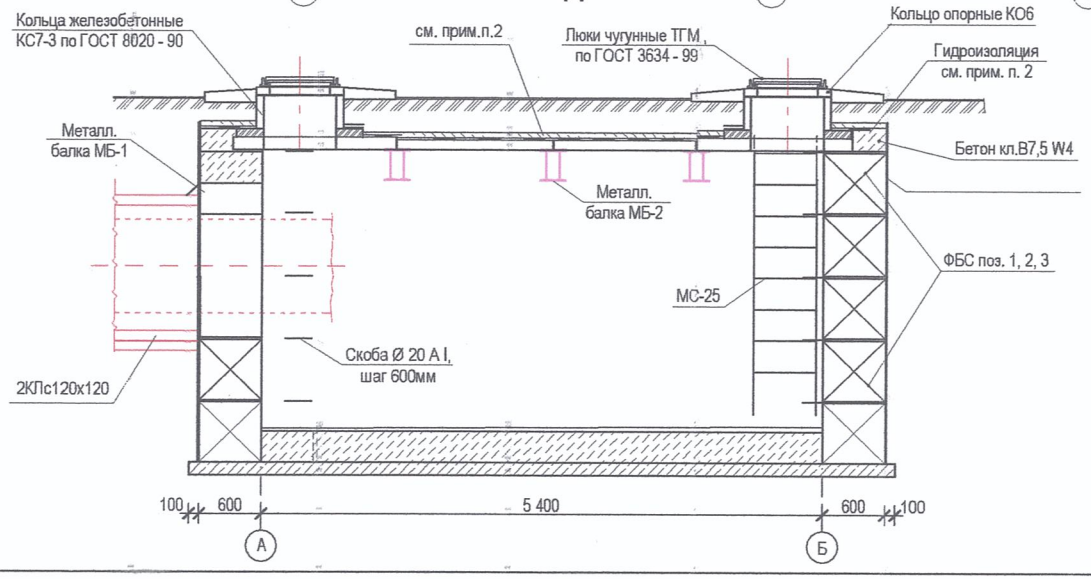

Выполнил начальник участка ТОО "Интерстиль" _____ Яцкив Н.В.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Козловцева Л. И.

Разрез 2-2 камеры УТ-2

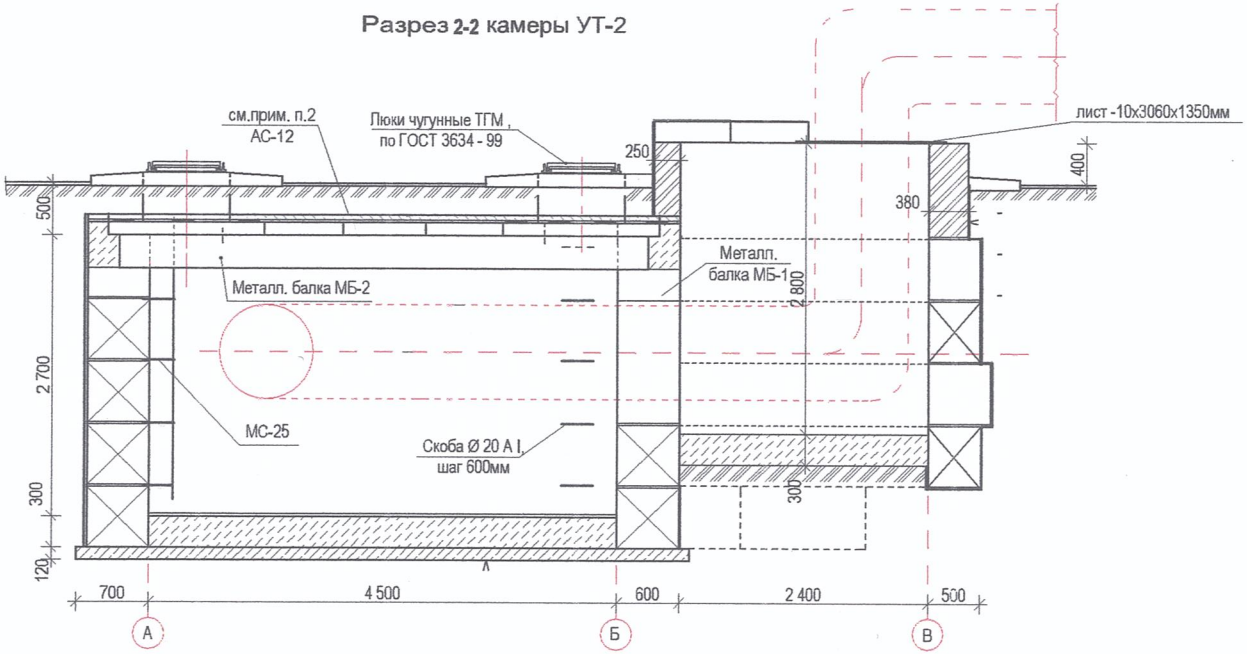

Выполнил Начальник участка ТОО "Интерстиль" _____ Яцкив Н.В.

ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ **УТ-3** (тип 8)

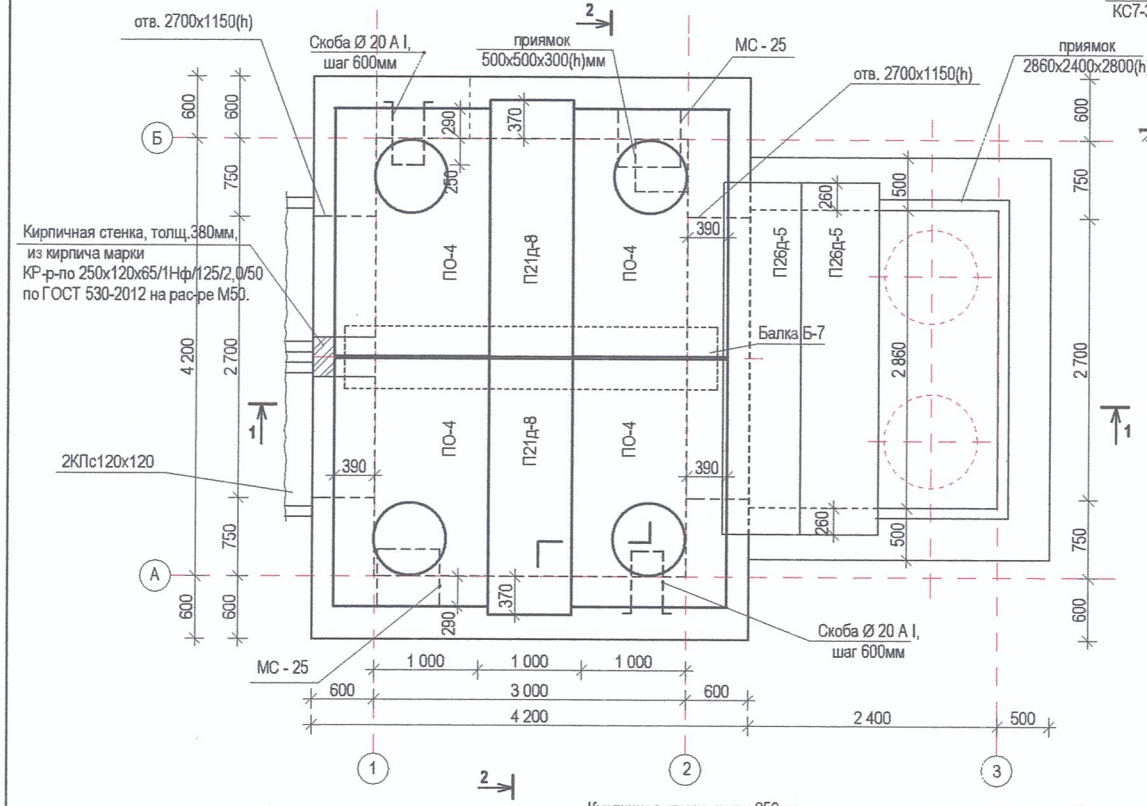

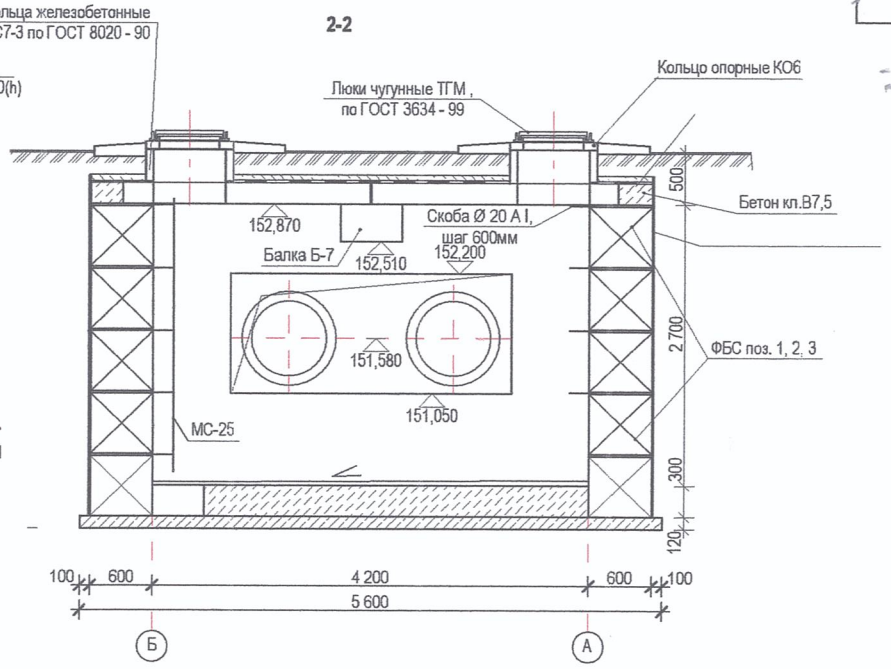

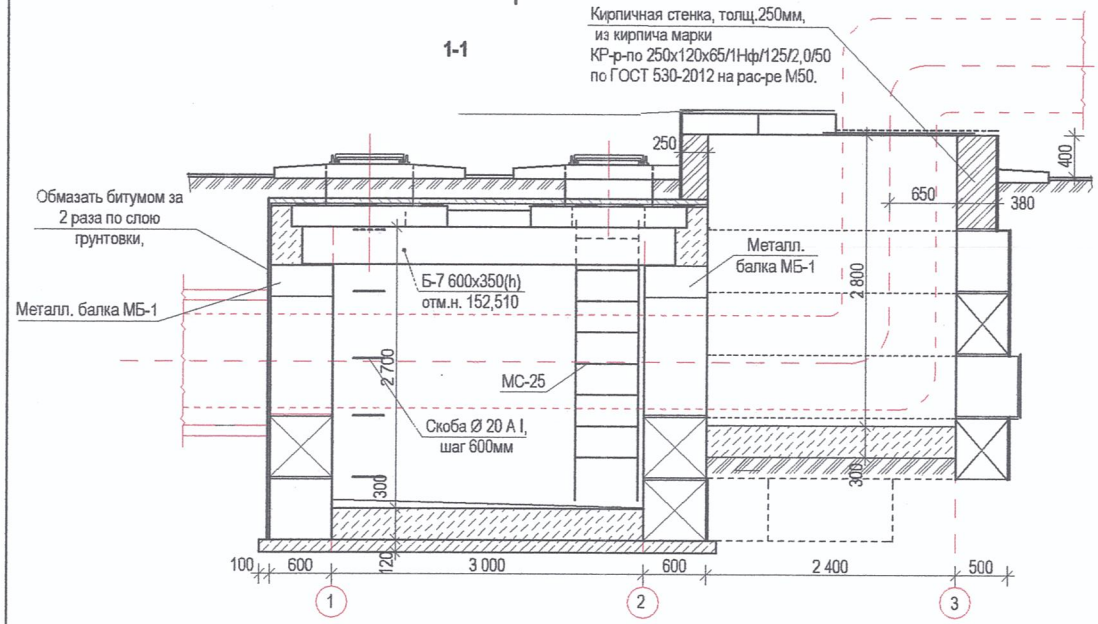

Выполнил начальник участка ТОО "Интерстиль" _____ Яцкив Н.В.
