Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«05» октября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазЕвроСтрой»,

БИН 050940013378, город Астана, район Есиль, улица Ә.Бөкейхана,10/1 н.п. 1

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Букенова Жаксыбека Болатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, город Экибастуз Павлодарской области»,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», руководитель Амерханов Архат Николаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) ТОО «Гидропром»,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Культуманов И.М.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) ТОО «СК ЭкоСтройГрупп»

в лице директора Жуман М.Б.,

в) ТОО «ГенПодряд-Z»

в лице директора Джаймагамбетов Д.Х.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «SOMET»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» №209 от 02.11.2021г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь торкретирования	м2	34560	-	34560	-
Насосный агрегат	м3/час.	250	-	250	-
Замена трубопроводов	м	195	-	195	-

Объект имеет следующие показатели:

5. Аэротенки представляют собой прямоугольное сооружение (железобетонный резервуар), заглубленного типа, с размерами 2х(72х24) м, рабочей глубиной 5 м, шириной коридора 6 м, с количеством коридоров 4 (в каждой секции). Объем аэрортенка – 8640 м3. Тип аэрации - среднепузырчатая пневматическая аэрация.

Существующие аэротенки состоят из двух условных секций (аэротенк №1, аэротенк №2), работающих по схеме с 25% регенерацией ила.

Осветленная вода с первичных отстойников по трубопроводу подачи осветленной воды, самотеком подается в верхний канал аэротенка. Далее осветленная вода, в верхнем канале распределяется между двумя секциями аэротенка и подается в начало второго коридора каждой секции, где смешивается с регенерированным активным илом. Образовавшаяся иловая смесь протекает по II, III, IV коридорам. В конце IV коридора иловая смесь переливается в канал вторичных отстойников, откуда она самотеком отводится через распределительную чашу во вторичные отстойники. После отделения ила от очищенной воды во вторичных отстойниках, рециркуляционный активный ил насосами, установленными в насосной станции возврата ила, по трубопроводу подается в коридор I каждой секции аэротенка.

В соответствии с дефектной ведомостью, утвержденной ГКП «Горводоканал» г.Экибастуза, в рамках рабочего проекта выполнены объемы работ по частичной замене технологического оборудования, а также участков трубопроводов, участвующих в технологическом цикле работы аэротенка, а именно:

- трубопроводы опорожнения ф 219 мм – 130 м;
- трубопроводы обвязки насосов обратного ила ф 159 мм – 10 м и трубопроводы подачи обратного ила ф 530 мм – 10 м;
- трубопровод подачи осветленной воды от первичных отстойников до аэротенка ф 1220 мм -10 м;
- трубопровод отвода очищенной воды во вторичные отстойники ф 1220 мм – 35 м;
- замена насосного агрегата возвратного ила НС2 100/255.2555-30/2-600;
- усиление стен, днища арматурой ф 10 А III с устройством торкрет-бетона толщиной 50 мм – 69328х2=138656 м2;
-устройство отмостки шириной 1 м из бетона – 384 м;
- замена креплений труб аэрации – 1020х2= 2040 шт;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным мате-риалам и к-онструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2022 г.; окончание работ сентябрь 2023 г.;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: - 6;
по норме или по проекту организации строительства – 6,0; фактически -15;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Горводоканал»: Красков С.Л.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения (не требуется)
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, город Экибастуз Павлодарской области»,**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «КазЕвроСтрой», Букенов Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П

Принципиальная технологическая схема насосной станции перекачки КОС г.Экибастуз

Согласовано
Гл.технолог ГКП "Горводоканал"
_____ Ярошенко П.И.

Утверждаю
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
_____ Амирханов А.Н.

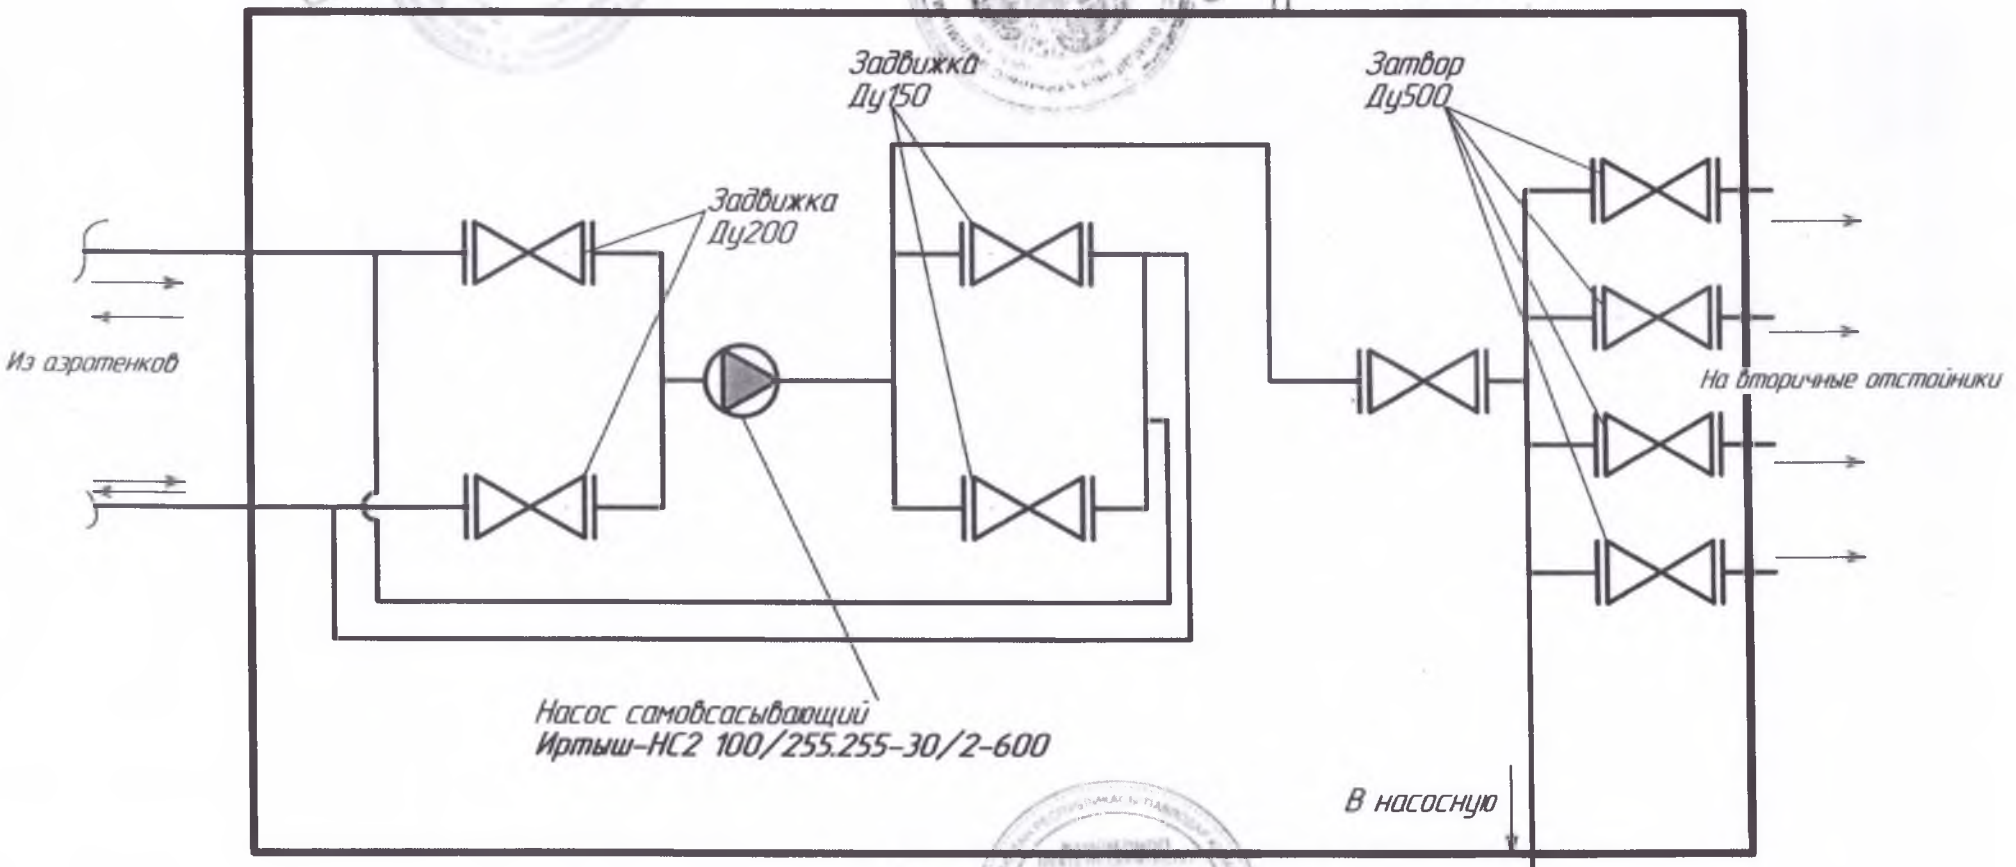

Разработал:
Инженер-конструктор ТОО "КазЕвростроЙ"
_____ Мулдашев У.М.

Экибастуз 21.09.2022
