Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632
Форма
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 07 2020 г.

Заказчик КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова» руководитель - Дауытбеков М.А., район Т.Рыскулова, с.Кулан, Жибек Жолы 75

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии « 24 » 07 2020 г. ТОО «Акмешит-Мелиоратор» в лице директора Шамахова Б.Ы., лицензия №0000939 от 02.07.2007 года, II-категория, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Туркистан №36, индекс 120000

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 24 » 07 2020 г. Договора на оказание технического надзора №28 от 10.03.2020 года, ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015» в лице директора - Умбеткалиев М.Т., инженер по техническому надзору - Умбеткалиев М.Т., KZ93VJE00026847 от от 07.11.2016 г., KZ50VJE00026845 от 07.11.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «24» 07 2020 г. Приказа на оказание авторского надзора №6 от 12.03.2020 года, ТОО «Табыс Жоба» в лице директора - Махатов Н.С., ГСЛ №13018968 от 22 ноября 2013 г. II -категория ГИП, главный инженер проекта - Егешов М.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Жамбылской области, района Т.Рыскулова, в а.Алгабас**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от « 15 » декабря 2017 года №19 права на землю выдано аппаратом акима Кумарыкского сельского округа района Т.Рыскулова

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации

негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» KZ44REA00165559 от 12.03.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Табыс Жоба» ГСЛ №13018968 от 22.11. 2013 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ от 08.04.2021, от 13.02.2021

месяц, год

окончание работ до 17.06.2021, до 24.07.2021

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3,5 (три с полов) месяц;

фактически 3 (три) месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба PE 100 d 110x5,3	км	10,053	10,053	10,196	10,196

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **земляные работы, основание песчаное под трубопроводы, укладка труб диам.100 мм, 25 мм и т.д., установка ж/б колодцев диам.1500, диам.2000, отмостка колодцев, установка вентилей, задвижек, счетчиков**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **113 240,314** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **101 107,424** тысяч тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
прочие расходы **12 132,891** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **101 916, 283** тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **90 996,681** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
прочие расходы **10 919,602** тысяч тенге;

бъект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и бованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и оительства.

РЕШИЛ:

«Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик, руководитель
КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова»
Дауытбеков М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор, директор
ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»
Умбеткалиев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор, директор
ТОО «Табыс Жоба»
Махатов Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик),
Директор «Акмешит-Мелиоратор»
Шамахов Б.Ы.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	10 196	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)из полиэтиленовых труб	м	10 196	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	4 989,91	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	506,75	
	5) из полиэтиленовых труб	м	4 483,16	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	80	
	Задвижка d-100	шт	9	
	Задвижка d-50	шт	8	
	Вентили d-25	шт	10	
	Вентили d-32	шт	21	
	Кран бабочка d-20	шт	120	
	Счетчики (водомеры) холодной воды d-20	шт	114	
	Фильтр для очистки воды d-20	шт	114	
	Гидрант Н-1000	шт	21	
	Водопроводный ввод	шт	2	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	28	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	

	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	
Горизонтальный разрез колодца		Вертикальный разрез колодца		
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	PE 100 SDR 17	полиэтилен	d25x2,4	4 483,16 м	
2	Труба	PE 100 SDR 17	полиэтилен	d32x2,4	148,4 м	
3	Труба	PE 100 SDR 17	полиэтилен	d40x3,0	247,24 м	
4	Труба	PE 100 SDR 17	полиэтилен	d50x3,7	111,11 м	
5	Труба	PE 100 SDR 21	полиэтилен	d110x5,3	10 196 м	
6	Задвижка	PN 10, d100	Чугунная фланцевая с обрезиненным клином	d100	9 шт.	
7	Задвижка	PN 10, d50	Чугунная фланцевая с обрезиненным клином	d50	8 шт.	
8	Гидрант пожарный		стальной	H=1000 мм	21 шт.	
9	Вентиль	15ч8р2, PN 16	латунь	d25	10 шт.	
10	Вентиль	15ч8р2, PN 16	латунь	d32	21 шт.	
11	Фильтр для очистки воды		чугунный фланцевый	d20	114 шт.	
12	Счетчики(водомеры) холодной воды крыльчатые	ВСКМ		d20	114 шт.	

13	Краны шаровые	бабочка	латунь	d20	120 шт.	

хема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

аказчик, руководитель
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова» - Дауытбеков М.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Авторский надзор, директор
ТОО «Табыс Жоба» - Махатов Н.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Приложение 5
к Рекомендуемому перечню
исполнительной и руководящей
документации геодезической
службы (геодезического отдела)

АКТ

сдачи-приемки геодезической основы для строительства
«Строительство водопроводных сетей в а. Алгабас, района Т.Рыскулова, Жамбылской области»

а. Алгабас, р-н. Т. Рыскулова " 8 " апреля 2020 г.
(место составления)

Комиссия в составе:
ответственного представителя заказчика КГУ « Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т. Рыскулова, Жамбылской области»
(фамилия, инициалы, должность)

ответственных представителей подрядной строительно-монтажной организации
ТОО «Еди-Мар Құрылыс» прораб Бердигалиев Б.
(фамилия, инициалы, должность)

рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства «Строительство водопроводных сетей в а. Алгабас, района Т.Рыскулова, Жамбылской области»
(наименование объекта строительства)

(наименование объекта строительства)

произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют предъявленной технической документации:
РП, Альбом-2.2, НВ, Водопроводные сети, лист-3-5, разработанного ТОО «Табыс-Жоба», г. Тараз- 2018 г.
(наименование организации-разработчика, номера чертежей, дата выпуска)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства трассы водопроводной сети от аула Кумарык до ауыла Алгабас с протяженностью-3.043 км..
(наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений)

Приложения: схематический чертеж трассы водоповода и каталог координаты.
(чертежи, ведомости и т.п.)

Представитель заказчика: (подпись)

Представители подрядчика:
производитель работ Бердигалив Б.
(подпись)

Работник геодезической службы Сулейменов Ж.И
(подпись)

Сулейменов Ж.И.

Приложение №6
к Рекомендуемому перечню исполнительной и руководящей документации геодезической службы (геодезического отдела)

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ с колодца 27 по ПГ.

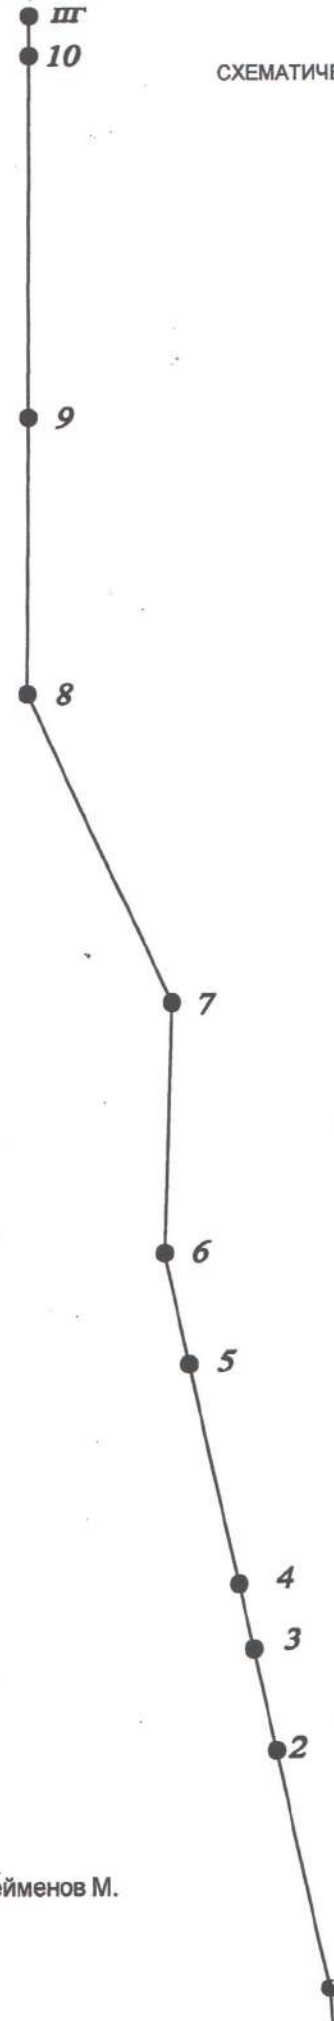

Координаты оси водопровода

№ точек	X	У	Н
кол 27	4761069.81	778841.37	808.4
1	4761139.68	778836.40	807.6
2	4761480.64	778757.31	808.2
3	4761626.69	778723.57	807.4
4	4791720.37	778701.85	805.4
5	4762040.75	778627.51	804.4
6	4762200.16	778590.46	803.2
7	4762560.12	778598.88	799.3
8	4763006.47	778382.37	793.2
9	4763406.52	778383.72	789.6
10	4763936.50	778385.50	785.9
ПГ	4763994.97	778385.69	785.0

Разбивку произвел _____ Сулейменов М.

Разбивку принял _____

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«24» 07 2020 г.

Технический надзор: **Директор ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015» - Умбеткалиев М.Т., г.Тараз, ул.Колбасшы Койгельди 95**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **инженер по техническому надзору - Умбеткалиев М.Т., KZ93VJE00026847 от от 07.11.2016 г., KZ50VJE00026845 от 07.11.2016 г.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №28 от 10.03.2020 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова» - Дауытбеков М.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Акмешит-Мелиоратор» ГСЛ № 0000939 от 02 июля 2007 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора ТОО «Акмешит-Мелиоратор» - Шамахова Бакытжана Ыбрашевича**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Еди-Мар Курылыс», ГСЛ-СМР № 000787**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора ТОО «Еди-Мар Курылыс» - Халиев А.А.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ от 08.04.2021, от 13.07.2021
месяц, год

окончание работ до 17.06.2021, до 24.07.2021
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3,5 (три с половиной) месяц;

фактически 3 (три) месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **113 240,314** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **101 107,424** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

очие расходы **12 132,891** тысяч тенге;

. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **101 916, 283** тыс.тенге, в том исле:

стоимость строительно-монтажных работ **90 996,681** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

прочие расходы **10 919,602** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Табыс Жоба» ГСЛ №13018968 от 22 ноября 2013 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **Директор ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015» - Умбеткалиев М.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору: **инженер по техническому надзору - Умбеткалиев М.Т., KZ93VJE00026847 от от 07.11.2016 г., KZ50VJE00026845 от 07.11.2016 г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

24.07.2020 Эксперт Жазыков М.О

подпись, дата

место для печати

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«24» 07 2020 г.

Авторский надзор **Директор ТОО «Табыс Жоба» - Махатов Н.С., г.Тараз, проспект Абая 149 кв 5**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Главного инженера проекта – Егешов М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **приказа №6 от 12.03.2020 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова» - Дауытбеков М.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Акмешит-Мелиоратор» ГСЛ № 0000939 от 02 июля 2007 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Шамахова Бакытжана Ыбрашевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Еди-Мар Курылыс», ГСЛ-СМР № 000787**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора ТОО «Еди-Мар Курылыс» - Халиев А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ~~от~~ 08.04.2021, ~~от~~ 13.07.2021
месяц, год

окончание работ ~~до~~ 17.06.2021, ~~до~~ 24.07.2021
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3,5 (три с полов) месяц;

фактически 3 (три) месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Табыс Жоба» ГСЛ №13018968 от 22 ноября 2013 г.
наименование проектной организации, номер проекта

ержденным (ой) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района ыскулова»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

торский надзор:

анизация **Директор ТОО «Табыс Жоба» - Махатов Н.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

сперт(ы) по авторскому надзору **главный инженер проекта – Егешов М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632
Форма

Декларация о соответствии

«24» 07 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор» Шамахов Б.Ы., г.Кызылорда ул.Туркистан №36**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Шамахова Бакытжана Ыбрашевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата района Т.Рыскулова» - Дауытбеков М.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Еди-Мар Курылыс», ГСЛ-СМР № 000787**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Табыс Жоба» ГСЛ №13018968 от 22 ноября 2013 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба PE 100 d 110x5,3	км	10,053	10,053	10,196	10,196

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
его квартир, том числе: нокомнатных ухкомнатных ехкомнатных тырехкомнатных более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **земляные работы, основание песчаное под трубопроводы, укладка труб диам.100 мм, 25 мм и т.д., установка ж/б колодцев диам.1500, диам.2000, отмостка колодцев, установка вентилей, задвижек, счетчиков**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ от 08.04.2021, от 13.04.2021

месяц, год

окончание работ до 17.06.2021, до 24.04.2021

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3,5 (три с лишним) месяц;

фактически 3 (три) месяц;

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют ованиям проекта и государственных нормативов;

сполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или ий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, доснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию екта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым сударственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по зультатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями ентрами)(экспертное заключение прилагается);

3. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной ащиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей в а.Алгабас района Т.Рыскулова Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор» **Шамахов Б.Ы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью _____ листов

ЖШС Алмашін-Мәлімет-Ақпарат ТОО

ЖШС Алмашін-Мәлімет-Ақпарат ТОО

ЖШС Алмашін-Мәлімет-Ақпарат ТОО
