Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 28 " октября 2022 года

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, тел.3968820, почтовый индекс 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «28» октября 2022 г., ТОО «Производственно-строительная фирма «Алонс», президент Нагайцев Владимир Викторович, Республика Казахстан, г.Алматы, Шанырак-1, ул. Отемисулы, 2/10, БИН 950740000160, тел.2789730

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «28» октября 2022 г., ТОО "Алматы сапа инжиниринг", генеральный директор Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, эксперт технического надзора – Иманкулова Айшолпан Сериковна, аттестат №KZ54VJE00040935 от 12.09.2018 г., БИН 140640001493, тел.87781166053

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «28» октября 2022г. ТОО «Казахский Промтранспроект», директор Аханов Арнур Раисович, эксперт авторского надзора - И.О.ГИПа_ Ефимченко Петр Геннадьевич, приказ №19/2-пр от 01.10.2020 г., БИН 931240000396, тел.250–77–98

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство пробивки пр.Абая от ул.Момышулы до ул.Ауэзова в мкр.Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети), рабочий проект, номер проекта 1875-РП, уровень ответственности объекта – II (нормальный, технически сложный объект)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Алматы, Ауэзовский район,пр.Абая от ул.Момышулы до ул.Ауэзова в мкр.Калкаман (2 участок)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «07» ноября 2014 года №4/924 Постановление Акимата города Алматы

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», 28.11.2017 г. №KZ22REA00079043, 11.12.2019 г. №KZ25REA00155522, 08.12.2020 г. №KZ73REA00202867, 08.12.21 г. №KZ09REA00255817, 28.06.22 г. №KZ75REA00282759, 01.09.22 г. №KZ64REA00293239

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Казахский Промтранспроект»,

Пробивка пр.Абая от ул.Момышулы до ул.Ауэзова в мкр.Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети), рабочий проект, номер проекта 1875-РП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) номер проекта 1875-РП, КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», №10-ПИР от 25.02.2016 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2017 г.

месяц, год

окончание работ октябрь 2022 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 14 ;

фактически, месяц 59 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Строительство пробивки пр.Абая от ул.Момышулы до ул.Ауэзова в мкр.Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети), в Ауэзовском районе города Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		I, магистральная улица общегородского значения регулируемого движения	I, магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
Протяженность улиц	м	1270	1270
Количество полос движения	шт	6	6
Ширина полосы движения	м	3,5; 4,0	3,5; 4,0
Ширина проезжей части	м	25	25
Ширина вспомогательного (местного) проезда	м	6	6
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		ЩМА	ЩМА
Автодорожный мост	шт	1	1
Надземные пешеходные мосты	шт	3	3
Блочно-модульная комплектная двух трансформаторная подстанция (ТП №6 и ТП № 7400)	шт	2	2

Общая протяженность газопровода	м	1028	1028
Общая протяженность линии связи	м	840,3	840,3
Протяженность трубопроводов по: водопроводу канализации	м м	432 387	432 387

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 6 полос движения, с разделительной полосой, дорожная одежда на основной проезжей части - капитального тип с асфальтобетонным покрытием ЩМА. Для организации движения с местных улиц предусмотрены вспомогательные проезды шириной 6 м, асфальтобетонное покрытие из мелкозернистого асфальтобетона.
Через реку Карагайлы предусмотрен однопролетный мост по схеме 1х21,0 м, габарит моста 2х(Г-16,5)+2х5 м Длина моста – 22,03 м, ширина моста – 49,6 м. Сборные железобетонные балки пролетных строений ВТК-21у таврового сечения (35 балок). С двух сторон пр.Абая предусмотрены тротуары шириной 3 м и велосипедные дорожки шириной 2м. Для выпуска воды с проезжей части в гранитных бордюрах предусмотрены разрывы для водосбросных лотков. Для отвода поверхностных вод предусмотрена открытая арычная сеть из сборных железобетонных лотков Б-3-1, а под съездами и примыканиями предусмотрены водопропускные трубы д=0,5м. Для пропуска воды через пр.Абая предусмотрены железобетонные трубы д=1 м.Для очистки поверхностных вод предусмотрены два локальных очистных сооружения ЛОС-1 и ЛОС-2. На пр.Абая предусмотрено 6 остановок для общественного транспорта.Построены три надземных пешеходных перехода из неразрезных металлических пролетных строений по схеме – 17,9+33+17,9м. Для маломобильных групп населения предусмотрены подъемники. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов произведена установка дорожных знаков и дорожная разметка проезжей части. Установлено барьерное и перильное ограждение.На пересечении с ул. Яссауи построен светофорный объект.Электроснабжение и освещение на участке от ПК35 до ПК 43+50 выполняется от двух-трансформаторной подстанции 10/04 кВ ТПП№ 6, совмещенной с электрощитовой. Питание электроосвещения от ПК43+50 до ПК47+50 выполняется от построенной щитовой наружного освещения и от ТПП№7400. Электропитание ТП №6 осуществляется КЛ-10кВ от ТП 7123. Распределительная сеть наружного освещения выполнена в земле, кабелем АВВГ в полиэтиленовых трубах. Произведен вынос кабельных линий 10кВ и ВЛ-04 кВ попадающих в зону строительства дороги. Освещение выполнено светильниками, установленные на опорах. Установлены унифицированные стальные анкерно-угловые опоры типа У220-2+9.Произведен вынос сетей телекоммуникаций. Построена телефонная канализация из полиэтиленовых труб д=110мм, емкостью блоков 2 и 4,6 каналов.
Переустроены сети водопровода и канализации.Переустройство сетей газопровода выполнено перекладкой существующих участков газопровода среднего и низкого давления, попадающих в зону строительства.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 3 596 033,36 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 811 968,65 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 173 234,23 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 252 330,412 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2 530 959,082 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 175 365,706 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 85.1% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Пробивка пр.Абая от ул.Момышулы до ул.Ауэзова в мкр.Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети) в Ауэзовском районе города Алматы

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик КГУ **«Управление городской мобильности города Алматы»**

Руководитель Мурзаханов Г.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П.

Заместитель руководителя Абжахан Е.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись М.П.

Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Желдикбаев А.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись М.П.

Технический надзор **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Генеральный директор Дайырманов Р.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, дата М.П.

Аттестованный эксперт Иманкулова А.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

подпись, дата М.П.

Авторский надзор **ТОО «Казахский Промтранспроект»**

Директор Аханов А.Р.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору И.О.ГИПа Ефимченко П. Г.

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Производственно-строительная фирма «Алонс»

Президент Нагайцев В.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"28" октябрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Производственно-строительная фирма «Алонс», Республика Казахстан, г.Алматы, Шанырак-1, ул. Отемисулы, 2/10
наименование организации, юридический адрес

в лице президента Нагайцева Владимира Викторовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство пробивки пр.Абая от ул.Момышулы до ул.Ауэзова в мкр.Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети), в Ауэзовском районе города Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Электроремонт», ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой», ТОО «СМУ-Телефонстрой», ТОО «СМЭУ Алматы», ТОО «Жил Строй Прогресс», ТОО «Капшагайская Мостостроительная Компания», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», ТОО «DEN-Group Plus»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Пробивка пр.Абая от ул.Момышулы до ул.Ауэзова в мкр.Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети),
ТОО «Казахский Промтранспроект», рабочий проект, номер проекта 1875-РП
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №10-ПИР от 25.02.2016 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство пробивки пр.Абая от ул.Момышулы до ул.Ауэзова в мкр.Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети), в Ауэзовском районе города Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		I, магистральная улица общегородского значения регулируемого движения	I, магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
Протяженность улиц	м	1270	1270
Количество полос движения	шт	6	6
Ширина полосы движения	м	3,5; 4,0	3,5; 4,0
Ширина проезжей части	м	25	25
Ширина вспомогательного (местного) проезда	м	6	6
Ширина тротуара	м	3	3
Ширина велосипедных дорожек	м	2	2
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		ЩМА	ЩМА
Автодорожный мост	шт	1	1
Длина моста	м	24,03	24,03
Габариты моста	м	2х(Г-16,5)+2х5,0	2х(Г-16,5)+2х5,0
Общая ширина пролетного строения моста	м	49,6	49,6
Схема моста		1х21,0	1х21,0
Надземные пешеходные мосты	шт	3	3
Общая длина пешеходных мостов	п.м	204,2	204,2
Ширина прохожей части пешеходных мостов	м	3	3
Общая ширина пролетного строения мостов	м	3,7	3,7
Схема мостов ПК40+67,ПК44+68 ПК 37+49	п.м п.м	17,9+33+17,9 17,9+33+15,7	17,9+33+17,9 17,9+33+15,7
Количество устанавливаемых опор для наружного освещения	шт	117	117

Количество светильников типа LED	шт	313	313
Протяженность трасс наружного освещения 0,4кВ силовой кабель АВВГ	км	10,86	10,86
Шкаф управления наружного освещения	шт	2	2
Щитовая наружного освещения (площадь)	М2	14,4	14,4
Блочно-модульная комплектная двух трансформаторная подстанция (ТП №6 и ТП № 7400)	шт	2	2
Протяженность трассы КЛ 10 кВ (к ТП № 6) кабель АСБ 3х150	км	1,433	1,433
Переустройство КЛ 10 кВ кабель АСБ	км	2,44	2,44
Переустройство КЛ110 кВ	км	1,41	1,41
Опоры анкерные угловые	шт	2	2
Общая протяженность газопровода	м	1028	1028
Общая протяженность линии связи	м	840,3	840,3
Протяженность трубопроводов по: водопроводу канализации	м м	432 387	432 387
Протяженность трубопроводов поливочного водопровода	км	11	11

Жилой дом имеет следующие показатели: Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, 6 полос движения, с разделительной полосой, дорожная одежда на основной проезжей части - капитального тип с

асфальтобетонным покрытием ЩМА. Для организации движения с местных улиц предусмотрены вспомогательные проезды шириной 6 м, асфальтобетонное покрытие из мелкозернистого асфальтобетона. Через реку Карагайлы предусмотрен однопролетный мост по схеме 1х21,0 м, габарит моста 2х(Г-16,5)+2х5 м Длина моста – 22,03 м, ширина моста – 49,6 м. Сборные железобетонные балки пролетных строений ВТК-21у таврового сечения (35 бвлок). Проезжая часть отделена от тротуара металлическим барьерным ограждением, тротуар защищен металлическими перилами с внешней стороны.

С двух сторон пр.Абая предусмотрены тротуары шириной 3 м и велосипедные дорожки шириной 2м.

Для выпуска воды с проезжей части в гранитных бордюрах предусмотрены разрыва для водосбросных лотков. Для отвода поверхностных вод предусмотрена открытая арычная сеть из сборных железобетонных лотков Б-3-1, а под съездами и примыканиями предусмотрены водопропускные трубы д=0,5м. Для пропуска воды через пр.Абая предусмотрены железобетонные трубы д=1 м.

Для очистки поверхностных вод предусмотрены два локальных очистных сооружения ЛОС-1 и ЛОС-2. Оборудование ЛОС выполнено из армированного стеклопластика включает в себя распределительную камеру-колодец, комбинированный песно-нефтеуловитель с сорбционным блоком, соединительную камеру-колодец. На выходе из ЛОС предусмотрены две накопительные емкости на 100 м3 каждая из которых очищенные стоки в дальнейшем используются для полива. Для защиты зоны очистных сооружений предусмотрено ограждение. Для обслуживания построены площадки и подъезд.

На пр.Абая предусмотрено 6 остановок для общественного транспорта.

Построены три надземных пешеходных перехода из неразрезных металлических пролетных строений по схеме – 17,9+33+17,9м, ширина прохожей части 3 м. Для маломобильных групп населения предусмотрены подъемники.

Для ориентирования слепых пешеходов у надземных пешеходных переходов и на автобусных остановках предусмотрены направляющие и предупреждающие полосы из специальной тактильной плитки.

Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов произведена установка дорожных знаков и дорожная разметка проезжей части. Установлено барьерное и перильное ограждение.

На пересечении с ул. Яссауи построен светофорный объект. Технические средства организации движения выполнены на консолях. С внедрением новых програмно-адаптивных методов управления движением в г.Алматы установлен контролер Euro.

Произведено озеленение участка – посажены лиственные и хвойные деревья, кустарники, посеян газон. На крутых местах и откосах предусмотрена одерновка. Для своевременного орошения зеленых насаждений проложен подземный поливочный водопровод.

Электроснабжение и освещение на участке от ПК35 до ПК 43+50 выполняется от двух-трансформаторной подстанции 10/04 кВ ТПП№ 6, совмещенной с электрощитовой. Питание электроосвещения от ПК43+50 до ПК47+50 выполняется от построенной щитовой наружного освещения и от ТПП№7400. Электропитание ТП №6 осуществляется КЛ-10кВ от ТП 7123. Распределительная сеть наружного освещения выполнена в земле, кабелем АВВГ в полиэтиленовых трубах. Произведен вынос кабельных линий 10кВ и ВЛ-04 кВ попадающих в зону строительства дороги. Освещение выполнено светильниками, установленные на опорах. Установлены унифицированные стальные анкерно-угловые опоры типа У220-2+9. Для обслуживания трансформаторной подстанции и щитовой наружного освещения построены площадки и подъезд.

Произведен вынос сетей телекоммуникаций. Построена телефонная канализация из полиэтиленох труб д=110мм, емкостью блоков 2 и 4,6 каналов.

Переустроены сети водопровода из стальных электросварных труб, трубопроводы под дорогой проложены в футлярах.

Переустроены сети канализации из полиэтиленовых и асбоцементных труб, трубопроводы под дорогой проложены в футлярах из стальных труб.

Переустройство сетей газопровода выполнено перекладкой существующих участков газопровода среднего и низкого давления, попадающих в зону строительства.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ноябрь 2017 г.
месяц, год

окончание работ октябрь 2022 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 14 месяц;

фактически 58 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 85.1% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», и.о. руководителя Мысик И.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «АЖК», и.о. заместителя председателя Правления, главный инженер Сагындыков Б.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АлПФ АО «КазТрансГаз-Аймак», первый заместитель директора Омарбеков Ш.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР города Алматы заместитель генерального директора-директор по производству Юсупов А.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ДЭСД «Алматытелеком» ОДС, директор Туганбаев С.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы», заместитель начальника Укажанов А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Пробивки пр.Абая от ул.Момышулы до ул.Ауэзова в мкр.Калкаман (2 участок) (Строительство улично-дорожной сети), в Ауэзовском районе города Алматы

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Производственно-строительная фирма «Алонс», президент Нагайцева Владимир Викторович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации
ТОО «Электроремонт», директор Шаяхметов Болат Кайыпбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «СМУ Телефонстрой», директор Дмитриенко Владимир Петрович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «СМЭУ Алматы», исполнительный директор Тустикбаев Ерлан Рейсенгалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой», директор Елеусизов Нурлан Сагибекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «Жил Строй Прогресс», директор Салимжанова Медета Майлыбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «Капшагайская Мостостроительная Компания», генеральный директор Тен Родион Вячеславович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», генеральный директор Ча Юрий Владимирович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «DEN-Group Plus», директор НуртазинАскар Аблаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

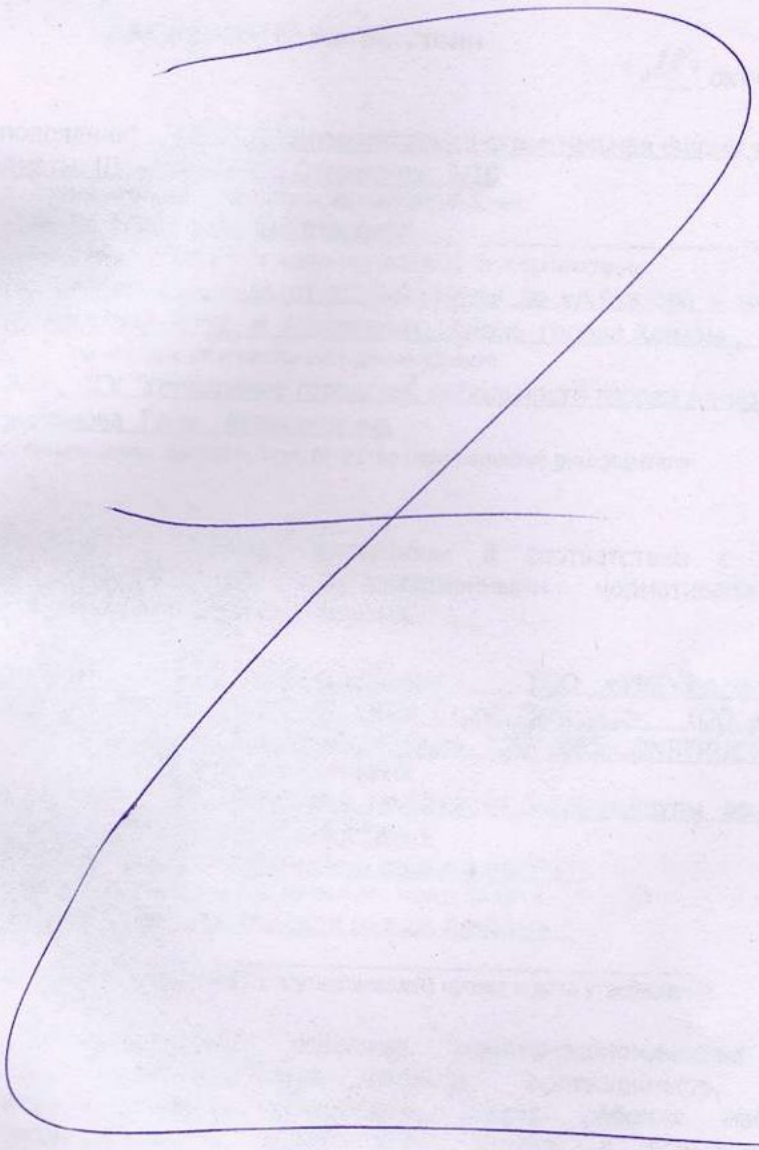

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

_____ листов

_____ подпись
