Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» декабря **2023 г.**

Заказчик: Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" - Айбергенов К. И.; БИН 110140003634, ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «27» декабря 2023 г. ТОО «ДАНЕКЕР» в лице директора Искакова Б. А., Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, ул. Шевченко, 38, БИН 921240000219

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «27» декабря 2023 г. ТОО «Муз Тау», инженер по техническому надзору – Боскымбаев Д.Б., аттестат №KZ48VJE00039297 от 02.07.2018 г., БИН 050840001510.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО "Строительная группа "Архитектор" «27» декабря 2023 г., инженер по авторскому надзору - Абуов С. А., БИН 050140000785.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО», технический не сложный, II (нормальный)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **с.Улкен Енбек Теректинского района Западно-Казахстанской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

- 1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

решение Акима Аксогумского сельского округа № 2 от 16.01.2020 года;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» KZ47REA00217885 от 16.04.2021 г.; KZ42REA00323220 от 17.03.2023 г.**_____

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Строительная группа "Архитектор", №58-2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терекинского района", № 53 от 22.04.2020 года**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2021 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _____месяца;

фактически _____месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ 100 SDR 17 - 75х4,5	м	5118,4		5118,4	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6	м	5652,6		5652,6	
Труба ПЭ 100 SDR 21 Ø160х7,7	м	31		31	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8	м	111		111	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø32х2,4	м	2044		2044	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø25х2,3	м	2904		2904	
Водопроводные колодцы Ø1,5 м	шт.	73		73	
Водопроводные колодцы Ø2,0 м	шт.	1		1	
Водопроводные колодцы 2,5х2,5 м	шт.	4		4	
Пожарный гидрант	шт.	29		29	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-

Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Данным проектом для водоснабжения села предусмотрено проектирование сетей водопровода к границам земельных участков водопотребителей и подведение до зданий объектов социально-культурного быта. Система водоснабжения - хозяйственно-питьевая. Проектом предусмотрена закольцовка сетей. Система водоснабжения села Улкен Енбек по степени обеспеченности относится к III категории. Существующая схема движения воды следующая: вода из скважин насосами 1-го подъема по водоводу подается на водопроводную площадку, где подается на установку очистки воды, затем в резервуары чистой воды. Оттуда очищенная и обеззараженная вода насосами 2-го подъема подается в водонапорную башню и в поселковые сети. Водопроводная сеть - кольцевая с тупиковыми ответвлениями. В настоящем проекте предусматривается- бурение рабочей и резервной скважин на проектируемом водозаборе, водовода, площадки водопроводных сооружений, внутрипоселковые водопроводные сети с индивидуальным подводом к каждому дому. Схема работы площадки водозаборных сооружений следующая - вода от скважин с помощью насосов 1-го подъема подается в водовод. По водоводу сырой воды В9 вода подается на площадку водопроводных сооружений. Для приема воды от насосных станций 1-го подъема, хранения регулирующего и противопожарного, аварийного запасов воды предусмотрено строительство резервуаров чистой воды (РЧВ). Из резервуаров по отводящим трубопроводам

вода забирается насосами 2- го подъема. Сброс дренажных вод в насосной станции осуществляется в существующий приямок с последующим сбросом выпуском на рельеф дренажным насосом типа «ГНОМ-6-10». Обвязка насосов предусмотрена из стальных электросварных труб и фасонных частей

Схема работы площадки водопроводных сооружений следующая - вода от площадки водозаборных сооружений подводится к установке очистки воды. После очистки вода подается в резервуары чистой воды откуда насосной станцией второго подъема подается по трубопроводам в водонапорную башню и в водопроводную сеть. Отвод производственных стоков от установки очистки предусматривается в выгреб с дальнейшим их вывозом в места согласованные СЭС. Спуск и перелив воды из резервуаров чистой воды предусматривается в мокрый колодец с дальнейшей откачкой на рельеф. Внутриплощадочные сети водопровода (В9, ПД, ОТ, В1) и канализации (К3, ПР, СП) запроектированы из стальных электросварных (по ГОСТ 10704-91) и частично из полиэтиленовых труб (по ГОСТ 18599-2001). Для приема воды от скважин, хранения регулирующего аварийного и контактного запасов воды предусмотрено строительство водонапорной башни по типовому проекту ТП РК 15-100 ВБ-2009. Территория площадки водозаборных сооружений ограждается глухой оградой. Дорожное покрытие на территории участка - асфальтобетонное покрытие.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **536 686,173** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **435 697,869** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **43 361,355** тысяч тенге;

прочие расходы **57 626,949** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **507 611 399 тенге 95 тиын**, в том числе: стоимость строительно-монтажных **483017555 тенге 66 тиын**; (оборудования, инструмента и инвентаря - 43 361 355 тенге; прочих работ и затрат 92183000тенге), стоимость технического надзора **14780337 тенге 88 тиын**, стоимость авторского надзора **6010884тенге 32 тиын**, проектно-сметная документация **2550000 тенге 01 тиын**, экспертиза **1252622 тенге 08 тиын**.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактический применено 90 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Терективского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Терективского района" Айбергенов К. И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1. аккредитованная организация:
ТОО «Муз Тау»
Директор Боксымбаев Д. Б.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.
2. аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Боксымбаев Д. Б.
KZ48VJE0003927 от 02.07.2018 г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Авторский надзор:

1.разработчик проекта
ТОО «Строительная группа «Архитектор»
Инженер по авторскому надзору Абуов С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2.организация:
ТОО «Строительная группа «Архитектор»
Директор
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ДАНЕКЕР»
Искаков Б.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Насосная станция второго подъема	1		1	50,38	265,42	63,1688		50,38		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточный монолитный	кирпич	Мягкая из рулонных материлов	Электро-радиатор					

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади	Распределение квартир по числу комнат

в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бара ках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы
2. Экспликация к поэтажным планам

Насосная станция

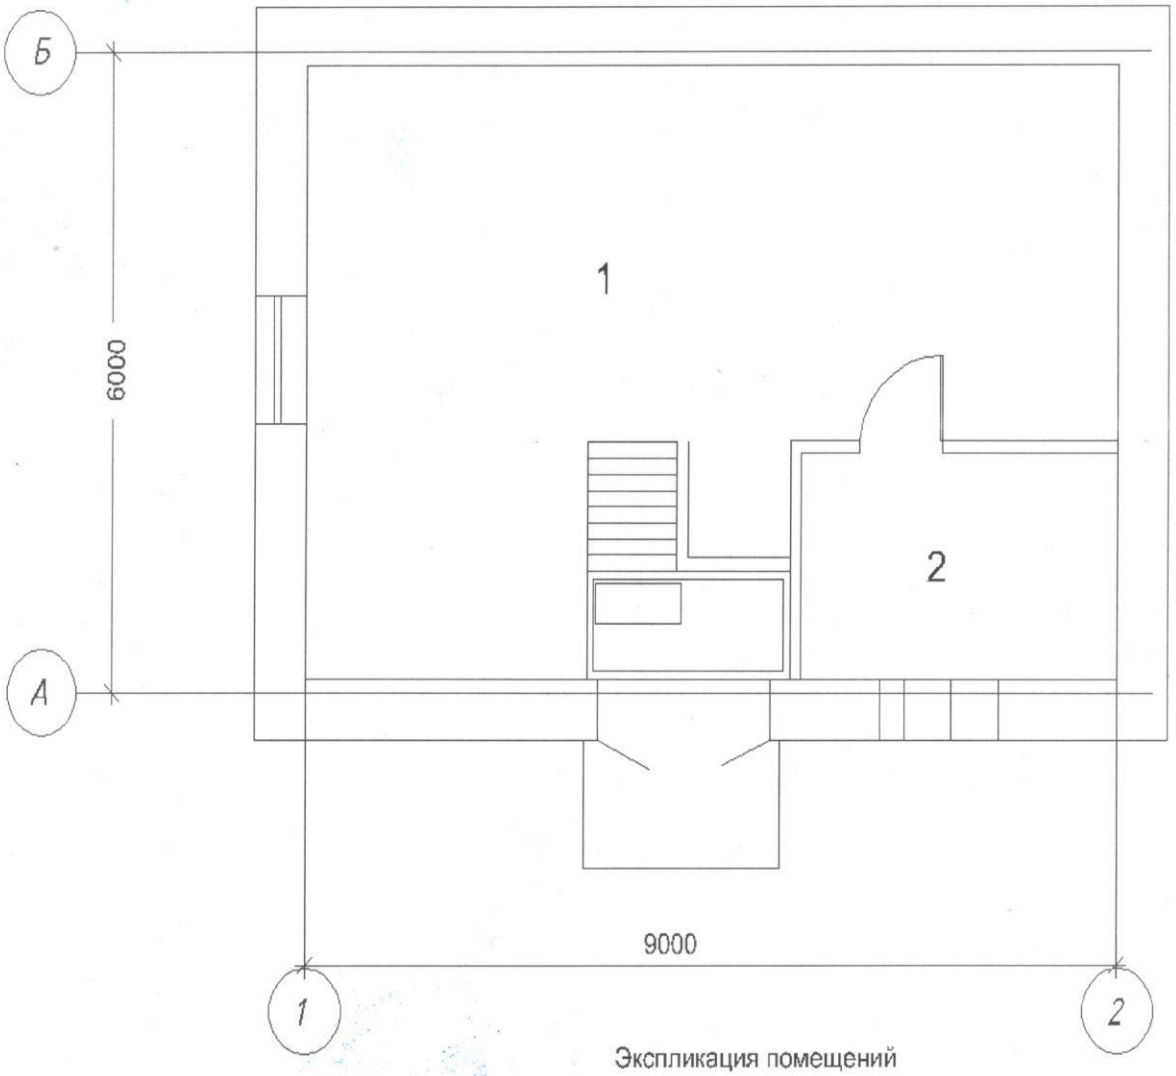

Экспликация помещений

Поз.	Наименование
1	Насосная
2	Дизель генераторная

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
10500		27,33	27,33	302,00	30,00	
5624,00		389,68	389,68	455,00	25,44	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				4779,32	4779,32				

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Ленточный монолитный из бетона кл.В15 по бетонной подготовке толщ.100мм на сульфатостойком цементе
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Кирпич с утеплением
	2) перегородки		
3	Перекрытия	чердачное	Из ЖБ круглопустотных плит
		междуэтажное	-
4	Крыша		Мягкая кровля из рулонных наплавляемых материалов
5	Полы	1-го этажа	Подстилающий слой из бетона В7,5, бетонное покрытие кл.В15
		последующих этажей	-
6	Проемы	окна	металлопластиковые
		двери	Ворота металлические с заполнением из сэндвич-панелей
7	Отделочные работы	внутренние	Штукатурка ЦПР, покрытие известью, шпатлевка гипсом, покраска водоэмульсией
		наружные	Обыкновенная штукатурка с декоративным покрытием «Аспол А-100 Короед» с последующей окраской поливинилацетатным составом
	Горячее водоснабжение		-
9	Водопровод		Из стальных труб Д108мм, Д76мм, Д57мм
10	Канализация		Из пвх трубы безнапорной Д50мм
11	Электроосвещение		Светильники светодиодные, светильники с люминисц.лампами

12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		Отопление состоит из электрических радиаторов
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек	
	Выгреб	Уборная на 1 очко
Площадь (м 2)	25,44	3,4
Высота строения (м)	5,05	2,93
Объем строения (м 3)	75	15,5
Фундамент	ЖБ	ЖБ
Стены	бетон	кирпич
Перекрытия	бетон	бетон
Крыша	бетон	Профн.
Полы	бетон	Дерев.
Окна	-	-
Двери	-	Дерев.
Внутренняя отделка	Пенетрон	-

Наружная отделка	гидроизол	штукатурка							
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
Резервуары для воды	2x24	2x12	2x312	2/3	2x1000	ЖБ

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	

наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	

	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик:

Айбергенов К. И.

фамилия, имя, отчество

подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор

Абуов С.

фамилия, имя, отчество

подпись эксперта

М.П.

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	Км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения ...	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения...	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	149
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	24
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	

	2) светильники с ртутными лампами	шт		
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт		24
10	Кабели:			
	1) марки... напряжением... 0,4кВ	км		
	СИП-4 2*16мм2	км		0,7085
	ВВГ 3*1,5(ок)-0,66	км		0,005
	ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,054
	ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км		0,01
	ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км		0,01
	АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,102
	АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км		0,084
	АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км		0,053
	АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км		0,068
	АВБбШв 5х35 (мк)-0,66	км		0,073
	АВБбШв 5х50 (мк)-0,66	км		0,048
	АВБбШв 5х2,5 (мк)-0,66	км		0,108
	ВВГнг	км		0,314
	2) марки... напряжением... 10кВ	км		
	СИП-3 1х50-20мм2	км		5,128
11	Муфты соединительные...	шт		21,8
12	Муфты концевые	шт		18
13	Контуры заземления	шт		
14	Устройства грозозащиты	шт		
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:			
	1) асфальтобетонные	м 2		
	2) булыжные	м 2		

	3) тротуары	м 2	

Заказчик:

Айбергенов К. И.

фамилия, имя, отчество *подпись руководителя*

М.П.

Авторский надзор

Абуов С.

фамилия, имя, отчество *подпись эксперта*

М.П.

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	14949,99	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	490	
	щебеночное покрытие	м2	1180	
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		

7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт	77	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт	2337,95	
14	цветники			
15	газоны	м2	14949,99	
16	порода деревьев		клен татарский	
17	возраст	год	высотой от 1м до 2м	

Заказчик:

Айбергенов К. И.

фамилия, имя, отчество

подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор

Абуов С.

фамилия, имя, отчество

подпись эксперта

М.П.

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	15861	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб Д160мм	м	31	
	6) из полиэтиленовых труб Д110мм	м	5652,6	
	7) из полиэтиленовых труб Д75мм	м	5118,4	
	8) из полиэтиленовых труб Д63мм	м	111	
	9) из полиэтиленовых труб Д32мм	м	2044	
	10) из полиэтиленовых труб Д25мм	м	2904	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5)	м	-	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	74	

	Задвижка d-	шт	117	
	" d- 50	шт	59	
	" d- 65	шт	7	
	" d- 100	шт	51	
	Вентили d- 15мм	шт	2	
	" d- 20мм	шт	107	
	" d- 50мм	шт	28	
	Кран d- 20мм	шт	9	
	" d- 15мм	шт	5	
	" d- 20	шт	2	
	Гидрант	шт	29	
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		

	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____
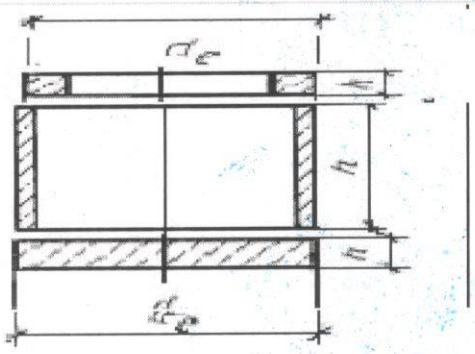	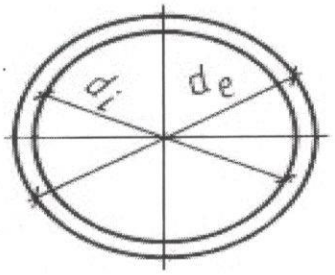

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Колодец из сборных ж/б элементов Ø1500	Серия 3.9001-14	железобетон	1500мм	73	
2	Колодец из сборных ж/б элементов Ø2000	серия 3.9001-14	железобетон	2000мм	1	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик:

Айбергенов К. И.

фамилия, имя, отчество

подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор

Абуов С.

фамилия, имя, отчество

подпись эксперта

М.П.
