Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" 11 2023 года

Заказчик ТОО «Жумабек Агро», БИН 150140025107, местонахождение по адресу: 140611, РК, Павлодарская область, Железинский район, село Жана жулдыз, Центральная, 36А

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «20» 11 2023 года ТОО «Ertis Art Servis», директор Мажит К., РК, Павлодарская область, город Павлодар, улица Малая Объездная, 8, БИН 990740013427**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от "20" 11 2023 года ТОО «Павлодар Технадзор», РК, Павлодарская область, город Павлодар, Макажанова, 47, в лице Кажмуратова М.К. KZ73VJE00030505 от 15.09.2017 г. БИН 180540012036**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **"20" 11 2023 года, ТОО «Концерн АЙ-СУ», РК, Павлодарская область, город Павлодар, улица Братьев Дюсембиновых, д. 1/5, директор Батырбеков Е.К., KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 года, БИН 030140001353**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 841,0 га для ТОО «Жумабек Агро» в районе села Железинка Железинского района Павлодарской области», II-го технически и технологический не сложного уровня ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **район села Железинка Железинского района Павлодарской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Постановление Аппарат акима Железинского района по предоставлению земельного участка № 276/10 от 17.10.2023 года, Постановление Аппарат акима Железинского района по предоставлению земельного участка № 277/10 от 17.10.2023 года, Постановление Аппарат акима Железинского района по предоставлению земельного участка № 278/10 от 17.10.2023 года, Постановление Аппарат акима Железинского района по предоставлению земельного участка № 279/10 от 17.10.2023 года, Постановление Аппарат акима Железинского района по предоставлению земельного участка № 280/10 от 17.10.2023 года, Постановление Аппарат акима Железинского района по предоставлению земельного участка № 281/10 от 17.10.2023 года, Постановление Аппарат акима Железинского района по предоставлению земельного участка № 282/10 от 17.10.2023 года, ПРИКАЗ Отдел земельных отношений Железинского района Об утверждении землеустроительных проектов по формированию земельных участков № KZ82VBG01286335 от 22.08.2023 г. ПРИКАЗ Отдел земельных отношений Железинского района Об утверждении землеустроительных проектов по формированию земельных участков № KZ81VBG01286353 от 22.08.2023 г.** документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области" № KZ10REA00337570 от 17.06.2023**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Концерн АЙ-СУ», №б/н**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Жумабек Агро»**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023 г.**;
окончание работ **ноябрь 2023 г.**;
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: общая протяженность оросительной сети 8 150 метров, уровень ответственности – 2, категория пожароопасности – Г.

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
водовод	м	8 150	8 150	8 150	8 150
насосная станция	шт.	1	1	1	1
ЛЭП	м	10934	10934	10934	10934
КТП 40/10-0,4	шт.	2	2	2	2
КТП 25/10-0,4	шт.	1	1	1	1
КТП 1000/10-0,4	шт	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1 комнатных 2комнатных 3комнатных 4комнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- подача воды предусмотрена насосной станцией блочно-контейнерного типа из реки Иртыш общим расходом Q=1480м3/ч и напором Н=98,0 м. Контейнер устанавливается на плавучем понтоне размером 14,0х6,5м. В контейнере предусмотрена 2 насоса марки GSX250-610M-40-380-2Ч-С-300+300, расходом Q=1480м3/ч и напором Н=98,0м мощностью N=315кВт каждый. Каждый насос имеет свою всасывающую и напорную линии. Всасывающие и напорные трубопроводы из стальных труб диметром Ø477х8,00мм (всасывающие) и Ø325х8,00мм (напорные). На всасывающих трубопроводах установлены рыбозащитные оголовки РОП-300 - 2шт. Для подачи воды на орошение наружные сети приняты тупиковыми из полиэтиленовых напорных труб, магистральный трубопровод Ø560х33,2 мм и Ø400х23,7мм SDR17 трубопроводе. Поливные трубопроводы приняты согласно гидравлического расчета диаметром Ø315х18,7мм мм. Для обслуживания насосной станции предусмотрен переходной мостик до рабочей площадки. Предусмотрены трубы полиэтиленовые PE100, SDR17 СТ РК ISO 4427-2-20144 Ø560х33,2 мм протяженностью 2787 м, Ø400х23,7 мм протяженностью 211 м, Ø315х18,7мм протяженностью 4603,0м, Ø200х11,9 мм протяженностью 375 м. Заглубление трубопровода Ø560 мм от 1,2 м до 1,5 м. Колодцы на трассе трубопровода из сборных ж/бетонных элементов по серии 3.900-3, в.7. В начале каждого распределительного и поливного трубопроводов установлены задвижки в колодцах. В повышенных точках и переломах трубопровода установлены вантузные гидранты Ø50 мм для впуска и выпуска воздуха при заполнении и опорожнении трубопровода. В пониженных местах трубопровода установлены гидранты опорожнения трубопроводов на зимний период и в момент ремонта трубопроводов. Гидранты опорожнения из стояка Ø150 мм, через который производят откачку воды из трубопровода насосом. Полив на участке предусмотрен дождевальными машинами кругового действия. радиусом R= 580,0м, площадь полива составляет 105,59га, расход каждой машины -97,86л/с, всего таких машин-6штук. Радиусом R= 240,0м, площадь полива составляет 18,03га, расход каждой машины -20,05л/с, всего таких машин-2штуки. Общая площадь полива нетто составляет-669,60га. Предусмотрены строительство КЛ 10 кВ, установка КТПН 1000/10/0,4. Подключение КЛ-10 кВ к источнику электроснабжения выполняется от проектируемой КТП-4000/35/0,4 кВ. Подключение дождевальных машин выполняется от ШУ ДМ. Питание ШУ ДМ предусматривается от КТПН, с установкой ящиков с пакетным выключателем на опорах 0,4 кВ. От ящиков с пакетным выключателем до ШУ ДМ проложен кабель 0,4 кВ марки АВБбШв. Кабельная линия выполнена кабелем марки ААШв-3х50. Кабель прокладывается в земле на глубине 1 м от планировочных отметок. По всей трассе кабель защищен. При пересечении с водоводом, кабель защищен трубой ПНД-110. По всей длине кабельной трассы, установлены соединительные муфты. Кабель 0,4 кВ от ящика до шкафа управления ДМ прокладывается в земле на глубине 1 м при прохождении по пахотным землям и в трубе ПНД110. КТПН выполнен согласно расчетной мощности дождевальных машин. КТПН мощностью 40 кВА. Фундаменты под КТПН,

ограждение КТПН из железобетонных блоков.Все электромонтажные работы выполнены согласно действующих ПУЭ и СНиП РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 767 254 196,03 (семьсот шестьдесят семь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи сто девяноста шесть) тенге (три) тиына, в том числе материалы и оборудование 378 028 068 (триста семьдесят восемь миллионов двадцать восемь тысяч шестьдесят восемь) тенге, услуги 20 175 290 (двадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч двести девяносто) тенге за счет Заказчика, работы и материалы 369 050 838,03 (триста шестьдесят девять миллионов пятьдесят тысяч восемьсот тридцать восемь) тенге (три) тиына ТОО «Ertis Art Servis»;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 767 254 196,03 (семьсот шестьдесят семь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи сто девяноста шесть) тенге (три) тиына, в том числе материалы и оборудование 378 028 068 (триста семьдесят восемь миллионов двадцать восемь тысяч шестьдесят восемь) тенге, услуги 20 175 290 (двадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч двести девяносто) тенге за счет Заказчика, работы и материалы 369 050 838,03 (триста шестьдесят девять миллионов пятьдесят тысяч восемьсот тридцать восемь) тенге (три) тиына ТОО «Ertis Art Servis»;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **С** «нормальный»;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерных сетей для орошаемого участка площадью 841,0 га для ТОО «Жумабек Агро» в районе села Железинка Железинского района Павлодарской области»,**

по адресу: район села Железинка Железинского района Павлодарской области

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ТОО «Жумабек Агро»

Бакауов Д.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

2) аккредитованная организация

ТОО «Павлодар Технадзор»,

Кажмуратов М.К.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Кажмуратов М.К. KZ73VJE00030505 от 15.09.2017 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Концерн АЙ-СУ»

Батырбеков Е.К. KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 года

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

2) организация

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализированного аттестата), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Ertis Art Servis»,

Мажит К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	10 934
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	6
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	10934
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	36

12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	2
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик:

ТОО «Жумабек Агро» Бакауов Д.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Концерн АЙ-СУ», Батырбеков Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	8 150	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	8 150	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	8 150	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	8 150	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	10	
	Задвижка d-500	шт	2	
	" d- 300	шт	6	
	" d- 200	шт	2	
	" d- 100	шт	1	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт	1	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		

	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца

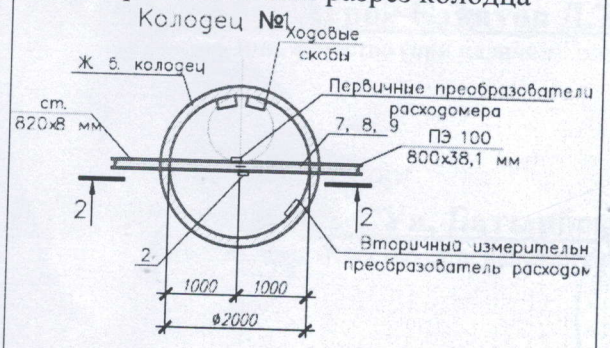

Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца

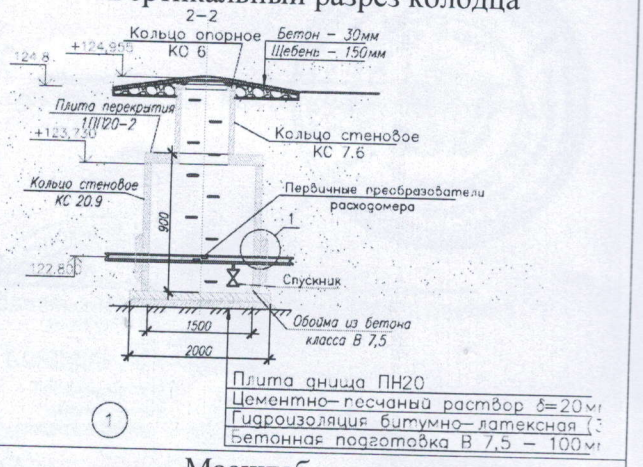

Масштаб _____

Спецификация

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документов, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Арматура и фасонные части							
1	Дождевальная система кругового действия Zimmatic, 580 м	КП №___ от 25.05.2022			шт	6		
	Трубопроводы							
1	Труба ПЭ 100 SDR13,4 Ф560х33,2мм	ГОСТ 18599-2001			м	2787,0		
2	Труба ПЭ 100 SDR17 Ф400х23,7мм	ГОСТ 18599-2001			м	211,0		
3	Труба ПЭ 100 SDR17 Ф315х18,7мм	ГОСТ 18599-2001			м	4625,00		
4	Труба стальная, электросварная Ф820х10мм	ГОСТ 10704-91			м	93,00		на футляры
	Арматура и фасонные части							
1	Затвор дисковый поворотный фланцевый типа Belgicast DN500				шт	2		
2	Задвижка Belgicast с обрезиненным клином из ВЧШГ DN300мм				шт	6		
3	Задвижка Belgicast с обрезиненным клином из ВЧШГ DN200				шт	2		
4	Задвижка Belgicast с обрезиненным клином из ВЧШГ DN100мм				шт	1		
5	Труба стальная Ду219х6,0мм,	ГОСТ 10704-91			м	10		для МК
6	Заглушка фланцевая Ду200	ГОСТ 22816-83			шт	2		для МК
7	Фланец круглый стальной,плоский,приварной на РУ1.0МПа Ду500	ГОСТ 12820-80*			шт	11		
8	Фланец круглый стальной,плоский,приварной на РУ1.0МПа Ду400	ГОСТ 12820-80*			шт	2		
9	Фланец круглый стальной,плоский,приварной на РУ1.0МПа Ду300	ГОСТ 12820-80*			шт	8		
10	Фланец круглый стальной,плоский,приварной на РУ1.0МПа Ду200	ГОСТ 12820-80*			шт	2		
11	Фланец круглый стальной,плоский,приварной на РУ1.0МПа Ду100	ГОСТ 12820-80*			шт	1		
13	Фланец круглый стальной,плоский,свободный на РУ1.0МПа Ду500	ГОСТ 12822-80*			шт	11		
14	Фланец круглый стальной,плоский,свободный на РУ1.0МПа Ду400	ГОСТ 12822-80*			шт	2		
15	Фланец круглый стальной,плоский,свободный на РУ1.0МПа Ду300	ГОСТ 12822-80*			шт	12		

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

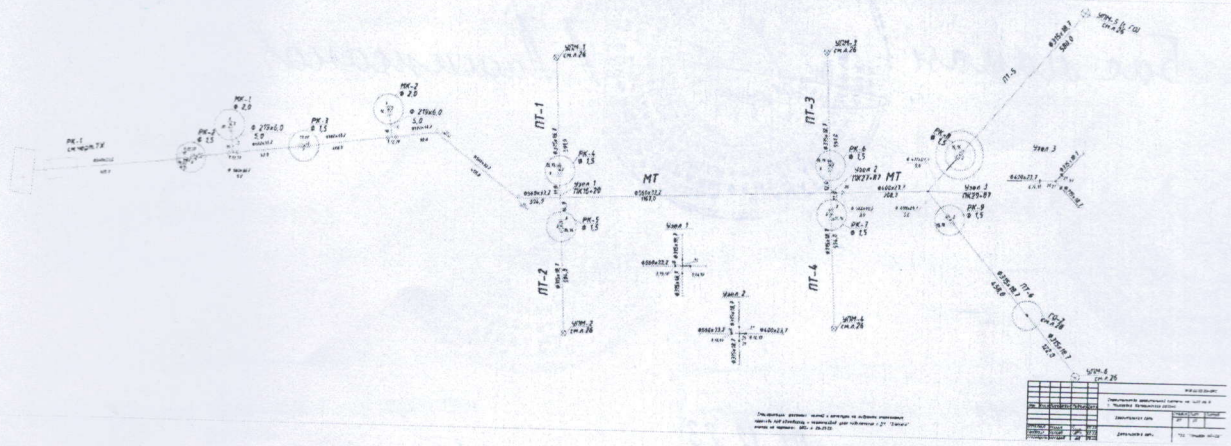

Заказчик:

ТОО «Жумабек Агро» Бакауов Д.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Концерн АЙ-СУ», Батырбеков Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ЖМТ «АЖ ЕНГІЗІЛДІ»

24.11.2023ж.

Бас маман: А. Ашимжанов

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі	1
Өтініш № 002250679072	Тіркеу ісі №
14:206:080:096	Тіркелген күні 01.12.23
Кадастрлық №	Тіркелген уақыты 16:51
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы: Железинский с.о.	
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.	
Бөлім басшысы Ашимжанов А.З.	

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі	1
Өтініш № 002253164457	Тіркеу ісі №
14:206:182:053	Тіркелген күні 01.02.24
Кадастрлық №	Тіркелген уақыты 16:34
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы: Железинский с.о.	
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.	
Бөлім басшысы	

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі	1
Өтініш № 002253163791	Тіркеу ісі №
14:206:182:054	Тіркелген күні 01.02.24
Кадастрлық №	Тіркелген уақыты 16:29
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы: Железинский с.о.	
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.	
Бөлім басшысы	

Прошнуровано и пронумеровано

листов

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі 1

Өтініш № 002 253 162 157
Тіркеу ісі №
14:206:181:044
Кадастрлық №
Тіркелген күні 01.02.24
Тіркелген уақыты 16:17
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
Железинский с.о.
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.
Бөлім басшысы

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі 1

Өтініш № 002 253 162 939
Тіркеу ісі №
14:206:182:056
Кадастрлық №
Тіркелген күні 01.02.24
Тіркелген уақыты 16:22
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
Железинский с.о.
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.
Бөлім басшысы

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі 1

Өтініш № 002 253 161 378
Тіркеу ісі №
14:206:181:043
Кадастрлық №
Тіркелген күні 01.02.24
Тіркелген уақыты 16:11
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
Железинский с.о.
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.
Бөлім басшысы

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі 1

Өтініш № 002 253 157 084
Тіркеу ісі №
14:206:182:055
Кадастрлық №
Тіркелген күні 01.02.24
Тіркелген уақыты 15:39
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
Железинский с.о.
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.
Бөлім басшысы

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі 1

Өтініш № 002 253 158 034
Тіркеу ісі №
14:206:183:245
Кадастрлық №
Тіркелген күні 01.02.24
Тіркелген уақыты 15:46
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
Железинский с.о.
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.
Бөлім басшысы

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі 1

Өтініш № 002 253 160 623
Тіркеу ісі №
14:206:182:052
Кадастрлық №
Тіркелген күні 01.02.24
Тіркелген уақыты 16:05
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
Железинский с.о.
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.
Бөлім басшысы

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі 1

Өтініш № 002 253 159 678
Тіркеу ісі №
14:206:183:242
Кадастрлық №
Тіркелген күні 01.02.24
Тіркелген уақыты 15:59
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
с. Моисеевка
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.
Бөлім басшысы

Железин аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі 1

Өтініш № 002 253 158 964
Тіркеу ісі №
14:206:183:244
Кадастрлық №
Тіркелген күні 01.02.24
Тіркелген уақыты 15:53
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
Железинский с.о.
Тіркеуші (маман) Ашимжанов А.З.
Бөлім басшысы

ЖМТ «АЖ ЕНГІЗІЛДІ»

01.02.2024 ж.

Бас маман: А. Ашимжанов

Жіппен тігілген және нөмірленген 12 беттен тұрады
