REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
MINISTRY OF INVESTMENT AND DEVELOPMENT
The Committee for Roads

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
КОМИТЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

CERTIFICATE NUMBER / НОМЕР СЕРТИФИКАТА : 03

CERTIFICATE DATE / ДАТА СЕРТИФИКАТА : 22 . 10 . 2018

PERIOD COVERED / СРОК ИСПОЛНЕНИЯ :

CONTRACT NO / НОМЕР ДОГОВОРА : Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017

PROJECT NAME / НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА : South-West Roads Project :
Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe - Western China" Road section "Uzynagash-Otar", road section 3: km 143-159

Реконструкция коридора "Западная Европа - Западный Китай", участок Узынагаш - Отар, Участок 3: км 143-159

CONSULTANT / КОНСУЛЬТАНТ : Donsung Engineering Co. Ltd.
Dasan Consultants Co,. Ltd. Joint Venture

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК : J V "Kazakhdorstroy / ABK-Avtodor NS"

FINANCED BY / ФИНАНСИРОВАНИЕ : International Bank for Reconstruction and Development

CONTRACT AMOUNT / СУММА ДОГОВОРА : 4 568 171 706,20

LETTER OF ACCEPTANCE/ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ОФЕРТЫ : 07.06.2018

CONTRACT DATE / ДАТА ДОГОВОРА : 03.07.2018

DATE OF COMMENCEMENT/ДАТА НАЧАЛА :

TIME FOR COMPLETION / СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ : 487 Calendar Days

COMPLETION DATE / ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ :

Contractor/Подрядчик

Consultant/Консультант

Employer/ Заказчик

22.10.18г

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017

MONTHLY STATEMENT № 3 / ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМАХ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 3

	Month / Месяц :		Estimated Contract Value (BoQ)			Accumulated amount up to end of previous month		Amount this month		Accumulated amount up to end of this month		% of BOQ
Item Description	Наименование статьи оплаты	Unit / Единица	Quantity / Кол-во	Rate / Ставка	Amount / Сумма	Quantity / Кол-во	Amount / Сумма	Quantity / Кол-во	Amount / Сумма	Quantity / Кол-во	Amount / Сумма	% от BOP
			Сметная стоимость контракта			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		
B	D	E	E	F	H=E*F	I	J	K	L	M	N=J+L	Q=L/H
yment Value	Размер выплаты											
tal of BOQ	Итого по BOP		1,00	3 839 247 426,96	3 839 247 426,96		55 528 189,99		2 451 738,75		57 979 928,74	
lvanced Payment	Предоплата						575 887 114,04		0,00		575 887 114,04	
aterials on Site	материалы на стройплощадке								38 683 366,00		38 683 366,00	
ny Other Additions or Deductions - aims, Disputes, Interest on Clause 20	Любые прочие прибавления или вычеты - Иск,Споры и Арбитраж - Пункт 20											
riations Orders	Изменения по Ордерам											
djust of price	Корректировка стоимости											
ontingency	Непредвиденные расходы											
ub-Total I:	Совокупный Итог:				3 839 247 426,96		631 415 304,03		41 135 104,75		672 550 408,78	
ax 12%	НДС 12%				460 709 691,24		75 769 836,49		4 936 212,57		80 706 049,06	
pecial Provisional Sums	Специльные резервные суммы		1,00	268 214 588,00	268 214 588,00		40 232 188,20		0,00		40 232 188,20	
otal including Tax	Итого включая НДС				4 568 171 706,20		747 417 328,72		46 071 317,32		793 488 646,04	
epayment Advanced Payment	Предоплата досрочных платежей						0,00		0,00		0,00	
etention 5%	Гарантия исполнения 5%						0,00		369 397,57		369 397,57	
ub-Total II: Deductions	Совокупный Итог:						0,00		369 397,57		369 397,57	
elease Retention	Возврат Удержаний						0,00				0,00	
mout this Interim Certificate	Сумма данного промежуточного сертификата				4 568 171 706,20		747 417 328,72		45 701 919,75		793 119 248,47	

Contractor AZAKHDORSTROY / ABK - AVTODOR NS	Signature Contractor's Representative and Date	Engineer / Инженер	Construction Supervision Consultant Team Leader : /Date: Signature / Подпись :	Project Management Consultants (PMC) Team Leader : /Date: Signature / Подпись :
"Zhambylzhollaboratoria"	Signature and Date/Подпись и Дата	Employer / Заказчик	Committee for Roads of the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan Approval/Одобрение : Signature / Подпись :	Date/Дата :

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Казахдорстрой
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD.
DASAN CONSULTANTS CO., LTD.
IN JOINT VENTURE WITH

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017

MONTHLY STATEMENT № 3 / ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМАХ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 3

SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ			Previous Certificates Предыдущий сертификат	This Certificate Настоящий сертификат	Acumulated Total Накопленный объем	% of BOQ
Description / Описание	Reference / Ссылка	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Amount Стоимость	Amount Стоимость	Amount Стоимость	% of BOP
100 - General Requirements сть №100 - Общие требования	100	140 566 495,51	55 528 189,99	2 208 368,75	57 736 558,74	41,07%
300 - Setting Out and Tolerances сть №300 - Установочные Параметры и Допустимые Отклонения	300	486 740,00	-	243 370,00	243 370,00	50,00%
400 - Site Clearance сть №400 – Расчистка территории	400	52 429 215,13	-	-	-	0,00%
500 - Earthworks сть №500 – Земляные работы	500	357 083 939,40	-	-	-	0,00%
600 - Culverts, Drainage & Protection Works сть №600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения	600	203 419 711,84	-	-	-	0,00%
700 - Granular Pavement Materials сть №700 – Гранулированные материалы покрытия	700	821 806 710,91	-	-	-	0,00%
800 - Bituminous Pavement Works сть №800 – Битумные материалы покрытия	800	136 567 914,10	-	-	-	0,00%
1300 - Road Furniture сть №1300 – Обстановка дороги	1300	538 434 715,71	-	-	-	0,00%
1400 - Road Traffic Markings Ведомость – Дорожная разметка	1400	38 647 664,01	-	-	-	0,00%
1600 - Complex of Road Exploitation Structures ость №1600 – Комплекс дорожно-эксплуатационных сооружений	1600	1 392 058 913,35	-	-	-	0,00%
rks ные работы		157 745 407,00	-	-	-	0,00%
tal of Bills Итого омости		3 839 247 426,96	55 528 189,99	2 451 738,75	57 979 928,74	1,51%
12%) НДС		460 709 691,24	6 663 382,80	294 208,65	6 957 591,45	1,51%
l Provisional Sums * льные резервные суммы*		268 214 588,00				0,00%
Tender Price specified in Form of Tender Общая ость заявки указываемая в форме заявки	**DW**	**4 568 171 706,20**	**62 191 572,79**	**2 745 947,40**	**64 937 520,19**	**1,42%**

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ltd.
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
MONTHLY STATEMENT № 3 / ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМАХ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 3

Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Acumulated Total Накопленный объем		% of BOQ
	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
) 100 – GENERAL REQUIREMENTS / ОСТЬ №100 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ											
Securities Гарантии	LS/ПС	1	46 440 189,99	46 440 189,99	1,00	46 440 189,99			1,00	46 440 189,99	100%
Insurances Страховые полисы	LS/ПС	1,00	9 088 000,00	9 088 000,00	1,00	9 088 000,00			1,00	9 088 000,00	100%
Protection of the Environment, social, health and security measures Защита окружающей и социальной среды, охрана труда и техника безопасности	LS/ПС	1,00	16 000 000,00	16 000 000,00			0,06	1 000 000,00	0,06	1 000 000,00	6%
Removal or relocation of existing communications: Удаление или перенос существующих коммуникаций.				0,00							
Relocation of VL10 kV on км143,026, км 152,945 Переустройство ВЛ10 кВ км143,026, км 152,945	pcs./ шт.	2,00	1 281 443,29	2 562 886,58							
Relocation of VL0,4 kV on км 157,736 Переустройство ВЛ0,4 кВ на км 157,736	pcs / шт.	1,00	623 050,00	623 050,00							
Relocation of communication lines LLP "TNS-Plus", км155,425 Переустройство кабель связи ТОО "TNS-Plus", км155,425	pcs./ шт.	1,00	729 887,97	729 887,97							
Relocation of PL-220kV AO "KEGOC" on км145,939 Переустройство ЛЭП-220кВ АО "KEGOC" км145,939	pcs./ шт.	1,00	31 772 266,10	31 772 266,10							
Construction of temporary detour road and its maintenance Устройство временной объездной дороги и её содержание	LS/ПС	1,00	26 071 505,87	26 071 505,87							
Traffic safety maintenance and control Обеспечение и контроль безопасности дорожного движения	LS/ПС	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00			0,06	75 000,00	0,06	75 000,00	6%
Compensation of losses in connection with the acquisition of the land for temporary use (22.84 ha) Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование (22.84 га)	PS/PC	1,00	2 353 991,00	2 353 991,00							
Photo-report in the course of works execution Фотоотчёт по ходу выполнения работ	LS/ПС	1,00	107 500,00	107 500,00			0,06	6 718,75	0,06	6 718,75	6%
Sign boards Щиты с надписями	шт.	2,00	500 000,00	1 000 000,00			2,00	1 000 000,00	2,00	1 000 000,00	100%
Maintenance of the Engineer's office on-site and laboratory Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории				0,00							

Казахдорстрой
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.

DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD. IN JOINT VENTURE WITH DASAN CONSULTANTS CO., LTD.

On-site office, furniture and equipment (excluding buildings and Офис на площадке, мебель и оборудование (за исключением зданий и помещений)premises)	month/мес	16,00	95 000,00	1 520 000,00			1,00	95 000,00	1,00	95 000,00	6%
Laboratory, furniture and equipment Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	16,00	15 000,00	240 000,00			1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	6%
Maintenance of the Engineer's Survey Equipment. Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	16,00	16 650,00	266 400,00			1,00	16 650,00	1,00	16 650,00	6%
As-built drawings Чертежи после завершения строительства	LS/ПС	1	150 000,00	150 000,00							
Protection of existing communications Защита существующих коммуникаций	LS/ПС	1	440 818,00	440 818,00							
TOTAL FOR BILL 100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				**140 566 495,51**		**55 528 189,99**		**2 208 368,75**		**57 736 558,74**	

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ltd.
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
MONTHLY STATEMENT № 3 / ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМАХ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 3

Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Acumulated Total Накопленный объем		% of BOQ
	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
IO 300 - SETTING OUT AND ANCES / ВЕДОМОСТЬ № 300 - вочные параметры и имые отклонения											
Topographic survey and preparation of working drawings Топографическая съемка и подготовка рабочих чертежей	L.S/ ПС	1	486 740	486 740,00			0,50	243 370,00	0,50	243 370,00	50%
TOTAL FOR BILL 300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**486 740,00**				**243 370,00**		**243 370,00**	

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017

MONTHLY STATEMENT № 3 / ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМАХ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 3

Material on Site / Материалы на стройплощадке

ce	DESCRIPTION	Unit	Rate	Quantity previous months	Quantity this month	Quantity up to date	Value up to the end of previous meas. period (tenge)	Value this meas. period (tenge)	Value up the end of meas. period (tenge)
и	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Кол-во на настоящий момент	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)
	СТ-12	Nos/шт	90 691,00		20,00	20,00	-	1 813 820,00	1 813 820,00
	СТ-10	Nos/шт	59 997,00		11,00	11,00	-	659 967,00	659 967,00
	СТ-4 л/пр	Nos/шт	48 908,00		30,00	30,00	-	1 467 240,00	1 467 240,00
	СТ-6 л/пр	Nos/шт	75 351,00		40,00	40,00	-	3 014 040,00	3 014 040,00
	СТ-1 (№57) л/пр	Nos/шт	76 010,00		8,00	8,00	-	608 080,00	608 080,00
	СТ-2 (№58) л/пр	Nos/шт	128 136,00		12,00	12,00	-	1 537 632,00	1 537 632,00
	СТ-3 (№59) л/пр	Nos/шт	55 051,00		20,00	20,00	-	1 101 020,00	1 101 020,00
	ЗП 38	Nos/шт	289 922,00		4,00	4,00	-	1 159 688,00	1 159 688,00
	ЗП 35	Nos/шт	124 162,00		4,00	4,00	-	496 648,00	496 648,00
	блок 13	Nos/шт	28 679,00		176,00	176,00	-	5 047 504,00	5 047 504,00
	блок 17	Nos/шт	55 406,00		378,00	378,00	-	20 943 468,00	20 943 468,00
	блок 17 А	Nos/шт	103 650,00		12,00	12,00	-	1 243 800,00	1 243 800,00
	ЗП 19.100	Nos/шт	271 617,00		38,00	38,00	-	10 321 446,00	10 321 446,00
	ЗП 10. 100	Nos/шт	108 478,00		77,00	50,00	-	8 352 806,00	8 352 806,00
	Subtotal						0,00	57 767 159,00	57 767 159,00
	Remove VAT (if applicable)						0,00	-6 189 338,00	-6 189 338,00
	Subtotal						0,00	51 577 821,00	51 577 821,00
	Value of Material On Site in Tenghe @ 75%						0,00	38 683 366,00	38 683 366,00

JV KAZAKHDORSTROY / АВК AUTODOR NS

Dongsung Engineering Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Передислокация вахтового городка

Передислокация вахтового городка

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Вахтовый городок

Временный склад ЖБИ

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Вахтовый городок

Отдел Главного механика

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Отдел Главного механика

Отдел Главного механика

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

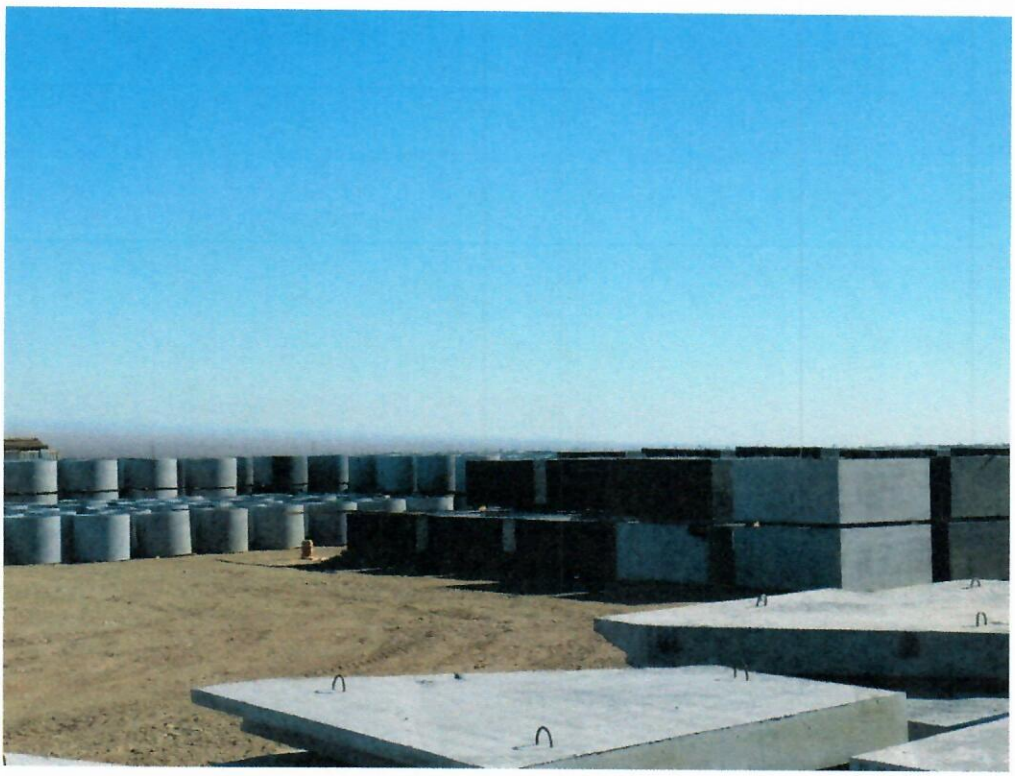

Временный склад ЖБИ

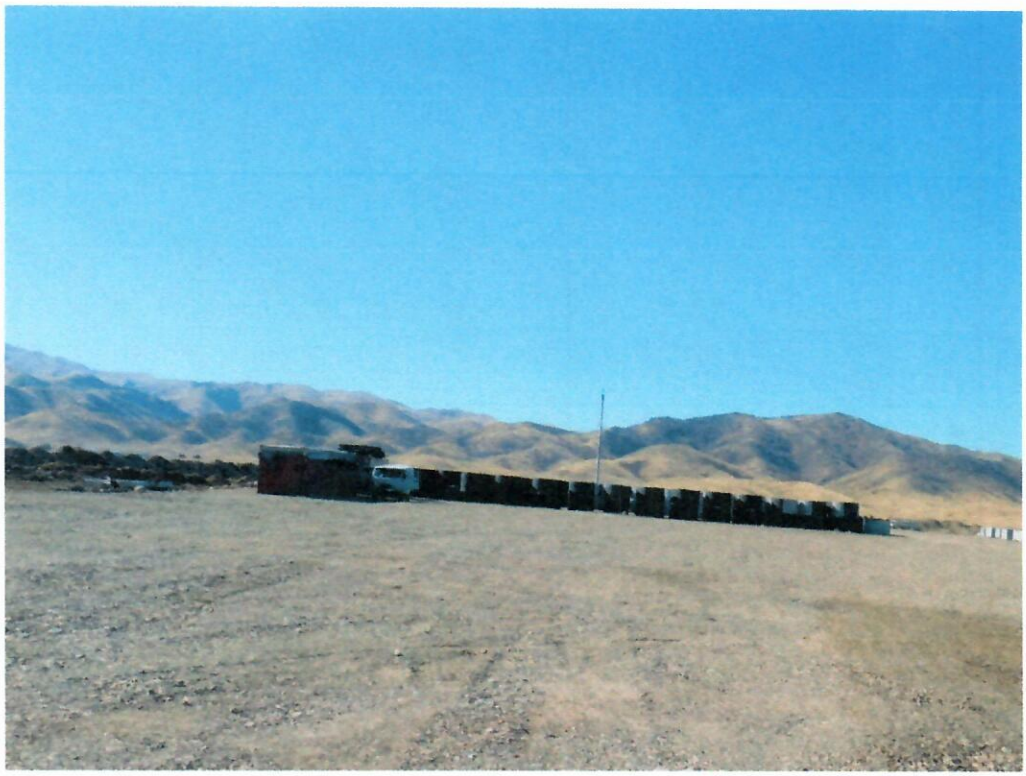

Временный склад ЖБИ

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Временный склад ЖБИ

Временный склад ЖБИ

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

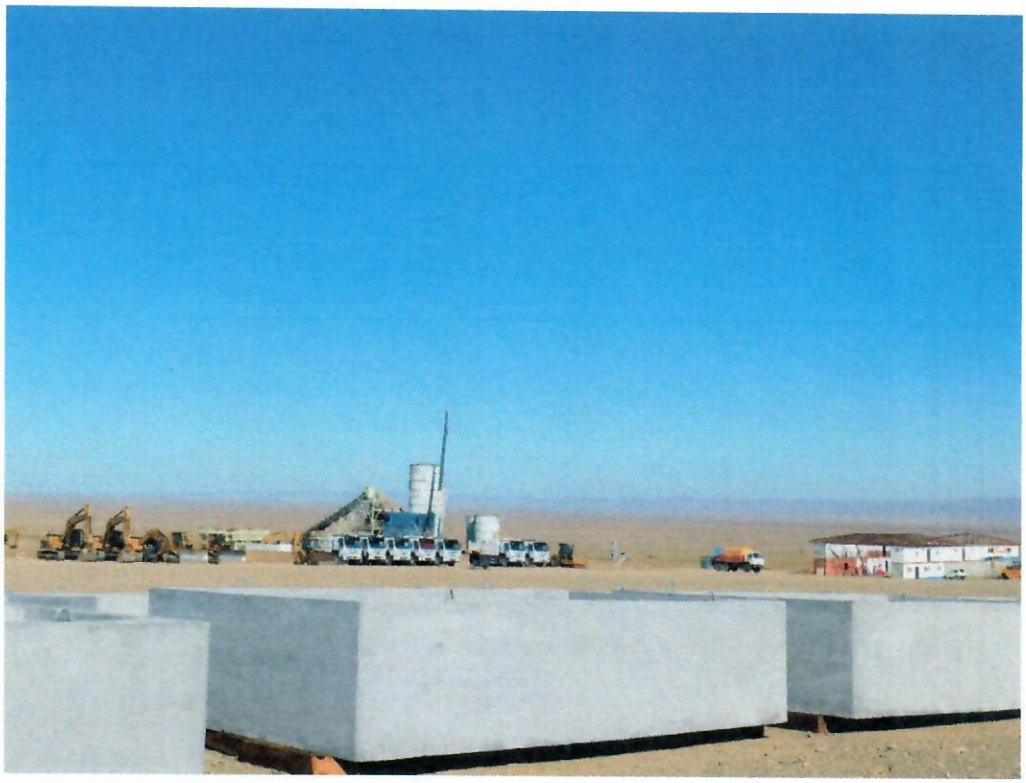

Временный склад ЖБИ

Временный склад ЖБИ

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Монтаж РБЗ

Монтаж РБЗ

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Монтаж РБЗ

Монтаж РБЗ

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Снятие ПСП на объездной дороги

Снятие ПСП на объедной дороги

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Снятие ПСП на объедной дороги

Снятие ПСП на объедной дороги

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Снятие ПСП на объедной дороги

Снятие ПСП на объедной дороги

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Снятие ПСП на объедной дороги

Снятие ПСП на объедной дороги

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Установка ж. б. портальных стенок, откосных стенок

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Склодирование ЖБИ на строй площадке ПК 145

Демонтаж монолитных бетонных оголовков ПК 149

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Разработка катлована водопропускной трубы ПК145

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Разработка катлована водопропускной трубы ПК 127

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Карьер 1

Карьер 1

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Карьер 2

Карьер 2

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

J.V. KAZAKHDORSTROY/ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ttd. In Joint with Dasan Consutarts Co., Ltd

Карьер 2
