Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
форма

Декларация о соответствии

«_22_» _май_ 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___ТОО «Талас- Құрылыс» директор Нурмашев Е.Т. Государственная лицензия № 14013400 от 08.09.2014г.___
Юридический адрес: Жамбылская обл. Таласский р-он, с. Акколь, ул. Конаева №64
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Нурмашева Е.Т._____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство начальной школы_по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, с.о. Жамбылский, с.Шайкорык, улица Вархан, зд. № 11 "Б"_
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: Болатбеков Р.М._____
наименование и местонахождение объекта

утверждает, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядные организации: ТОО «ДАРАЖА»_Государственная лицензия №17002808 от 17.02.2017 г._____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Құдасбек Досымжан Әбдінұрұлы_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «БАДЖ Құрылыс» директор Сабиров Д.А.__Государственная_лицензия 09-ГСЛ – №001343 от 21.11.2011г.___
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденного (й)_Болатбековым Р.М. от 08.01.2023 года_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

Начальная школа лит. А с пристройкой (лит. А1)					
Площадь застройки	$м^2$	468,5(113,0)	468,5(113,0)	468,5(113,0)	468,5(113,0)
Общая площадь	$м^2$	782,2(89,7)	782,2(89,7)	782,2(89,7)	782,2(89,7)
Полезная площадь	$м^2$	782,2(89,7)	782,2(89,7)	782,2(89,7)	782,2(89,7)
Строительный объем	$м^3$	3326,0(418,0)	3326,0(418,0)	3326,0(418,0)	3326,0(418,0)
Продолжит.строительс.	месяц	4	4	2	2

5. Уровень ответственности II (нормальный), не относящиеся к технически сложным. Степень огнестойкости – II. Конструктивная схема здания – несущие стены с монолитными сердечниками. Узлы сопряжения сердечников с фундаментами жесткие. Здание запроектировано из следующих конструкций, изделий и материалов: Фундаменты: ленточные монолитные из бетона класса В7,5. Под монолитные железобетонные фундаменты выполняются бетонная подготовка толщиной 100 мм. из бетона класса В3,5.

Здание начальной школы – двухэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами по наружной стене 14,40м. х 31,20м. и пристроенная лестничная клетка с размерами 3,0м. х 5,62м., высота 7,10м.

Пристройка – лит. А1 –одноэтажная, прямоугольной формы в плане, без подвала, с размерами по наружной стене 5,80м. х 20,40м., высота 3,70м.

Строительно монтажные работы выполнены согласно СНиП и соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____04.2023г.
месяц, год

окончание работ_____05. 2023г.
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства____4 месяца
фактически_____2 месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____100___% и фактически применено __100_____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

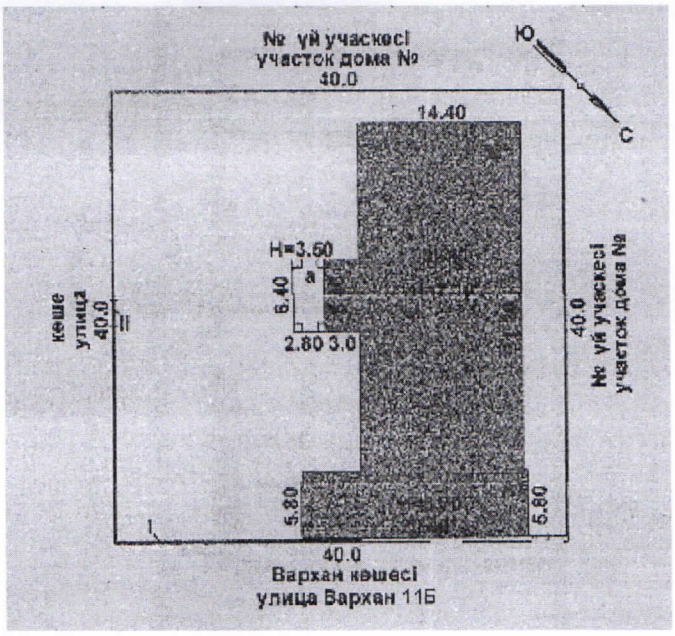

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _(не требуется)_ _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство начальной школы по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, с.о. Жамбылский, с.Шайкорык, улица Вархан, зд. № 11 "Б"

_наименование и местонахождение объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты,

возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Талас- Құрылыс» директор Нурмашев Е.Т. Государственная лицензия № 14013400 от 08.09.2014г.

Нурмашев Ержан Талапович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.
