Форма декларации о соответствии
изложена в редакции
приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«11» 09 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с органиченной ответственностью «Горэлектросеть», Павлодарская обл., город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, 12
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Председателя Правления Олжабаевой Майгуль Аскаровны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция системы электроснабжения насосной станции №2 ОВС II подъема город Экибастуз, Павлодарская область. Корректировка.»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого, является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз», руководитель Шарипов Ринат Жасуланович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Somet
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз», приказ №55/1 от 18.05.2023года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди
Напряжение сети	кВ	35/6		35/6	
Оборудование ПС-35/6 кВ, в том числе блоки, шкафы ШЗН, ШЗТ-Т, ящик ЯРП, трансформатор, изолятор ИОС	комп.	1		1	
Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом /ОПНп-10/11,5/10/400 УХЛ1/	шт.	3		3	
Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1		1	
Релейные шкафы ОПУ. в том числе шкафы ШТ-МТ. ЩЦС-МТ, ШУЭ-МТ, ШОТ-МТ, ШАБ-МТ, ШУ-МТ-ШЗН, ШУ-МТ-ШЗТТ	комп.	1		1	
Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1		1	
КРУ-6кВ в БМЗ, в составе ячейки и шкафы КСО, щит собственных нужд	комп.	1		1	
Стойка ВС105-167	шт.	1		1	
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3		3	
Стойка СОН 44-29	шт.	7		7	
Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-6	км	0,29		0,29	
Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/800-L12	шт	4		4	
Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм /короб КП-	м	24		24	

0,1/0,1-2У1/					
Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм /короб КП-0,1/0,2-2У1/	м	1		1	
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 150/24 мм2	км	0,085		0,085	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: установка линейного портала типа ПС35 Я2, установка отдельностоящего молниеотвода МО-1, устройство опорных ж/б конструкций иарки СОН под разъеденитель 35кВ типа РГП.2-35-1000, трансформатор напряжения, трансформатор тока ТОЛ , выключатель вакуумный наружной установки ВВН, ограничитель перенапряения ОПН, изолятор, устройство фундаментов под трансформатор ТМН-4000/35 У1 и БМЗ КРУН-6кВ, а также установка ж/б кабельных лотков

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024 года ;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 3,5 ;
фактически, месяцев: 3,5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически примерно 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному обеспечению:

ТОО «Горэлектросеть» Олжабаева М.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованным испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – не требуется;

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____-_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция системы электроснабжения насосной станции №2 ОВС II подъема город Экибастуз, Павлодарская область.Корректировка.»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Олжабаева Майгуль Аскаровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П (при наличии)
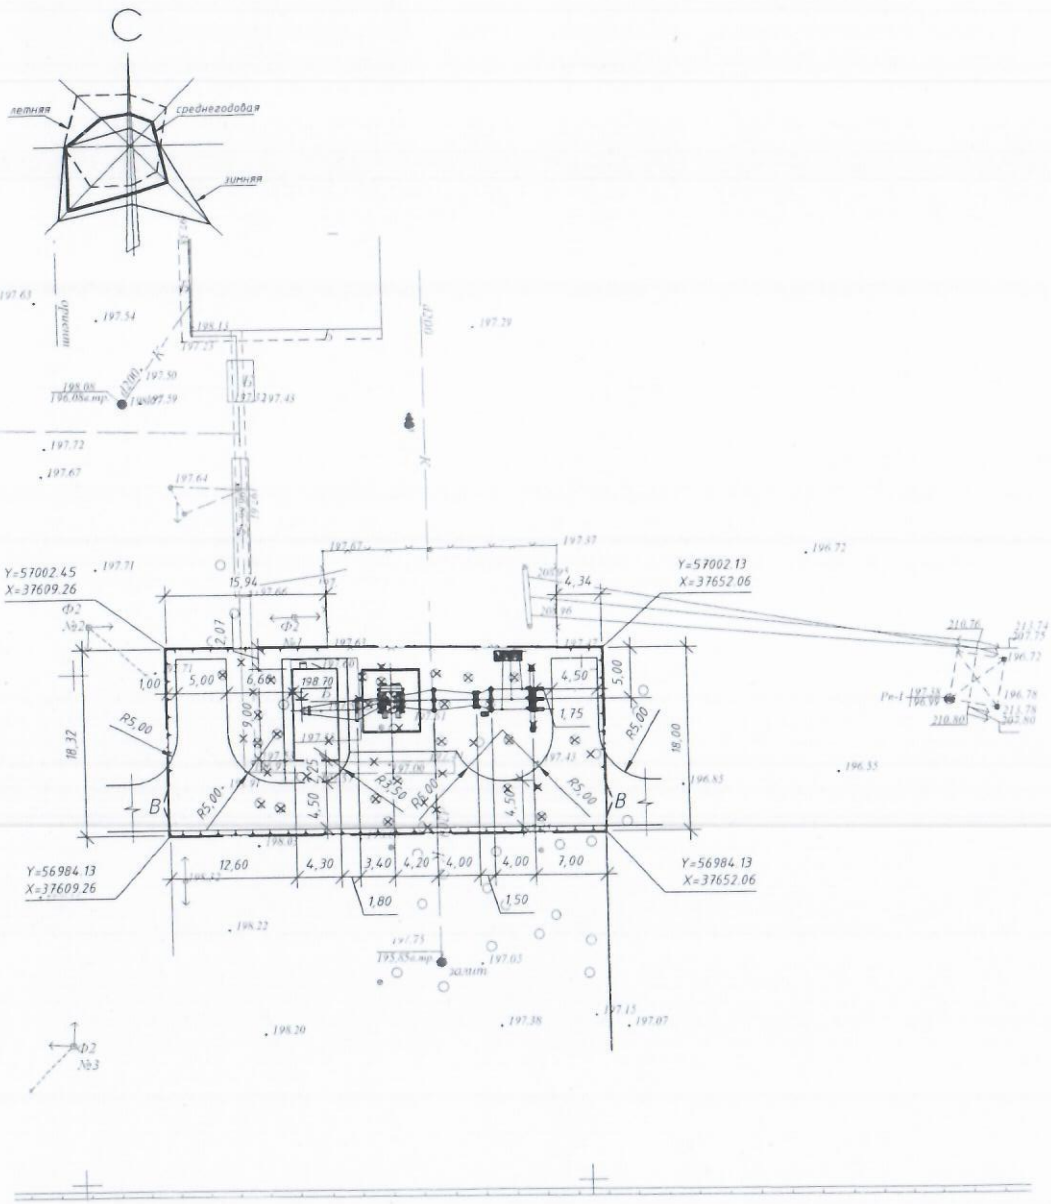
16. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)
