Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма
к приказу Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 08 февраля 2021 года №53

Декларация о соответствии

"14" 07 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Нуркапстройгаз" БИН:060940008860,
Атырауская область, Атырау г.а., г.Атырау, улица Севастополь, дом 1в
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Каримова АдилбекаНуроллаевича
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту:
"Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации", Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай микрорайон Аэропорт
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является
ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",
БИН 060140015369 Руководитль Иманбеков Д.Р.
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации:
ТОО «Прайд», ГЛ №12-ГСЛ №0003856 от 06.06.2019 года, БИН 980140014684
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "Архитекторно-проектная компания "Арх-Лэнд", 014766, 26.04.2004 г.БИН 040240003226
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)
Рабочий проект, ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная", № 184 от 02.09.2019 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощьность, производительность	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом	в том числе	Общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	6181,36	6181,36
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	19148,6	19148,6
В том числе подземной части	м3	1626,4	1626,4
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадьквартир, м2		число вартир	площадьквартир, м2	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	3888,9	1935,72	72	3888,9	1935,72
однокомнатных	36	1431	567,72	36	1431	567,72
двухкомнатных	18	1040,22	544,86	18	1040,22	544,86
трехкомнатных	18	1417,68	823,14	18	1417,68	823,14
четырёхкомнатные	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту *характеризуется следующими данными:*

Здание выполнено из сборных трёхслоных (с утеплением)железобетонных панелей наружных стен. Несущей конструкцией здания служат железобетонные поперечные и продольные стены.Перекрытия и покрытие выполнены из сборных пустотных плит перекрытий. Лестницы выполнены из сборного железобетона. Фундамент –монолитная железобетонная плита. Окна - металлопластиковые с тройным остеклением. Покрытие кровли-мягкая. Лифт- пассажирский; размер кабины 2155(2200)х1135(1180)х2100 (ширина, глубина высота). Дверной проем 1200х2100мм

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

Начало работ: 01.02.2022года

Окончание работ: 14.07.2023 года

при продолжительности строительства7,5 месяцев, по норме или по проекту организации строительства 7,5 месяцев; фактически 18 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в мкр. Аэропорт по ПДП в г. Костанай».

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. согласовано в соот с Рабочим проектом

Манатова А. Р. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нуркапстройгаз" Каримова Адилбека Нуроллаевича

(Дата) *(Место печати)*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма
к приказу Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 08 февраля 2021 года №53

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"21" 07 2023 года

Авторский надзор:ТОО "Архитектурно-проектная компания "Арх-Лэнд", 014766,
Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай , АЛЬ-ФАРАБИ ,
43А,БИН 040240003226, директор Шишкин Юрий Григорьевич

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

в лице

Эксперта авторского надзора

Шишкин Юрий Григорьевич Аттестат:№0171от21.10.2016года

(фамилия, имя, отчество экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании:
Договор о государственных закупках услуг №Приказ № 2от 20.01.2022 0:00:00 года;

(№ договора и дата)

по объекту:
«Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации"
Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай микрорайон Аэропорт

(Наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком, которого является:

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"

БИН 060140015369

Руководитель Иманбеков Д. Р.

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) Подрядчиком (Генеральным подрядчиком)

ТОО "Нуркапстройгаз" БИН:060940008860 ГСЛ №19013434, дата выдачи 21.06.2019

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Каримова АдилбекаНуроллаевича

(фамилия, имя, отчество руководителя)

   2) Субподрядными организациями

ТОО «Прайд», ГЛ №12-ГСЛ №0003856 от 06.06.2019 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Абдуллиева Даурен Ермековича

(афамилия, имя, отчество руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 01.02. 2022 года
окончание работ: 24. 07 2023 года
при продолжительности строительства 7,5 месяцев; по норме или по проекту организации 7,5

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены.
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО АПК «Арх-Лэнд ГСЛ № 014766 от 26.04.2004 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная", № 184 от 02.09.2019 года

(наименование организации утвердившей (пер утвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

ТОО АПК «Арх-Лэнд», Шишкин Юрий Григорьевич

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

21.07.2023г.

(Подпись, дата) *Место печати*

Шишкин Ю.Г. Аттестат: № 0171 от 21октября 2016

(Фамилия, имя, отчество эксперта (экспертов) № аттестатов)

(Подпись, дата) *Место печати*

21.07.2023г.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма
к приказу Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 08 февраля 2021 года №53

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"21" 07 2023 года

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита" БИН: 060 640 001 000

г. Алматы, Ауэзовский район, Садоводческое товарищество «Восход», директор Мусин Вячеслав Анатольевич

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

в лице Инженера технического надзора Хасанова Ж.А.

Аттестат: KZ77VJE00073210 от 28.06.2017

(фамилия, имя, отчество экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании
Договор о государственных закупках услуг № 785 от 06.11.2019год

(№ договора и дата)

по объекту: "Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 по ПДП в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетейблагоустройства). Корректировка сметной документации"

Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай микрорайон Аэропорт

(Наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком, которого является:

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"

БИН: 06014005369

Руководитель Иманбеков Д. Р.

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) Подрядчиком (Генеральным подрядчиком)
   ТОО "Нуркапстройгаз" БИН: 060940008860 ГСЛ №19013434, дата выдачи 21.06.2019

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Каримова АдилбекаНуроллаевича

   2) Субподрядными организациями
ТОО «Прайд», ГЛ №12-ГСЛ №0003856 от 06.06.2019 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

В лице Абдуллиева Даурена Ермековича

(фамилия, имя, отчество руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 01.02.2022 года
окончание работ: 24.07.2023 года
при продолжительности строительства 7,5 месяцев; по норме или по проекту организации 7,5 месяцев; фактически 18 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
   всего 1222152,416 тысяч тенге, в том числе
   строительно-монтажных работ 1 032 240,117 тысяч тенге,
   оборудования, инструмента и инвентаря 189 912,299 тысяч тенге;

всего 936997,485 тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ 880140,766 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 56856,719 тысяч тенге. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

Архитекторно-проектная компания "Арх-Лэнд", 014766, 26.04.2004 г., Рабочий проект,

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная", № 184 от 02.09.2019 года

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры градостроительства и строительства)

5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов

5.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме

7. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены

8. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО "СейсмоСтройЗащита" Мусин Вячеслав Анатольевич

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

Подпись, дата) *Место печати* 21.07.2023г.

Эксперт(ы) по техническому надзору:

Эксперт технического надзора: Соснов В.Н. Аттестат: KZ77VJE00073210 от 13.04.2023

(Фамилия, имя, отчество эксперта (экспертов) № аттестатов)

(Подпись ,дата) *Место печати* 21.07.2023г.

ОРИГИНАЛ

Приложение к протоколу № 5043 от 12.07.2023г.

Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Қостанай облысы бойынша филиалы
110000, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 113 тел./факс 54-57-13 Қостанай қаласы, БСН 150741018479 e-mail: kostanay-obl@nce.kz
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здрвавоохранения Республики Казахстан по Костанайской области
110000, г, Костанай, ул.Аль-Фараби, 113, тел/факс 54-57-13 г. Костанай БИН 150741018479 e-mail: kostanay-obl@nce.kz

Дыбыс оқшаулауын өлшеу бойынша сараптамалық қорытынды
(Экспертное заключение по измерению звукоизоляции)
№ 137
от «12» июля 2023 года

1. Өтініш беруші (Заявитель): ТОО «Нуркапстройгаз»
2. Мекен-жайы (Адрес): Атырау қ., Севастопольская к-сі, 1В/ г. Атырау, ул. Севастопольская, 1В
3. Нысан атауы (Наименование объекта):
   Қостанай қаласының ПДП бойынша Әуежай шағын ауданында № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу /
   Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в микрорайоне Аэропорт по ПДП г. Костанай
4. Негізі (Основание) : 2023ж.03.07. №1013-303 келісімшарт бойынша / договор №1013-303 от 03.07.2023г.
5. Өлшеу мақсаты (Цель измерений):
   Қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулауын анықтау / определение звукоизоляции ограждающих конструкций
6. Өлшеу құралы атауы, тексерілген мерзімі (Средства измерений наименование, дата поверки):
   - шуөлшеуіш-дірілөлшеуіші спектрінің анализаторы Экофизика-110А (шумомер-виброметр анализатор спектра Экофизика-110А) зауыт номері/

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Костанайской области

Аккредиттеу аттестаты 2019 ж. 15.02. № KZ.T.11.0264 2024 жылғы 15.02. жарамды.

Аттестат аккредитации № KZ.T.11.0264 от 15 февраля 2019 года действителен до 15 февраля 2024 года

9. Дыбыс оқшаулауын өлшеу хаттамасы № 5043 12.07.2023ж.

(Протокол измерения звукоизоляции: № 5043 от 12.07.2023 года)

10. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения):

Өлшеу кезінде ауа температурасы, ауа ылғалдылығы, ауа қозғалысының жылдамдығы, атмосфералық қысым өлшемдері жүргізілді (Во время измерений были сделаны замеры температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления):

- Ауа температурасы (Температура воздуха): 20 °С;
- Ауа ылғалдылығы (Влажность воздуха): 55 %;
- Ауа қозғалысының жылдамдығы (Скорость воздуха): < 0,1 м/с.
- Атмосфералық қысым өлшемдері (Атмосферное давление) 741 мм.рт.ст.

Сыналатын үй-жайлар мен конструкциялардың параметрлері туралы мәліметтер (Сведения о параметрах испытуемых помещений и конструкций):

11. Сараптамаға ұсынылған құжаттар (Документы представленные на экспертизу):

Жұмыс жобасы / Рабочий проект

Қостанай қаласының ПДП бойынша Әуежай шағын ауданында № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу /

Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в микрорайоне Аэропорт по ПДП г. Костанай

12. Сараптама нәтіжелері (Результаты экспертизы)

Ауа шуын оқшаулау индексі: белгіленген нормадан аспайды

Индекс изоляции воздушного шума: не превышает установленный нормы

ҚР СЕ талаптары 2.04-105-2012 «Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулауын жобалау» Қазақстан Республикасының қағидалар жинағы. В санатындағы тұрғын үйлер үшін ауа шуын оқшаулау индекстерінің нормативтік мәндері 50 дБ құрайды.

- пәтерлерді бөлетін қабаттасу плитасы үшін келтірілген соққы шу индексі пәтер № 48 қабат 3 және пәтер № 52 қабат 4 59 **дБ** құрады, норма бойынша 60 дБ

индекс приведенного уровня ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия разделяющей квартиры № 48 этажа 3 и квартиры № 52 этажа 4 составил **59 дБ**, при норме 60 дБ

- пәтерлерді бөлетін қабаттасу плитасы үшін келтірілген соққы шу индексі пәтер № 52 қабат 4 және пәтер № 56 қабат 5 59 **дБ** құрады, норма бойынша 60 дБ

индекс приведенного уровня ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия разделяющей квартиры № 52 этажа 4 и квартиры № 56 этажа 5 составил 59 **дБ**, при норме 60 дБ

- пәтерлерді бөлетін қабаттасу плитасы үшін келтірілген соққы шу индексі пәтер № 56 қабат 5 және пәтер № 60 қабат 6 58 **дБ** құрады, норма бойынша 60 дБ

индекс приведенного уровня ударного шума для плиты междуэтажного перекрытия разделяющей квартиры № 56 этажа 5 и квартиры № 60 этажа 6 составил 58 **дБ**, при норме 60 дБ

Орындаушылар **Исполнители**	Тюменцев Д.С.	
	Шиндавлетов Ж.Е.	
Зертхана меңгерушісі **Заведующая лабораторией**	Танатканова Г.С.	
Директор	Копжасаров Б.Г.	

ОРИГИНАЛ

KZ.T.11.0264 TESTING	Аккредитациялау атестаты 2019 жылғы 15 ақпандағы № KZ.T.11.0264 Аккредитациялау атестаты 2024 жылғы 15 ақпан мерзіміне дейін жарамды Аттестат аккредитации № KZ.T.11.0264 от 15 февраля 2019 года действителен до 15 февраля 2024 года Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Қостанай облысы бойынша филиалы 110000, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 113 тел./факс 54-57-13 Қостанай қаласы, БСН 150741018479 e-mail: kostanay-obl@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области 110000, г. Костанай, ул.Аль-Фараби, 113, тел/факс 54-57-13 г. Костанай БИН 150741018479 e-mail: kostanay-obl@nce.kz	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 037/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 037/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерения уровней шума, звукоизоляции

№ 5043 от 12.07. 2023 ж.(г.)

1. Нысанның толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес) "Нуркапстройгаз" ЖШС Атырау қ., Севастопольская к-сі, 1В / ТОО "Нуркапстройгаз" г. Атырау, ул. Севастопольская, 1В
Қостанай қаласының ПДП бойынша Әуежай шағын ауданында № 45/1 көппәтерлі тұрғын үй салу /
Строительство многоквартирного жилого дома № 45/1 в микрорайоне Аэропорт по ПДП г. Костанай
цех, участке (цех, участок)
2. Өлшеу мақсаты (Цель исследования) 2023 ж.03.07. № 1013-303 келісімшарт бойынша /
по договору № 1013-303 от 03.07.2023 г.
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)
4. Өлшеу құралдары (Средства измерений) шуөлшеуіш-діріленөлшеуіші спектрінің анализаторы Экофизика-110А /
зауыт номері № БА 200802
шумомер –виброметр,анализатор спектра Экофизика-110А,
заводской номер № БА200802
барлық бағыттағы дыбыс көзі(додекаэдр) /всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360, заводской номер № 200059
күшейткіш-генератор / усилитель-генератор OED-PA360, заводской номер № 200060
акустикалық калибратор / калибратор акустический типа АК-1000 заводской номер № 1160,
микрофондық предусилитель / микрофонный предусилитель Р 200, заводской номер № 206414
Стандартты соққы машинасы СМ-10 / УМ-10 Машина ударная стандартная, заводской номер № 200048
метеометр МЭС-200А, заводской номер № 4577,
, атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) тексеру туралы сертификат/сертификат о поверке
6. Куәліктің берілген күні мен нөмірі (Дата и номер свидетельства)
№ RK-12-09-220027 от 01.09.2022 г.; № BA-12-05-1342 от 22.06.2022 г.; № RK-10-08-220624 от 07.12.2022 г.
7. Жүргізілген өлшеулер мен берілген санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды мына НҚ-ға сай жүргізілді
(НД, в соответствии с которой проводились измерения) МЕСТ/ГОСТ ГОСТ 27296-2012
8. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума)
шуды оқшаулауға арналған жабдық / оборудование для проведения шумоизоляции
9. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)
10. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, қол машинасының).
Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері. (Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров).
11. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводились на соответствие НД)
СП РК 2.04-105-2012 "Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың қоршау конструкцияларын дыбыс оқшаулауды жобалау "
Қазақстан Республикасының қағидалар жинағы»
СП РК 2.04-105-2012 Свод правил Республики Казахстан «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»

Измерение изоляции воздушного шума

Квартира № 55 этажа 5 квартира № 56 этажа 5

А и Б - точки расположения всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP360

61-90 - точки расположения анализатор спектра ЭКОФИЗИКА -110А

УМ - места расположения ударной машины

Измерение фонового шума

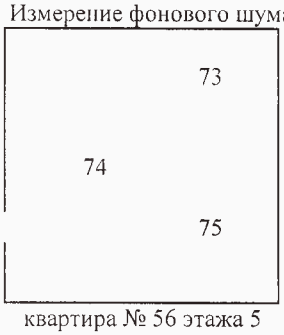

квартира № 56 этажа 5

Измерение ударного шума

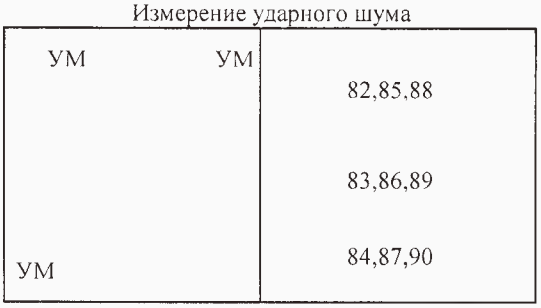

Квартира № 60 этажа 6 квартира № 56 этажа 5

Измерение времени реверберации

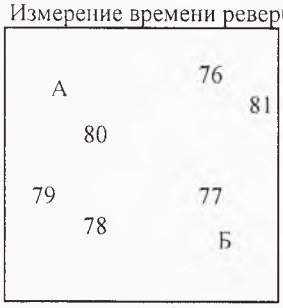

квартира № 56 этажа 5

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Зерттеу жүргізген Т.А.Ә. (Ф.И.О.,проводившего исследование) Тюменцев Д.С. Қолы/ Подпись

Зерттеу жүргізген Т.А.Ә. (Ф.И.О.,проводившего исследование) Шиндавлетов Ж.Е. Қолы/ Подпись

Сынақ хаттамасын бекіткен қолы,Т.А.Ә. (Ф.И.О. подпись утвердившего протокол испытания) Танатканова Г.С. Қолы/ Подпись

Мөр орны
Место печати

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қостанай облысы бойынша филиалының директоры
Директор филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Костанайской области

Копжасаров Б.Г. _____
Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 12 июля 2023 г.

Парақтар саны (Количество страниц) 5

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Результаты исследования распространяются только на образцы(пробы), подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра ЗАПРЕЩЕНА

Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттар, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қортынды

Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам / пробам исследуемых химических веществ, физических и радиационных факторов
