ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ГЕОЛИДЕРПРОЕКТСЕРВИС

Заказчик:
ТОО «SCS Инжиниринг»

Акт

По геодезической разбивочной основе, выполненной на объекте: «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области».

г. Кызылорда
2020 год

Акт

По геодезической разбивочной основе,

выполненной по Договору № _ от _____г.

Объект: **«Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области».**

Заказчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Исполнитель: ТОО «ГеоЛидерПроектСервис»

Директор: _____ Сарбалакова Ж.

г. Кызылорда
2020 год

Основные положения

1.Наименование – строительство: «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области».

2. Заказчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

3. Основание для разработки – рабочий проект

4.Комплектность представленной документации:

- Архитектурно-планировочное задание
- Альбом. Генплан. лист2
- Альбом. Разбивочный план.

5.Общая часть.

5.1. Краткая характеристика площадки строительства.

Участок под строительство расположен в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства, следующие:

- климатический район – IVг.
- средняя температура наружного воздуха:
  - в наиболее холодные сутки – $35С^0$
  - наиболее холодной пятидневки $-30С^0$
- сейсмичность района – согласно СНиП
- район по весу снегового покрова –СНиП 2.01.07-85 1 (S_0=50кг/см^2)
- район по скоростному напору ветра СНиП 2.01.07-85 III (W=38кг/см^2)
- рельеф площадки – спокойный.

Акт на разбивку оси здания

г. Кызылорда **«__» _____ 2020г.**

Мы, нижеподписавшиеся представитель ТОО «ГеоЛидерПроектСервис» геодезист Бекжанов М, представитель технического надзора застройщика ТОО «Стройтехнопроект KZ A и К» Кайыров С.Н, генподрядчик ТОО «SCS Инжиниринг» Бекбауов Р.Д, представитель авторского надзора ТОО «Сартобе» Мухаммедиев О.Е. составили настоящий акт в том, что сдал, а последний принял в натуре работы по разбивке осей здания расположенного *в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области».*
(для земляных работ,) выполненные оси 1,188, А, Ж соответствии с проектными чертежами выполненные ТОО «Сартобе»
Причем установили:

1. Угловые точки осей здания закреплены металлическими арматурами и указаны в натуре заказчику и подрядчику.
2. Одновременно произведены работы по нивелировке в рабочих реперов с выноской абсолютной высотой отметки:
   Репер № 1 отм. 65,351
3. Описание рабочих реперов.
4. Отметки рабочих реперов.
5. Дополнительно выполнены следующие работы: угловые точки ограждение территории
6. Производительность работ предупрежден, что устройства земляных работ может быть произведена только после срезки плодородного слоя.

Акт составлен в четырех экземплярах.

Геодезист ТОО «ГеоЛидерПроектСервис» Бекжанов М

Представитель
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и К» Кайыров С.Н

Представитель авторского надзора: ТОО «Сартобе» Мухаммедиев О.Е

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг» Бекбауов Р.Д

АКТ
Переноса отметки на репер

г.Кызылорда ___ _____ 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители:
Исполнитель ТОО «ГеоЛидерПроектСервис» геодезист Бекжанов М.
(должность, ф.и.о.)
Подрядчик ТОО «SCS Инжиниринг»_____Бекбауов Р.Д
(должность, ф.и.о.)
Представитель технического надзора «Стройтехнопроект KZ A и К» Кайыров С.Н
(должность, ф.и.о)
Составили настоящий акт о нижеследующем:
1.Представителем технического надзора установлена отметка *репера* «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»
(наименование объекта, адрес)
которая составляет №1 отм. 65,351
2. Кроме того, на вспомогательной обноске (репере) дана нулевая отметка, которая составляет
№67,30

3. Правильность нулевой отметки проверена измерением по поверхности земли по точкам
Trimble R8, M3
(наименование измерительного инструмента)
4. Описание, схема реперов и расстояния до земли даются в схематическом чертеже.
Схематический чертеж

ПОДПИСИ:

Геодезист ТОО «ГеоЛидерПроектСервис» Бекжанов М

Представитель
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и К» Кайыров С.Н

Представитель авторского надзора: ТОО «Сартобе» Мухаммедиев О.Е

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг» Бекбауов Р.Д

Акт посадки здания

г. Кызылорда ___ _____ 2020 г.

Наименование объекта: «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»

1. Адрес Кызылординская область, Казалинский район,кент Айтеке би.

Мы, нижеподписавшиеся представители:

Исполнитель ТОО «ГеоЛидерПроектСервис» геодезист Бекжанов М.
(должность, ф.и.о.)

Подрядчик ТОО «SCS Инжиниринг»_____Бекбауов Р.Д
(должность, ф.и.о.)

Представитель технического надзора ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
_____ Кайыров С.Н
(должность,ф.и.о)

составили настоящий акт о нижеследующим:

1. На основании решения *Уведомление о начале строительно-монтажных работ от 20.01.2020 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»*
(наименование органа, дата)

Произвели посадку здания (дороги) Разбивка основных осей здания
(наименование объекта)

Путем выноса в натуру основных осей.

2. Оси закреплены штырями, привязаны к местным предметам (или вынесены в натуру красными линиями) и указаны следующим лицам: Ответственный лицо заказчика Сейтханов К.Б
(должность, ф.и.о.)

3. На основании настоящего акта и решения заказчика и технического надзора могут производится земельные работы, установка обноски.
4. Разбивку осей на обноске производит исполнитель и подрядчик, а закладка фундаментов и другие строительно- монтажные работы могут производится только после проверки и составления акта представителем.

_____
(наименование организации)

О правильности разбивки осей здании и сооружении:

Сдал геодезист_____Бекжанов М

Генподрядчик_____ Бекбауов Р.Д

Технадзор:_____ Кайыров С.Н.

Рабочие чертежи:
Марка_РП ГП -2_____
Заказ_№ _____
Год выпуска 2020_____
Автор_____Мухаммедиев О.Е

Строительства поликлиники на 250 мест в кенте Айтеке би
Казалинского района Кызылординской области

Схема разбивки

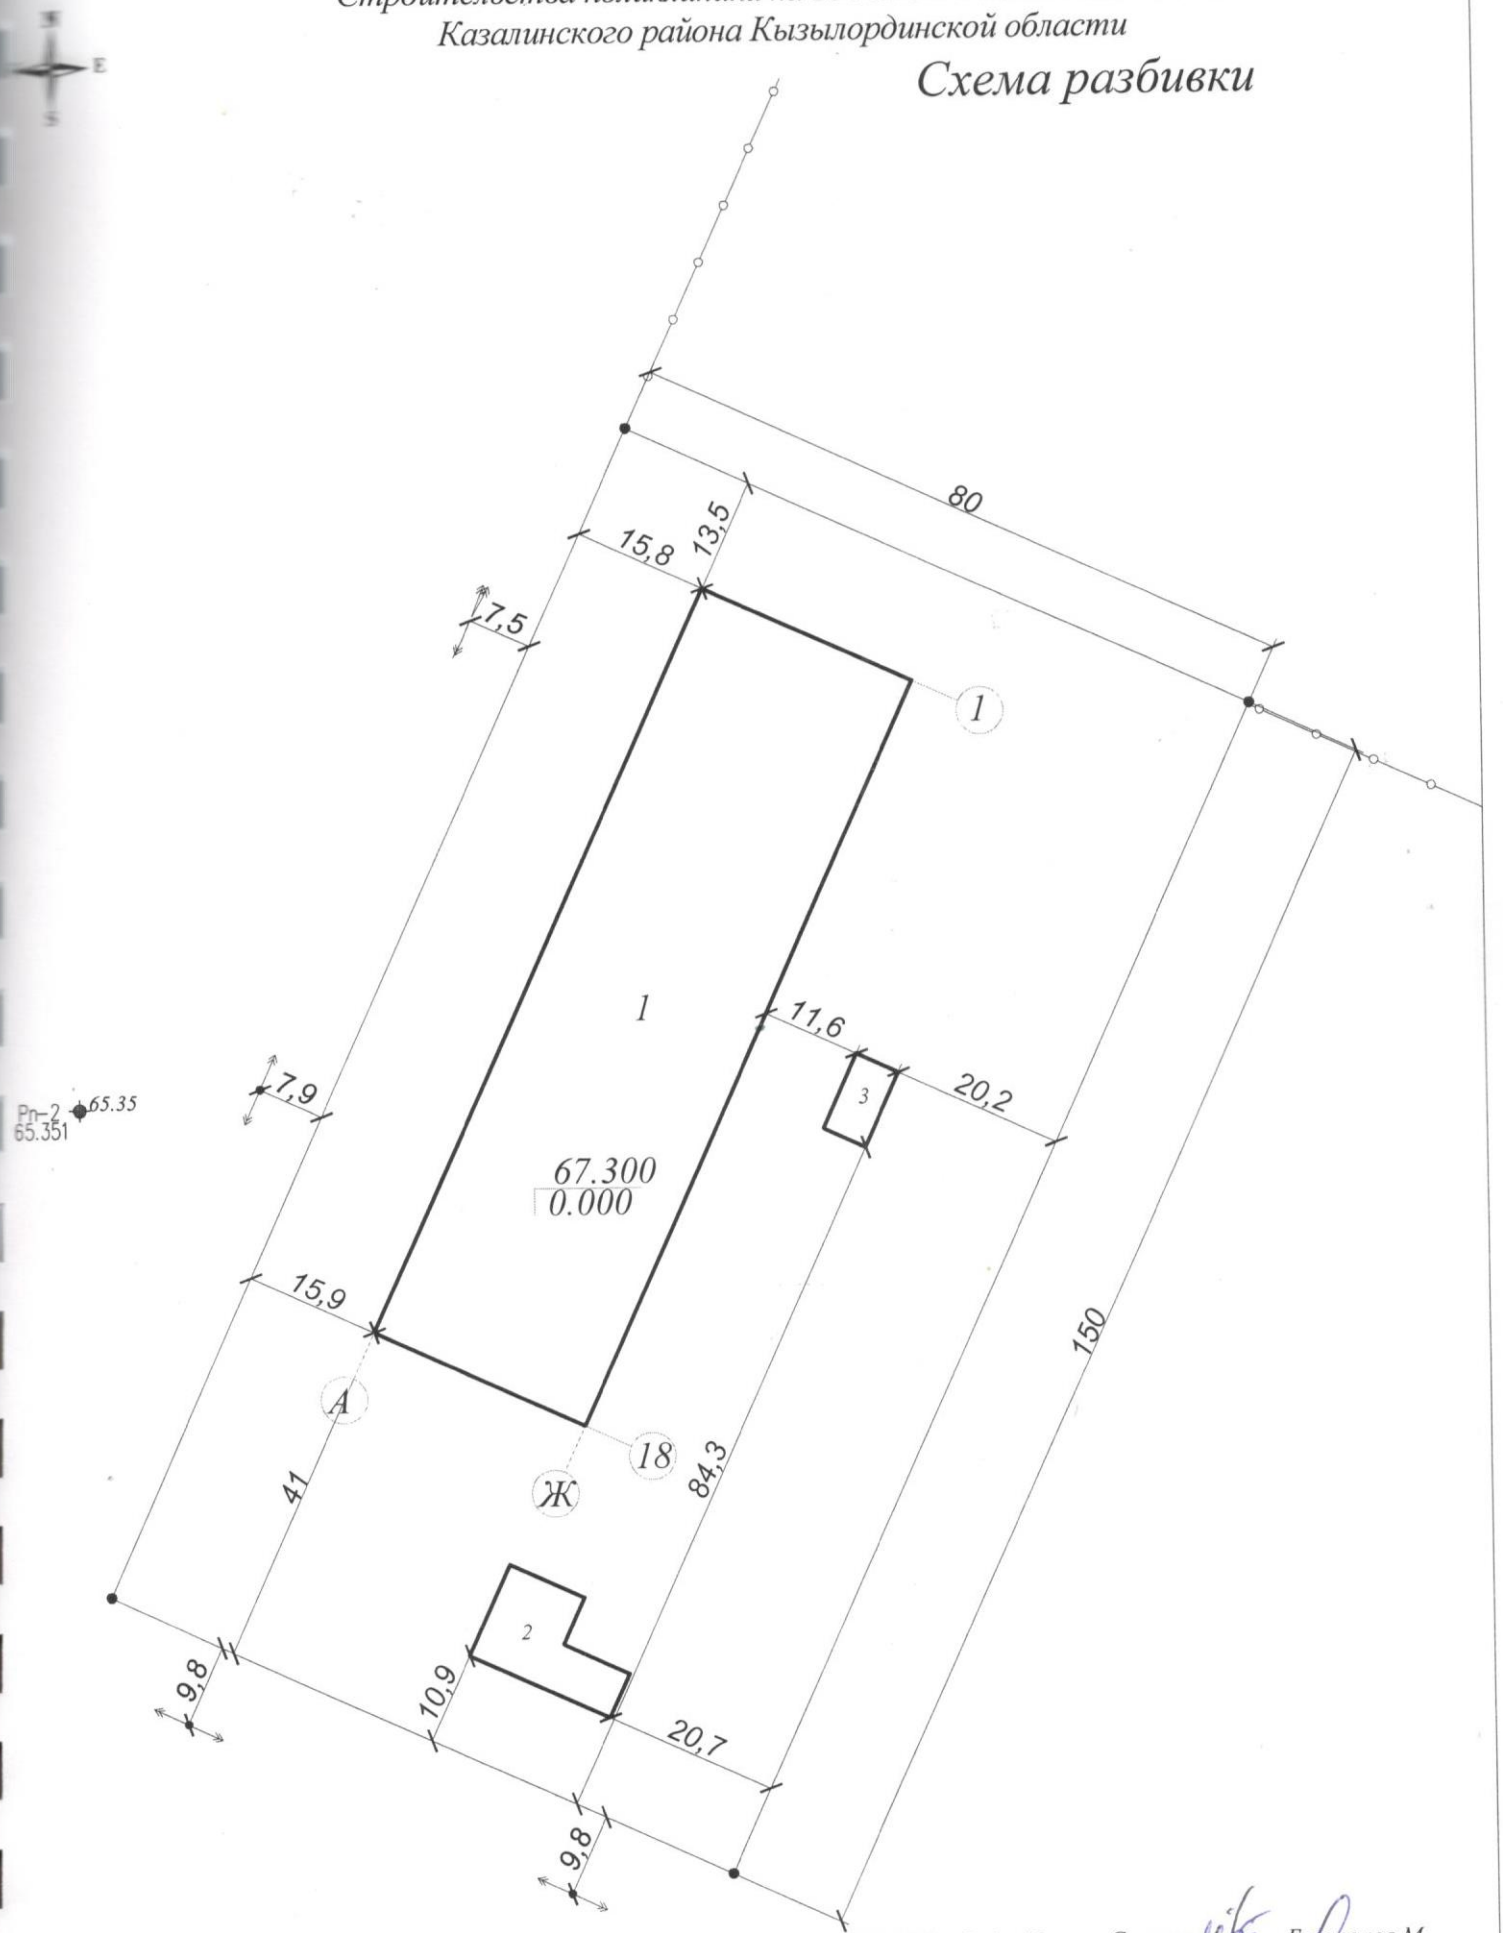

Геодезист ТОО "ГеоЛидерПроектСервис: *Бекжанов М.*
Начальник участка ТОО "SCS Инжиниринг": Бекбауов Р.Д
Технадзор ТОО"Стройтехнопроект KZ A и K": Кайыров С.Н.
Авторнадзор ТОО "Сартобе" Мухаммедиев О.Е.

Строительства поликлиники на 250 мест в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Схема разбивки

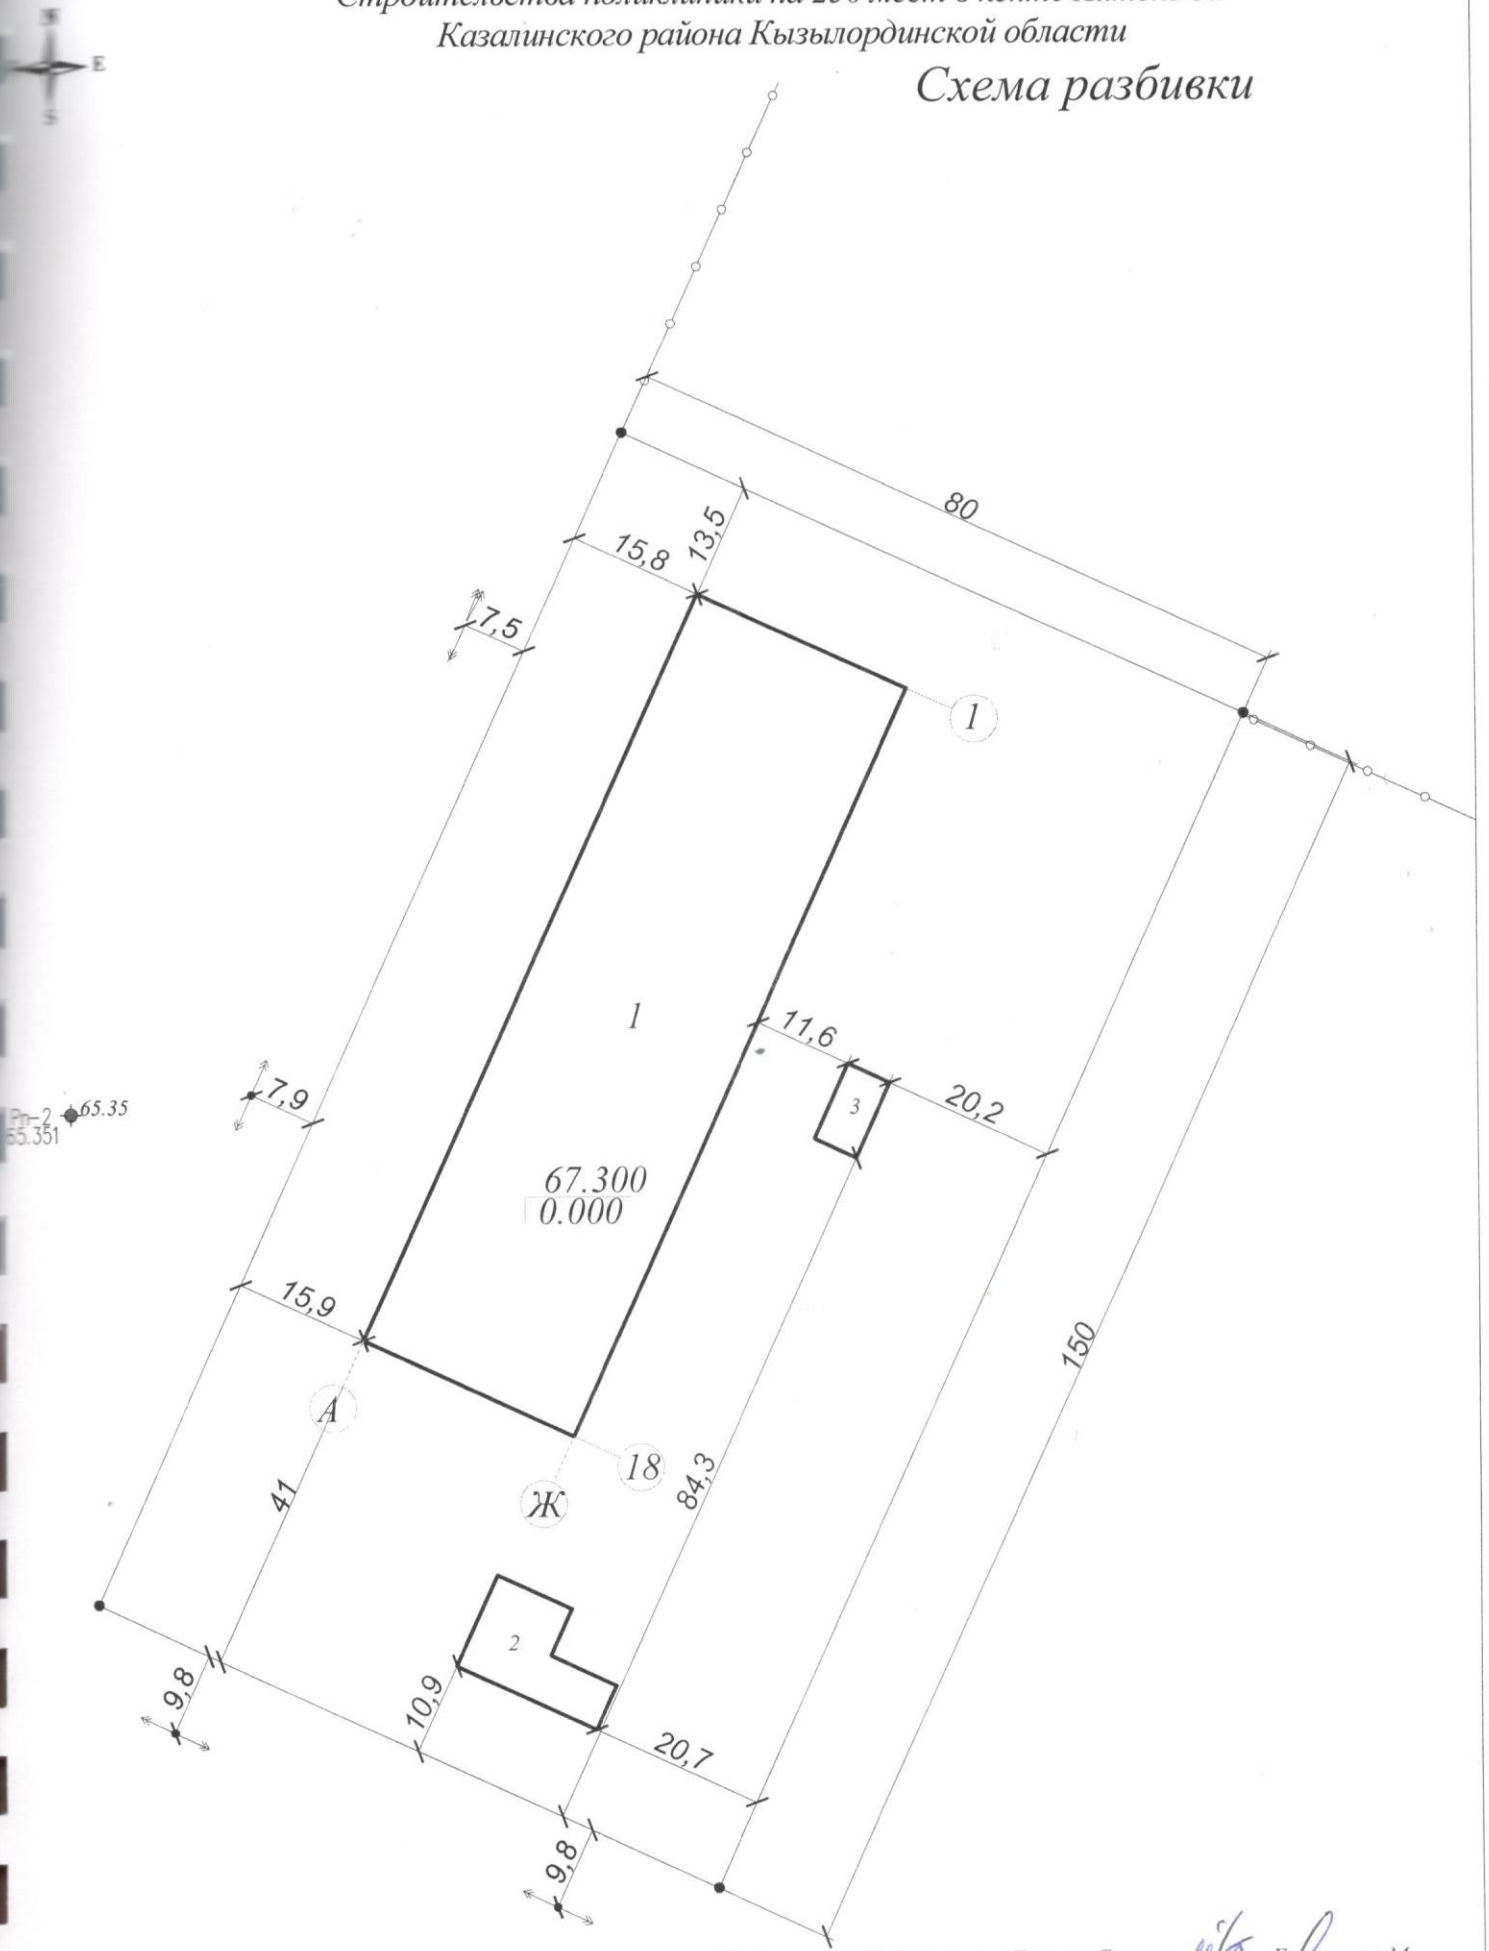

Геодезист ТОО "ГеоЛидерПроектСервис: _____ *Бекжанов М.*

Начальник участка ТОО "SCS Инжиниринг": _____ Бекбауов Р.Д

Технадзор ТОО"Стройтехнопроект KZ A и K": _____ Кайыров С.Н.

Авторнадзор ТОО "Сартобе" _____ Мухаммедиев О.Е.

Строительства поликлиники на 250 мест в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Схема разбивки

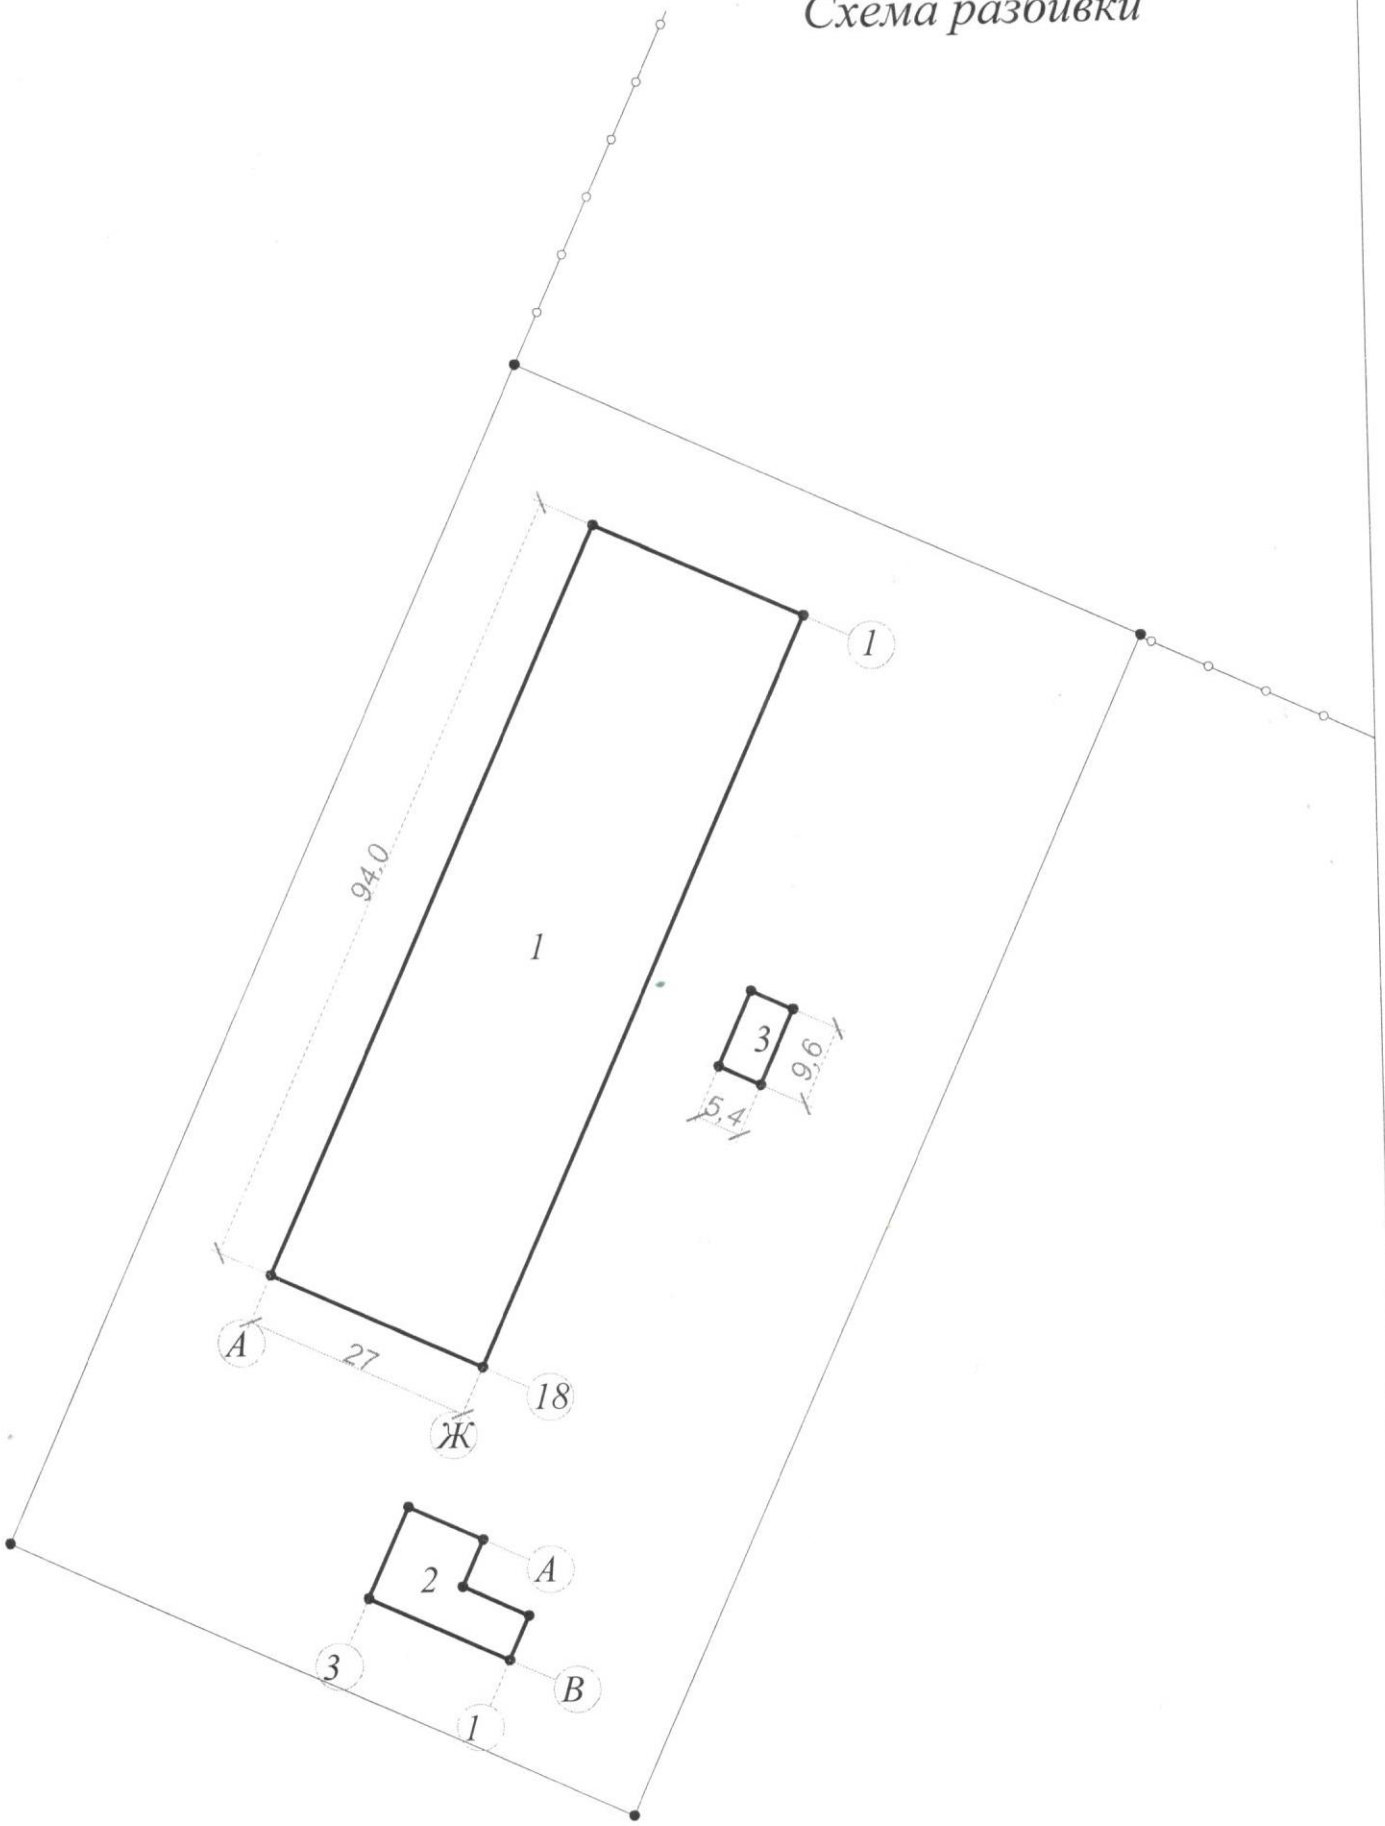

Геодезист ТОО "ГеоЛидерПроектСервис: *Бекжанов М.*
Начальник участка ТОО "SCS Инжиниринг": Бекбауов Р.Д
Технадзор ТОО"Стройтехнопроект KZ A и K": Кайыров С.Н.
Авторнадзор ТОО "Сартобе": Мухаммедиев О.Е.
