Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение 1
К приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632

Утвержденный приказом
Управления строительства № 165-0
от «30» «07» 2024 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" июль 2024 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» БИН 050140003056, индекс 060004 по адресу Атырауская область, г.Атырау, улица Әйтеке Би, дом 77, Руководитель Кусайнов Н.М.

(фамилия, имя, отчество, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от 27 мая 2024г., ТОО «Декор», РК, БИН 960840000720, Атырауская область, г.Атырау, пр.Азаттык, 17, каб.17, индекс 060002, Тел: 87122324542.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27 мая 2024г., ТОО «KZ Құрылыс Сапа» БИН 180640013216, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.А.Пушкина, 60, эксперт Батыров С.С., аттестат №KZ55VJE00046931 от 27.05.2019г., KZ91VJE00047447 от 13.06.2019г., Тел: 87019603340.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27 мая 2024г., ТОО «ДИАС-Проект», БИН 030640000046, РК, г.Шымкент , ул.Гали Орманова , 46А , 87713903366, эксперт Нуралиев Ермек Абсаматович, аттестат №0000253 от 13.01.2017г, Тел: 87242200110

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ВА на 25 мест в а.Суюндук Курмангазинского района»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, Азгирский с.о., с.Суюндук

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____2022 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **решение Акима Азгирского сельского округа Курмангазинского района от 13.09.2022 года №31**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № _____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области области» KZ63REA00352330 от 18.09.2023г.,

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ДИАС-Проект» №62-2022**

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного **ГУ «Управление строительства Атырауской области» приказ №35-ө от 14.02.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **18 сентября 2023 год**;

месяц, год

окончание работ: **28 мая 2024 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4,5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5**

фактически, месяц: **8,5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1		1	
Общая площадь здания	$м^2$	558,57			

Площадь застройки, в том числе крыльцо КР-1 крыльцо КР-2 крыльцо КР-3 крыльцо КР-4 крыльцо КР-5	$м^2$	1487,88 655,13 31,5 9,3 15,5 5,1 2,7			
Полезная площадь	$м^2$	499,38			
Расчетная площадь	$м^2$	352,89			
Строительный объем	$м^3$	2456,2			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание врачебной амбулатории представляет собой одноэтажное прямоугольное симметричное в плане здание с размерами в осях 46,4х13,0м. Высота этажа 3м от пола до потолка.

Функционально здание разделено на три части.

В центральной части (оси 4-6) расположена вестибюльная группа с гардеробной, регистратурой, аптечным пунктом, кабинетом доврачебного приема и изолятором с санузлом. Вход в изолятор отдельный.

В левой части здания (оси 1-4) расположены помещения администрации и персонала, лаборатории, палата с санузлом, процедурный кабинет, кабинет физиотерапевтического лечения, медицинский архив.

Дневной стационар расположен рядом с процедурным кабинетом, кабинетом физиотерапии и наружным входом.

В правой части здания (оси 6-9) расположены кабинеты врачей общей практики и кабинеты узких специалистов, кабинет здорового образа жизни (ЗОЖ), кабинет соцработника, кабинет здорового ребенка, прививочный кабинет. Детское отделение расположено в не проходной зоне, имеет самостоятельный наружный вход. В здании предусмотрены санузлы для посетителей, для инвалидов и отдельно для персонала, вспомогательные и технические помещения.

Ограждающие конструкции - несущие кирпичные стены толщиной 380мм с наружным утеплением жесткими минераловатными плитами на основе базальтового волокна γ=175 кг/м3. Толщина утеплителя принята согласно расчету. =175 кг/м3. Толщина утеплителя принята согласно расчету.

Внутренние несущие стены - кирпичные, толщиной 380мм;

Внутренние перегородки, толщиной 120мм и 250мм.

Покрытие – деревянное

Кровля - чердачная скатная по деревянным стропилам, покрытие кровли - металлочерепица.

Наружная отделка здания:

- *цоколь, колонны – металлические сайдинги*
- *стены - металлические сайдинги*

Конструктивные решения:

Здание врачебной амбулатории решено в жесткой конструктивной схеме с несущими продольными стенами из полнотелого жженного кирпича. Фундаменты – ленточные монолитные под стены из бетона класса С12/15. Отмостка - асфальтовая по бетонному основанию шириной 1,5м перекрывающей пазухи котлована не менее, чем на 0,5 м с уклоном от здания не менее 0,03.

Стены наружные и внутренние выполнены - из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380мм. С утеплением наружных стен из ISOVER OL-E толщиной 50мм и оштукатуренные по сетке цементно-песчаным раствором. Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-31с вып.4 и сер.1.141.1-28с вып.1.

Перегородки - из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на смешанных растворах М 50, толщиной 120 мм.

Перемычки - сборные железобетонные.

Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса С20/25.

Витражи и окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

Дверные блоки внутренние и наружные - деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629

Утеплитель покрытия -минераловатные плиты URCA П85ГФ об. в. 85 кг/м3 - 140мм.

Крыша - чердачная скатная.

Кровля - из профнастил по наклонным деревянным стропилам.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **593,835 млн.теңге**, в том числе строительно-монтажных работ **348,220 млн.тенге**, оборудования **181,990 млн.тенге,** прочие **63,625 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **564,143 млн.теңге**, в том числе строительно-монтажных работ **321,709 млн.тенге**, оборудования **181,990 млн.тенге,** прочие **60,444 млн.тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _С+ (нормальный)_ ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Строительство ВА на 25 мест в а.Суюндук Курмангазинского района»
(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области» Кусайнов Н.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «KZ Құрылыс Сапа» Батыров С.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «ДИАС-проект» Нуралиев Е.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик:
ТОО «Декор» Аскаров П.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Врачебная амбулатория на 25 мест в а.Балкудук	1			654,8	2456,2	558,57				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточный монолитный	из кирпича, толщиной 380мм. С утеплением наружных стен из ISOVER OL-E толщиной 50мм и отштукатуренные по сетке цементно-песчаным раствором	Чердачная скатная по деревянным стропилам, покрытие из профнастила	Автономное	Централизованное, от внутрисельских сетей	Центральный водопровод	Автономное	ПВХ и ПЭ трубы	от существующего подземного газопровода среднего давления

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			558,57					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы

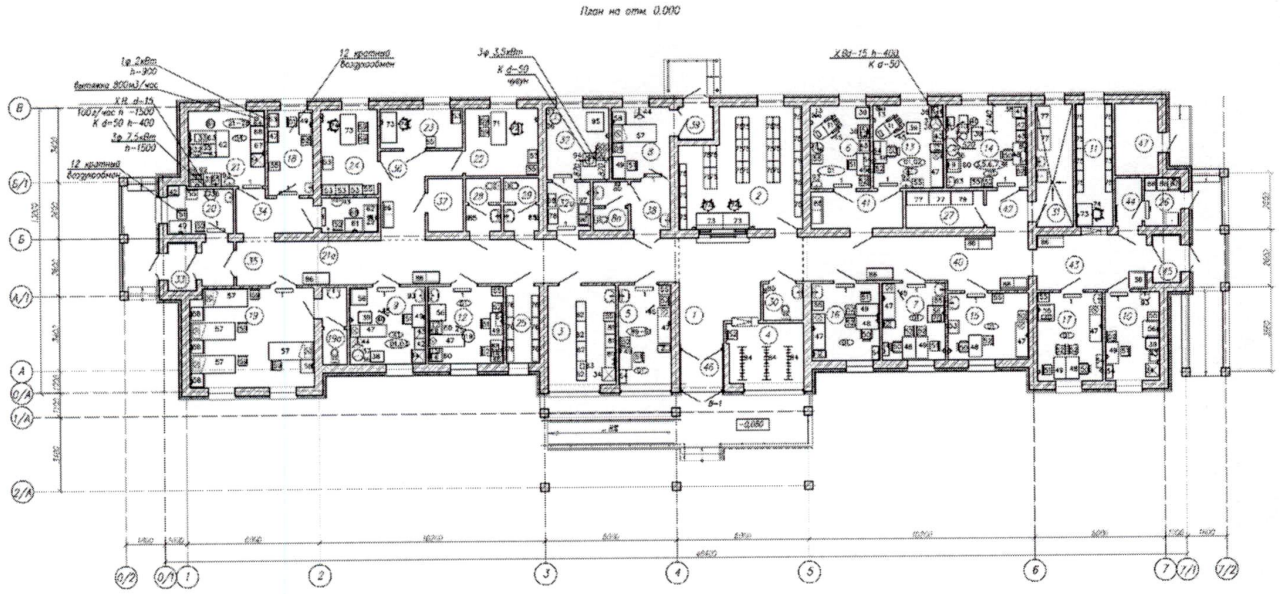

2. Экспликация к поэтажным планам

Экспликация помещений (начало)

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. помещения
1	Вестибюль	20,21	
2	Регистратура	28,27	
3	Аптечный пункт	13,95	
4	Гардеробная для посетителей	9,32	
5	Кабинет доврачебного приема	10,80	
6	Кабинет смотровой	10,26	
7	Кабинет врача общей практики	9,97	
8,8а	Изолятор с сан. узлом (8,69+1,6+1,76)	12,05	
9	Процедурный кабинет	11,94	
10	Прививочный кабинет	10,05	
11	Помещение для картотеки	9,55	
12	Кабинет физиотерапевтического лечения	11,97	
13	Кабинет акушера-гинеколога	12,08	
14	Кабинет стоматолога	14,06	
15	Кабинет соц. работника	11,11	
16	Кабинет здорового образа жизни (ЗОЖ)	10,67	
17	Кабинет здорового ребенка	12,06	
18	Кабинет химизатора	7,92	
19,19а	Палата с сан.узлом (25,01+3,74)	28,75	
20	Кабинет забора мокроты	6,30	
21,21а	Лаборатория (12,00+4,06)	16,06	В1
22	Кабинет заведующего	10,23	
23	Кабинет информатизации	6,70	
24	Кабинет мед статистики	9,91	
25	Медицинский архив	5,32	В1
26	Комната для временного хранения медицинских отходов	3,64	Д

Экспликация помещений (окончание)

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. помещения
27	Бельевая	6,00	В1
28	Туалет для персонала (1,76+1,92)	3,68	
29	Туалет для посетителей (1,76+1,92)	3,68	
30	Туалет для инвалидов	2,98	
31	Комната уборочного инвентаря и хранения дезинфицирующих средств	9,55	Д
32,32а	Стерилизационная с моечной (9,35+4,40)	13,75	
33	Тамбур	2,52	
34	Коридор	6,17	
35,35а	Коридор (зона ожидания) (2,88+40,67)	43,55	
36	Коридор	10,15	
37	Электрощитовая	3,87	Д
38	Тамбур-шлюз изолятора	4,00	
39	Тамбур изолятора	2.10	
40	Коридор (зона ожидания)	22,16	
41	Тамбур-шлюз	7,05	
42	Коридор	3,23	
43	Коридор (зона ожидания)	12,67	
44	Коридор	2,71	
45	Тамбур	2,83	
46	Тамбур	3,38	
47	Тепловой и водомерный узел	6,49	Д
48*	Венткамера	11,89	В1
Общая площадь здания (площадь этажа в пределах внутренних поверхностей наружных стен) 1 этаж и венткамера (544,01+14,56)		558,57	
Полезная площадь здания		497,45	
Расчетная площадь здания		353,64	

3.Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
				асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями			
1	2	3	4	5	6	7
0,400	748,75	72,21		1254	580	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1547,25	1547,25				

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Вестибюль	20,21			
	2		Регистратура	28,27			
	3		Аптечный пункт	13,95			
	4		Гардеробная для посетителей	9,32			
	5		Кабинет доврачебного приема	10,80			
	6		Кабинет смотровой	10,26			
	7		Кабинет врача общей практики	9,97			
	8, 8а		Изолятор с санузлом (8,69+1,6+1,76)	12,05			
	9		Процедурный кабинет	11,94			
	10		Прививочный кабинет	10,05			
	11		Помещение для картотеки	9,55			
	12		Кабинет физиотерапевтического лечения	11,97			
	13		Кабинет акушера-гинеколога	12,08			
	14		Кабинет стоматолога	14,06			
	15		Кабинет соцработника	11,11			
	16		Кабинет здорового образа жизни (ЗОЖ)	10,67			
	17		Кабинет здорового ребенка	12,06			
	18		Кабинет химизатора	7,92			
	19, 19а		Палата с санузлом (25,01+3,74)	28,75			
	20		Кабинет забора мокроты	6,30			
	21, 21а		Лаборатория (12,00+4,06)	16,06			
	22		Кабинет заведующего	10,23			
	23		Кабинет информатизации	6,70			

	24		Кабинет мед.статистики	9,91			
	25		Медицинский архив	5,32			
	26		Комната для временного хранения медицинских отходов	3,64			
	27		Бельевая	6,00			
	28		Туалет для персонала (1,76+1,92)	3,68			
	29		Туалет для посетителей (1,76+1,92)	3,68			
	30		Туалет для инвалидов	2,98			
	31		Комната уборочного инвентаря и хранения дезинфицирующих средств	9,55			
	32, 32а		Стерилизационная с моечной (9,35+4,40)	13,75			
	33		Тамбур	2,52			
	34		Коридор	6,17			
	35, 35а		Коридор (зона ожидания) (2,88+40,67)	43,55			
	36		Коридор	10,15			
	37		Электрощитовая	3,87			
	38		Тамбур-шлюз изолятора	4,00			
	39		Тамбур изолятора	2,10			
	40		Коридор (зона ожидания)	22,16			
	41		Тамбур-шлюз	7,05			
	42		Коридор	3,23			
	43		Коридор (зона ожидания)	12,67			
	44		Коридор	2,71			
	45		Тамбур	2,83			
	46		Тамбур	3,38			
	47		Тепловой и водомерный узел	6,49			
	48		Венткамера	11,89			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
	558,57						

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	Ленточный монолитный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены	из жженного кирпича, толщиной 380мм. С утеплением наружных стен из ISOVER OL-E

				толщиной 50мм и отштукатуренные по сетке цементно-песчаным раствором
	2) перегородки			кирпич
3	Перекрытия	чердачное		деревянная балка сечением 200х100 мм, пропитанная огне-био защитной краской.
		междуэтажное		
4	Крыша			Чердачная скатная, покрытие из профнастила по деревянным стропилам
5	Полы	1-го этажа		Линолеум, керамогранитные плиты
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		Из ПВХ профилей, с заполнением двухкамерными стеклопакетами
		двери		внутренние - деревянные, входные – из ПВХ
7	Отделочные работы	внутренние		штукатурка цементным раствором, шпатлевка, улучшенная окраска водоэмульсионными моющими составами.
		наружные		Металлические сайдинги
8	Горячее водоснабжение			автономное от котла
9	Водопровод			Центральный водопровод
10	Канализация			ПВХ и ПЭ трубы
11	Электроосвещение			Централизованное, от внутрисельских сетей
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		Автономное, от существующего подземного газопровода среднего давления
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек		
	КТПНГ	ДЭС	Мусоросборник
Площадь (м 2)	5,25	5,25	
Высота строения (м)			
Объем строения (м 3)			
Фундамент	ФБС		
Стены			
Перекрытия			
Крыша			
Полы			
Окна			
Двери			
Внутренняя отделка			

Наружная отделка			
Печи			

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»,

Руководитель управления Кусайнов Н.М. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «ДИАС-проект»,

Эксперт Нуралиев Ермек Абсаматович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,043
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	0,051
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические (электроосвещение)	штук (далее – шт)	10
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3)деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные ВЛ-10кВ	шт	2
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,1
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АСБ 3х50мм^2 напряжением ВЛ-10кВ	км	0,089
	2) марки АВБбШв 4х70, 4х6, 4х4 напряжением КЛ-0,4кВ	км	0,529
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	8
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»,
Руководитель управления Кусайнов Н.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «ДИАС-проект»,
Эксперт Нуралиев Ермек Абсаматович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2	1547,25	
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтобетонное покрытие	м2	1127	
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2	409	
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт		
12	Кусты (Ель)	шт	47	
13	Кустарники (сосна)	шт	42	
14	цветники			
15	газоны	м2	1547,25	
16	порода деревьев			
17	возраст	год	1-3	

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»,
Руководитель управления Кусайнов Н.М. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «ДИАС-проект»,
Эксперт Нуралиев Ермек Абсаматович _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	113,9	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	113,9	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	3	
	Задвижка d-25	шт		
	" d- 50	шт	3	
	" d-	шт		
	Вентили d-25	шт		
	" d- 32	шт		
	" d- 40	шт	1	
	Кран d-25	шт		
	" d- 63	шт	3	
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт	1	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	114,1	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	114,1	

3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	8	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»,
Руководитель управления Кусайнов Н.М._____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «ДИАС-проект»,
Эксперт Нуралиев Ермек Абсаматович_____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	236	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 32	шт		
	d =63	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =32	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной шаровой стальной фланцевый полнопроходной типа LD, PN40, DN32	шт	1	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»,
Руководитель управления Кусайнов Н.М._____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «ДИАС-проект»,
Эксперт Нуралиев Ермек Абсаматович_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ДИАС-ПРОЕКТ
