Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.21г)

Декларация о соответствии

«16» 01 2024 г

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Альфа строй-KZ»**
160012, город Шымкент, район Каратау, Жилой массив Сайрам, здание 10/1
БИН: 070640025118, тел +7705 272-82-28
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: Жолдасов Медет Алмасбекович-директор ТОО «Альфа строй-KZ»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
- Электроснабжение скважин 430, 431, 432 на месторождении Арыскум.
по адресу: Кызылординская область, Жалагашский район, месторождение Арыскум.
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является**: АО «ПетроКазахстанКумкольРессорсиз»,**
Чжао Сяомин-председатель правления
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана АО«ПетроКазахстан Кумколь Рессорсиз»:
проект 23-24/02. Электроснабжение скважин 430, 431, 432 на месторождении Арыскум,
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Рессорсиз», приказ №163-П от 21.12.2022 года
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические поазатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность воздушный линии электроснабжения Вл 6 кВ скв №430	м	30	-	30	-
Протяженность воздушный линии электроснабжения Вл 6 кВ скв №431	м	15	-	15	-
Протяженность воздушный линии электроснабжения Вл 6 кВ скв №432	м	65	-	65	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Источником электроснабжения объекта является существующая воздушная линия ВЛ- 6 кВ. Воздушные линии ВЛ-6 кВ электроснабжения скважин выполнены сталеалюминиевыми проводами марки АС сечением 50 мм2, подвешенными на железобетонных опорах.

Опоры под воздушную линию выполнены на железобетонных стойках СВ-105-5. Закрепление стоек выполняются без ригеля, в сверленные котлованы на глубину 2,5 м. диаметром 350-450 мм. На промежуточных опорах используются штыревые изоляторы ШФ20-В, применяемые врайонах загрязнения солончаковой пылью. На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных изолирующих подвесок, содержащих два подвесных изолятора типа ПС 70 (ПС-70Д). Для питания электроприёмников скважин предусмотрена установка комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН, смонтированные на сборные бетонные блоки. Под подошвой фундаментов выполнена подготовка из щебня толщиной 100мм., пропитанная битумом до полного насыщения. В качестве мер безопасности эксплуатации электроустановки предусматривается устройство системы защитного заземления с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом для оборудования КТТІН-6/0,4кВ.

Искусственные заземлители выполнены из стальных стержней диаметром 16мм, длиной 5м, ввинченных вертикально в землю. Верхние концы стержней заглублены на 0,5м от поверхности земли и электрически соединены между собой сталью диаметром 16мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

-КТПН 6/0,4кВА – 3комплект.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **16.10.2023 года;**

(месяц, год)

окончание работ: **29.12.2023 года;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** месяца;

фактически, месяц: **2,5** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
- прилагается.

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
- не требуется

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
- не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
- не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
- Электроснабжение скважин 430, 431, 432 на месторождении Арыскум,

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Жолдасов Медет Алмасбекович – директор ТОО «Альфа строй-KZ»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Исполнительная схема
трассы ВЛ-6кВ на м/р Арыскум скважины №430.

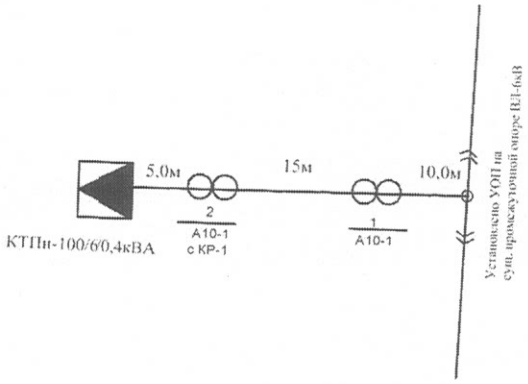

скв.№430

При строительстве ВЛ-6кВ применены:
1.Железобетонные стойки СВ-105 в кол-ве 4шт.
2.Траверсы ТМ-6 в кол-ве 2шт.
3.Траверсы ТМ-2 в кол-ве 1шт.
4.Изоляторы ШФ-20 в кол-ве 12 шт.
5.Изоляторы ПС-70 в кол-ве 12 шт.
6.Провод АС 50 /8 в кол-ве 90 м.

Протяженность ВЛ-6кВ L= 30 м

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ " Пулатов Ж .

Вед.инженер ОКС
(Электр. часть и КИП иА) АО "ПККР" Али Б./Алдунгаров Б.

Тех надз вед. инженер по надзору
ОКС АО "ПККР" Бисенов К../Накыпбаев Е.

Тех надз вед. инженер по надзору
ОКС АО "ПККР" Байдуйсенов С../ТлеубергеновР.

Авторский надзор ГИП ПГ АО "ПККР" Токшылыкова Г.

Проект AR 23-24/02	ПГ АО "ПККР"
Электроснабжение скв. №430,431,432 на м/р Арыскум.	Заказчик: АО "ПККР"
Исполнительная схема трассы ВЛ-6кВ на м/р Арыскум скважины №430.	Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Исполнительная схема
трассы ВЛ-6кВ на м/р Арыскум скважины №431.

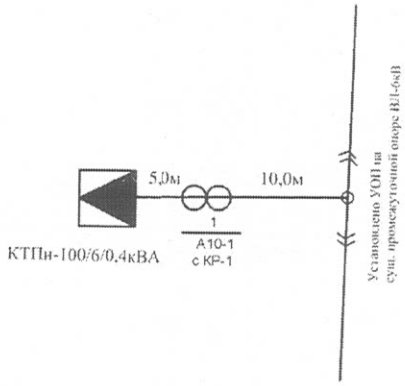

скв.№431

При строительстве ВЛ-6кВ применены:
1.Железобетонные стойки СВ-105 в кол-ве 2шт.
2.Траверсы ТМ-6 в кол-ве 1шт.
3.Траверсы ТМ-2 в кол-ве 1шт.
4.Изоляторы ШФ-20 в кол-ве 9 шт.
5.Изоляторы ПС-70 в кол-ве 6 шт.
6.Провод АС 50 /8 в кол-ве 45 м.

Протяженность ВЛ-6кВ L= 15 м

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ " Пулатов Ж .

Вед.инженер ОКС
(Электр. часть и КИП иА) АО "ПККР" Али Б./Алдунгаров Б.

Тех надз вед. инженер по надзору
ОКС АО "ПККР" Бисенов К../Накыпбаев Е.

Тех надз вед. инженер по надзору
ОКС АО "ПККР" Байдуйсенов С../ТлеубергеновР.

Авторский надзор ГИП ПГ АО "ПККР" Токшылыкова Г.

Проект AR 23-24/02	ПГ АО "ПККР"
Электроснабжение скв. №430,431,432 на м/р Арыскум.	Заказчик: АО "ПККР"
Исполнительная схема трассы ВЛ-6кВ на м/р Арыскум скважины №431.	Исполнитель: ТОО "Нурлытау ЛТД"

Исполнительная схема
трассы ВЛ-6кВ на м/р Арыскум скважины №432.

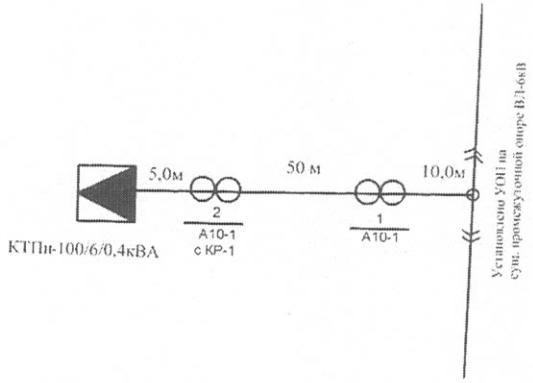

скв.№432

При строительстве ВЛ-6кВ применены:
1.Железобетонные стойки СВ-105 в кол-ве 4шт.
2.Траверсы ТМ-6 в кол-ве 2шт.
3.Траверсы ТМ-2 в кол-ве 1шт.
4.Изоляторы ШФ-20 в кол-ве 12 шт.
5.Изоляторы ПС-70 в кол-ве 12 шт.
6.Провод АС 50 /8 в кол-ве 195 м.

Протяженность ВЛ-6кВ L= 65 м

Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ " Пулатов Ж .

Вед.инженер ОКС
(Электр. часть и КИП иА) АО "ПККР" Али Б./Алдунгаров Б.

Тех надз вед. инженер по надзору
ОКС АО "ПККР" Бисенов К./Накыпбаев Е.

Тех надз вед. инженер по надзору
ОКС АО "ПККР" Байдуйсенов С./ТлеубергеновР.

Авторский надзор ГИП ПГ АО "ПККР" Токшылыкова Г.

Проект AR 23-24/02	ПГ АО "ПККР"
Электроснабжение скв. №430,431,432 на м/р Арыскум.	Заказчик: АО "ПККР"
Исполнительная схема трассы ВЛ-6кВ на м/р Арыскум скважины №432.	Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"
