Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «СЕрВИС НС», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, улица Караганды, строение 160, БИН 000340005764***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Шохшин Жандоса Сарсенбековича***

фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту ***«Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы- Усть-Каменогорск- Шемонаиха - гр. РФ» км 23»***

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является ***АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице заместителя директора Алматинского областного филиала Акжолова Абзала Кокталовича***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации_____

   наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Алматыдорпроект», № 18-0212/22 от 04.07.20202 г.***

   наименование проектной организации, номер проекта

   утвержден (а) ***приказом РГУ «Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК» № 100 от 15.08.2022 г.***

   наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее наименование конструктивных элементов	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина нижнего пояса пролетного строения моста (фермы) на км 23	п. м.	44,41	44,41	46,13	46,13

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Схема и длина моста определились исходя из существующего поперечника в створе перехода и габаритами приближения конструкций моста к существующей автомобильной дороге. Подъем на мост и сход с моста запроектирован по лестничным сходам. Сверху лестничные сходы закрыты от атмосферных осадков светопрозрачной кровлей из поликарбоната. Покрытие пешеходной части моста мелкозернистая щебеночно-мастичная смесь толщ. 3-5см. Опоры моста железобетонные монолитные на свайном фундаменте. Опоры сходов железобетонные монолитные на естественном основании. Вертикальный подмостовой габарит принят в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей в РК и составляет 5,5м. Ширина пешеходной части моста и лестничных сходов – 2,3м. Перильное ограждение выполнено из металлических профилей из оцинкованной стали. Элементы моста рассчитаны на восприятие временной нагрузки от пешеходов интенсивностью 400 кг/м2:_____

Км+	Длина фермы, м	Пролетная схема, м	Длина моста с лестничной площадкой, м
23	44,41	1х44	58,92
			Итого: 58,92м

Опоры моста запроектированы одностолбчатыми прямоугольного сечения (1.2х2,7м) из монолитного железобетона с совмещенными фундаментами под опору моста и стоек лестничных сходов. Фундаменты на свайном основании из буровых свай диам. 1200мм. Пешеходная часть на пролетном строении принята шириной 2,3м Гидроизоляция плиты пешеходной части производится наплавлением материала «Техноэластмост-Б» с защитным слоем толщ. 40мм из бетона с армосеткой, по которой укладывается мелкозернистая щебеночно-мастичная смесь серповидного очертания слоем 3-5см. Водоотвод с пешеходной части осуществляется по водоотводным лоткам конструкции Стандартпарк расположенным по краям пешеходной части к концам пролетного строения. Вода улавливается поперечными лотками и сбрасывается по трубам ПВХ диам. 110-150мм. Пешеходная часть ограждается перилами высотой 1,2м, выполненными из стальных

прокатных профилей различного поперечного сечения из оцинкованной стали. Два типа лестничных сходов: Правый - на ж.б. косоурах со сборными железобетонными маршами и площадками, Левый - башенного типа с железобетонными маршами и площадками. Лестничные сходы закрыты от атмосферных осадков кровлей из поликарбоната.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: ***июнь 2023 года;***
   месяц, год
   окончание работ: ***сентябрь 2024 года.***
   месяц, год
   при продолжительности строительства, ***6 (шесть)*** месяца;
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 (шесть);***
   фактически, месяц: ***15 (пятнадцать);***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
   9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
    10-1. исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, *(электроснабжение и связь)* обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
    РЖ Отеген батыр
    наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения РОЗиСП Айтенова У.С.;
    фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СЕрВИС НС» считает объект: ***«Устройство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Алматы- Усть-Каменогорск- Шемонаиха - гр. РФ» км 23»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при капитальном ремонте объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Директор ТОО «СЕрВИС НС» Шохшин Ж.С.***

«24» 09 2024 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Исполнительная съемка

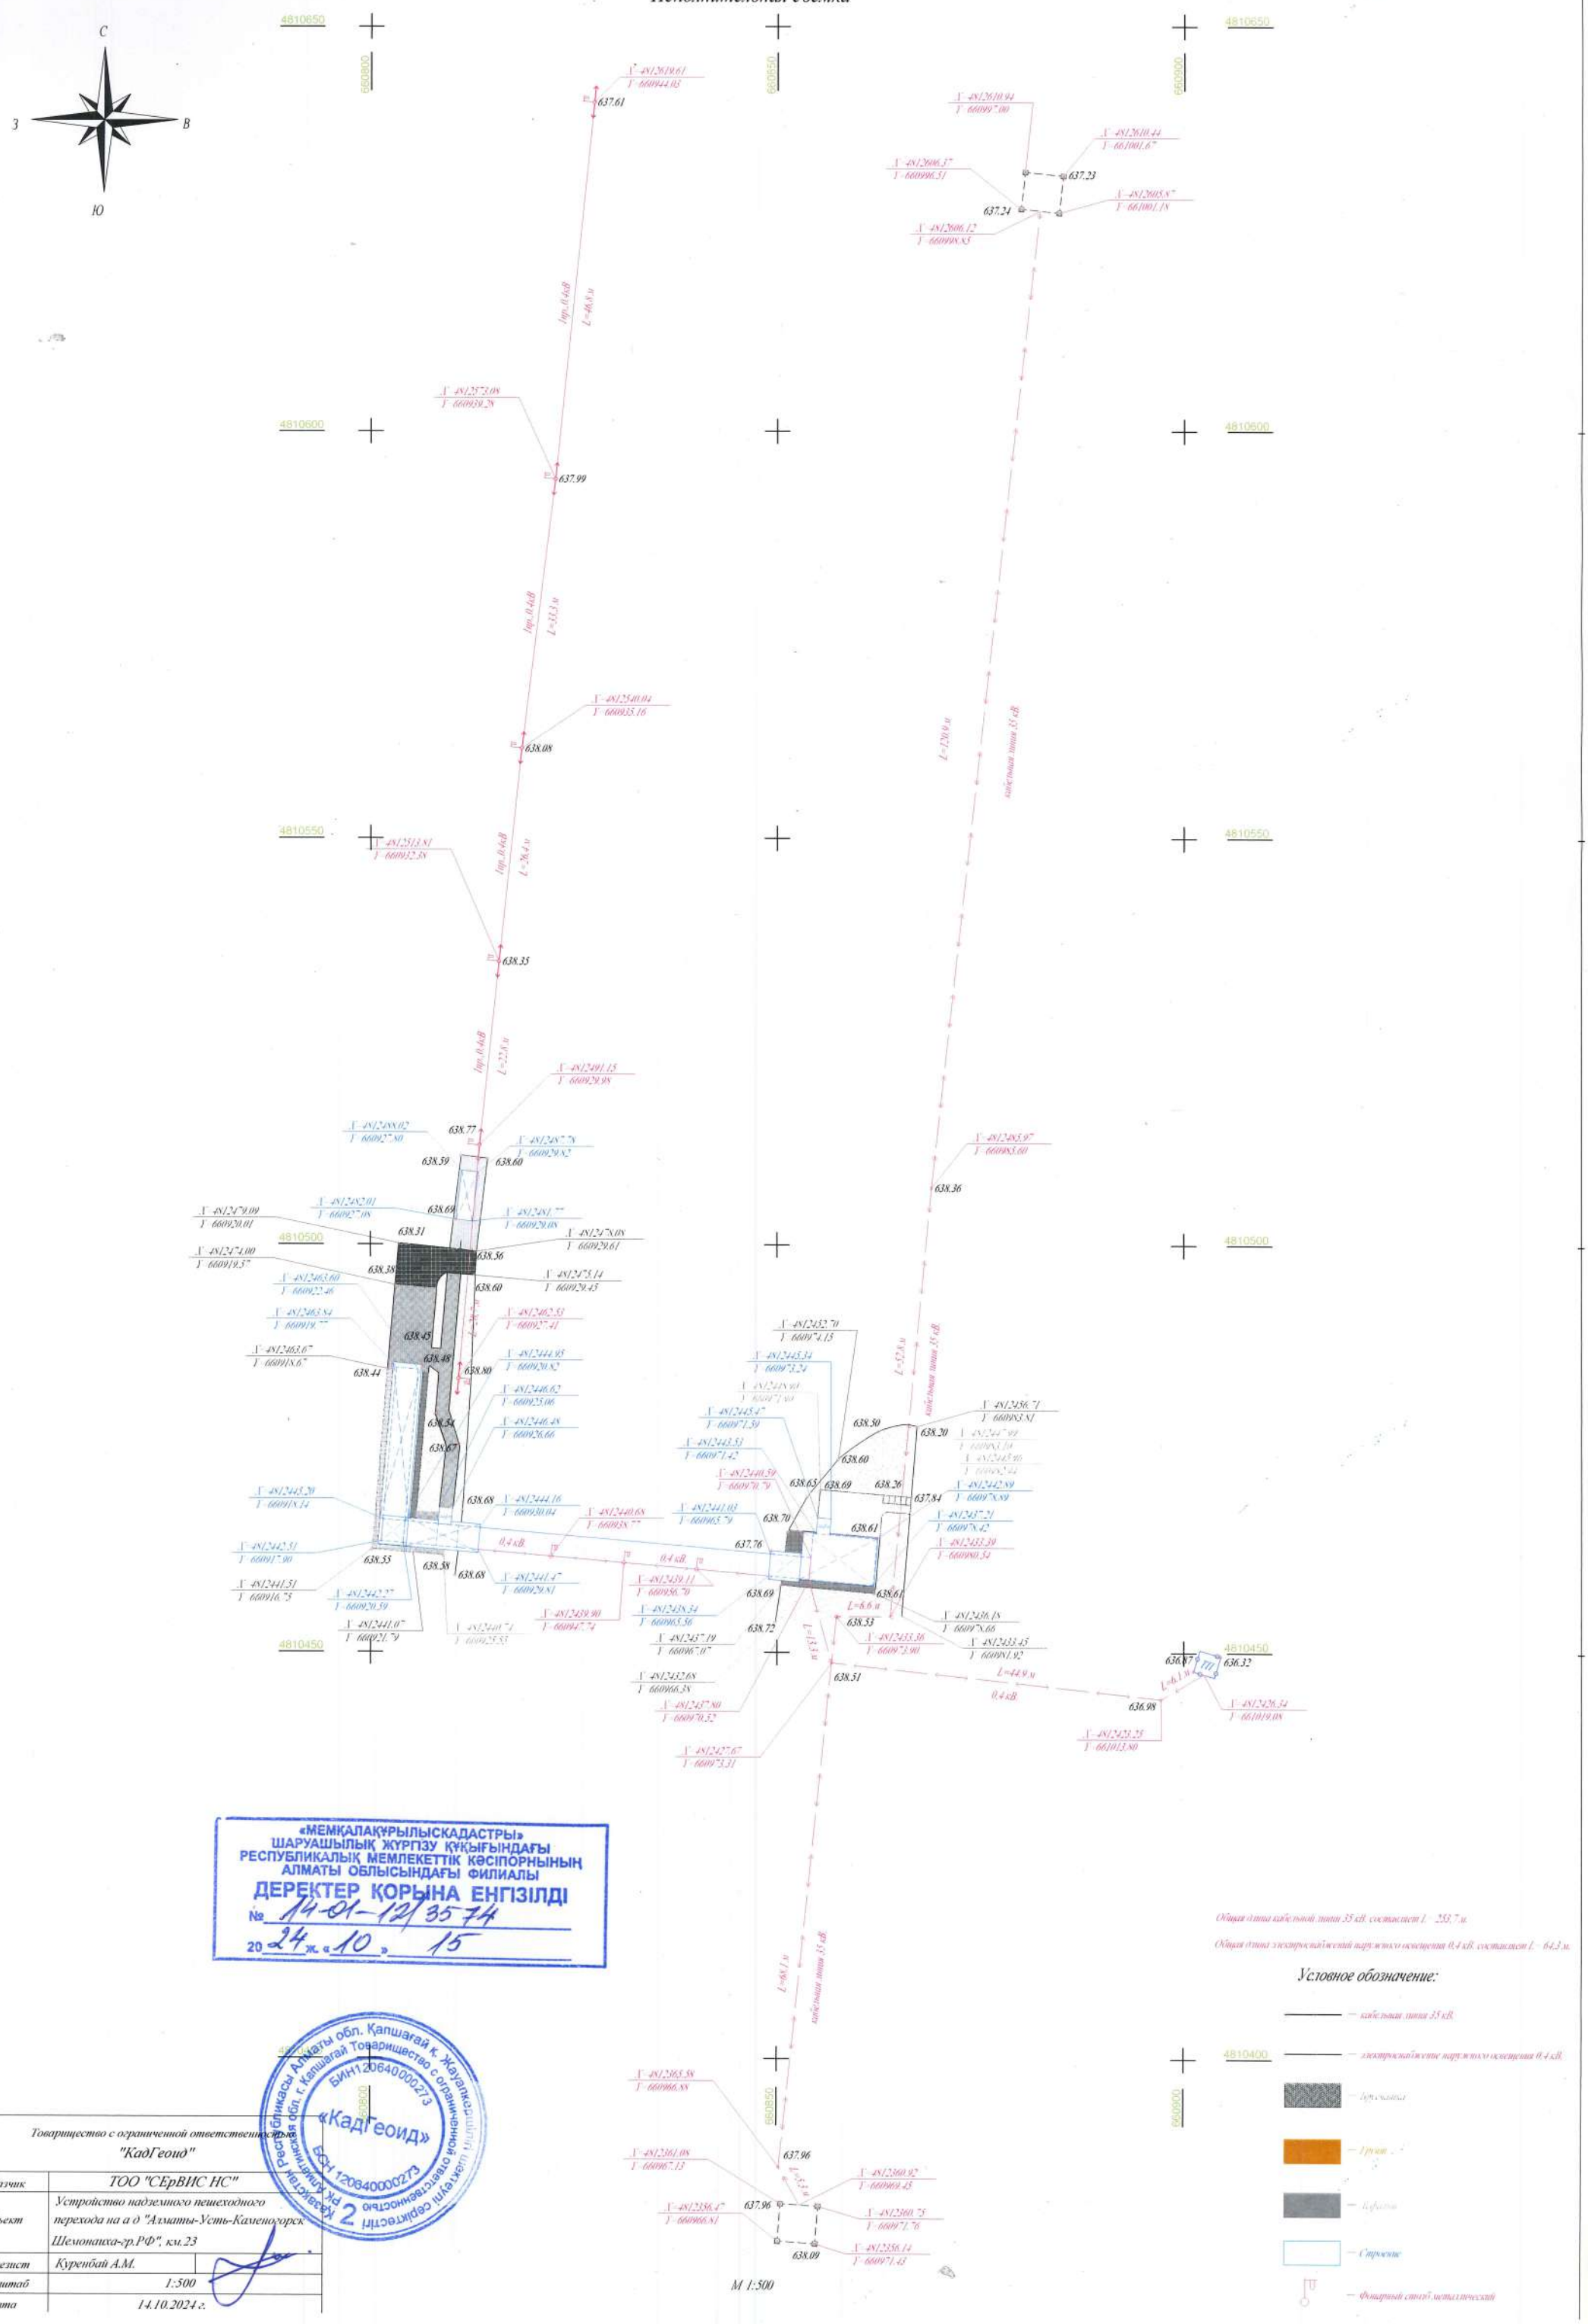

«МЕМҚАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 14-01-12/3574
20 24 ж. «10» 15

Общая длина кабельной линии 35 кВ. составляет L=253.7м.

Общая длина электроснабжений наружного освещения 0,4 кВ. составляет L=643.3м.

Условное обозначение:

- кабельная линия 35 кВ.
- электроснабжение наружного освещения 0,4 кВ.
- Бордюр
- Грунт
- Асфальт
- Строение
- Фонарный столб металлический

М 1:500

Товарищество с ограниченной ответственностью "КадГеоид"	
заказчик	ТОО "СЕрВИС НС"
объект	Устройство надземного пешеходного перехода на а д "Алматы-Усть-Каменогорск Шемонаиха-гр.РФ", км.23
геодезист	Куренбай А.М.
масштаб	1:500
дата	14.10.2024 г.

Қазақстан Республикасы Алматы обл. Қапшағай к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БИН 120640000273 «КадГеоид» БСН 120640000273 РК Алматинская обл. г. Капшагай Товарищество с ограниченной ответственностью
