Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 19 » октября 2020 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», 100900, Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ул.Мынбаева, 44**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от «13» октября 2020г., ТОО «Компания НурайСтрой», директор Акмагамбетов Жанат Канатович, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., Квартал 016, дом 4340**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «13» октября 2020г., ТОО "Актаустройэксперт", Оспанов Ерканат Карбаевич, аттестат эксперта №KZ55VJE00041014 от 14.09.2018 г., №KZ33VJE00039567 от 16.07.2018 г., №KZ61VJE00039257 от 29.06.2018 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) **от «13» октября 2020г. ТОО "Аква-Рем";, Асхадуллин Фаниль Файзулханович, гл. инженер проекта, приказ №105а, от 06.08.2019г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Нуринский район, с.Акмешит**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **№4 от «10» сентября 2014 г распоряжение акима с.Акмешит Нуринского района «О выделении земельного участка для строительства насосной станции и водопроводных сетей »**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», KZ09REA00142812 от 22 августа 2019 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Аква-Рем» , 04-2014**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», приказом №44-4 от 13 июля 2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 г. ;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5 ;**
фактически, месяц: **5,5 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь	$м^2$	14 000	14 000	14 000	14 000
Водовод	м	3 132	3 132	3 208	3 208
Водопроводные сети	м	10 176	10 176	10 229,02	10 229,02
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня 160 м3	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения ВЛ-10кВ	м линии	4130	4130	4130	4130
Трасформаторная подстанция КТПН 10/0,4-25кВа	комплект	1	1	1	1
Объем подачи воды	$м^3$/год	89 122,05	89 122,05	89 122,05	89 122,05

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь	число	площадь квартир,

	квартир	квартир, м2		квартир	м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трёхкомнатных четырёхкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: для водоснабжения с.Акмешит выполнено: строительство водовода общей протяжённостью 3208 м (диаметром 110 мм) и водопроводных сетей общей протяжённостью 10 229,02 м (диаметром 110 мм – 7230,47 м, диаметром 63 мм – 385,85 м, диаметром 32 мм – 2612,7 м), бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин, насосная станция в количестве 1 шт, . Колодцы из сборных ж/б элементов - диаметром 2000 мм в количестве 2 шт, диаметром 1500 мм в количестве 124 шт, диаметром 1000 мм в количестве 5 шт, пожарные гидранты в количестве 33 шт, задвижки – диаметром 150 мм 1 шт, диаметром 100 мм 72 шт, диаметром 50 мм 88 шт, клапан обратный диаметром 100 мм 1 шт, клапан обратный диаметром 50 мм 2 шт, вентили диаметром 32 мм 62 шт, вантузы диаметром 50 мм 11 шт, счетчики холодной воды диаметром 50 мм 1 шт, счетчики холодной воды диаметром 32 мм 5 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 194 шт. Благоустройство территории насосной станций: ограждение металлическое с воротами (400 м). Благоустройство территории ВНБ: ограждение металлическое с воротами (200 м). Строительство линии электроснабжения – воздушная линия ВЛ-10кВ протяженностью 4130 м (опоры СВ-105-3,5 - 81 шт, СВ-164-12 – 2 шт), кабельная линия длиной 175 м, монтаж трансформаторных подстанций, разъединители РЛНД 1 шт, счетчики электроэнергии 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **388 057,173** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **368 912,61008** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **5 518,239** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **349 114 ,70907** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **332 021,34907** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5 518,239** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района;**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Акмагамбетов К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Оспанов Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Асхадуллин Ф.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Акмагамбетов Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	4,130
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 0,4 кВ	км	
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	Штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	83
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		-
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	12,33
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		-
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
	4) светильники светодиодные	шт	-
10	Кабели:		
	АВБбШв 4х16	км	0,0102
11	Муфты соединительные	шт	2
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	1

14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик Акмагамбетов К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Асхадуллин Ф.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	3 208	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	3 208	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	10 229	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	10 229	
	5)	м	-	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	131	
	Задвижка (затвор) d-150 мм	шт	1	

	" d-100 мм	шт	72	
	" d-50 мм	шт	88	
	Вентили d-32 мм	шт	62	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	Кран d-63 мм	шт	-	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	Гидрант	шт	33	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	3	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая	м	-	

	протяженность)			
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб 1:50	Масштаб 1:50
	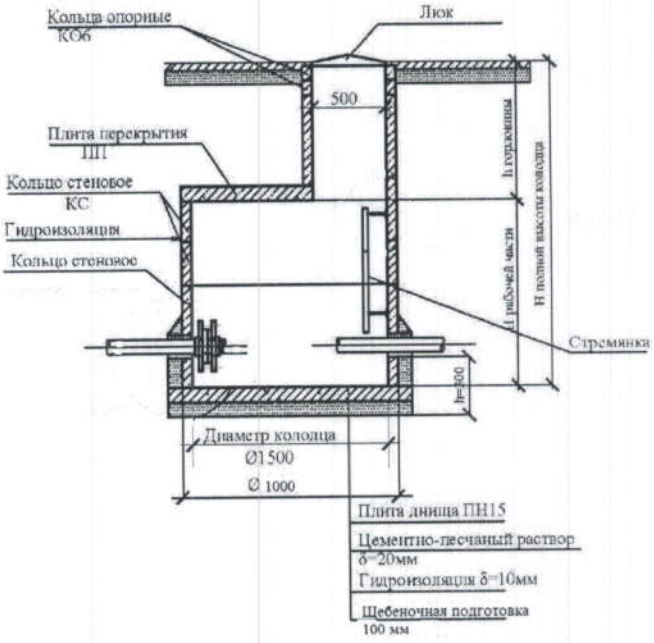

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба для водоснабжения	PE 100 SDR 17	полиэтиленовая	110x6,6	3240,08 м	
2	Труба для водоснабжения	PE 100 SDR 21	полиэтиленовая	110x5,3	7302,75 м	
3	Труба для водоснабжения	PE 100 SDR 21	полиэтиленовая	63x3	389,71 м	
4	Труба для водоснабжения	PE 100 SDR 17	полиэтиленовая	32x2,4	2638,83 м	
5	Плиты днищ для колодцев	ПН20	железобетонные	2000	2	
6	Плиты днищ для колодцев	ПН15	железобетонные	1500	124	
7	Плиты днищ для колодцев	ПН10	железобетонные			
8	Кольца стеновые для колодцев	КС20.6	железобетонные	2000	2	
9	Кольца стеновые для колодцев	КС20.9	железобетонные	2000	4	
10	Кольца стеновые для колодцев	КС15.6	железобетонные	1500	124	
11	Кольца стеновые для колодцев	КС15.9	железобетонные	1500	248	
12	Кольца стеновые для колодцев	КС10.9	железобетонные	1000	10	
13	Кольца стеновые для колодцев	КС10.6	железобетонные	1000	5	
14	Кольца стеновые для колодцев	КС7.3	железобетонные	700	131	
15	Плиты перекрытий для колодцев	1ПП20-1	железобетонные	2000	2	
16	Плиты перекрытий для колодцев	1ПП15-1	железобетонные	1500	124	
17	Плиты перекрытий для колодцев	ПП10-2	железобетонные	1000	5	
18	Кольца опорные для колодцев	КО6	железобетонные	840	393	
19	Люк	Тип Т	полимерно-композитный	700	131	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Акмагамбетов К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Асхадуллин Ф.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

"Аква-Рем"

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 13 » октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., Квартал 016, дом 4340**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Акмагамбетова Жаната Канатовича**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», руководитель Акмагамбетов Куралбай;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жана-Арка-2006»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Аква-Рем», 04-2014;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», приказом №44-4 от 13 июля 2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь	$м^2$	14 000	14 000	14 000	14 000
Водовод	м	3 132	3 132	3 208	3 208
Водопроводные сети	м	10 176	10 176	10 229,02	10 229,02
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня 160 м3	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения ВЛ-10кВ	м линии	4130	4130	4130	4130
Трасформаторная подстанция КТПН 10/0,4-25кВа	комплект	1	1	1	1
Объем подачи воды	$м^3$/год	89 122,05	89 122,05	89 122,05	89 122,05

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: для водоснабжения с.Акмешит выполнено: строительство водовода общей протяжённостью 3208 м (диаметром 110 мм) и водопроводных сетей общей протяжённостью 10 229,02 м (диаметром 110 мм – 7230,47 м, диаметром 63 мм – 385,85 м, диаметром 32 мм – 2612,7 м), бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин, насосная станция в количестве 1 шт, . Колодцы из сборных ж/б элементов - диаметром 2000 мм в количестве 2 шт, диаметром 1500 мм в количестве 124 шт, диаметром 1000 мм в количестве 5 шт, пожарные гидранты в количестве 33 шт, задвижки – диаметром 150 мм 1 шт, диаметром 100 мм 72 шт, диаметром 50 мм 88 шт, клапан обратный диаметром 100 мм 1 шт, клапан обратный диаметром 50 мм 2 шт, вентили диаметром 32 мм 62 шт, вантузы диаметром 50 мм 11 шт, счетчики холодной воды диаметром 50 мм 1 шт, счетчики холодной воды диаметром 32 мм 5 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 194 шт. Благоустройство территории насосной станций: ограждение металлическое с воротами (400 м). Благоустройство территории ВНБ: ограждение металлическое с воротами (200 м). Строительство линии электроснабжения – воздушная линия ВЛ-10кВ протяженностью 4130 м (опоры СВ-105-3,5 - 81 шт, СВ-164-12 – 2 шт), кабельная линия длиной 175 м, монтаж трансформаторных подстанций, разъединители РЛНД 1 шт, счетчики электроэнергии 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 г.** ;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5** ;
фактически, месяц: **5,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Каратал»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

наименование объекта (комплекса)

готовым к **приемке в эксплуатацию,** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Акмагамбетов Жанат Канатович **« 13 » октября 2020 г.**

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись , дата *М.П.*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 13 » октября 2020 г.

Технический надзор **ТОО "Актаустройэксперт", директор Имангалиев Азамат Казбекович, г. Нур-Султан, ул.Абая, 13, тел. 8(7172)249216**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта технического надзора Оспанова Ерканата Карбаевича, № аттестата эксперта №KZ55VJE00041014 от 14.09.2018 г., №KZ33VJE00039567 от 16.07.2018 г., №KZ61VJE00039257 от 29.06.2018 г.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 190052 от 06 августа 2019 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», руководитель Акмагамбетов Куралбай**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Компания НурайСтрой», №14019281 от 18.12.2014 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Акмагамбетова Жаната Канатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Жана-Арка-2006», №15010613 от 04.06.2015г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бекова Айдара Хамзеевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 г.** ;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5** ;

фактически, месяц: **5,5** ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **388 057,173** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **368 912,61008** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **5 518,239** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **349 114 ,70907** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **332 021,34907** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5 518,239** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Аква-Рем», 04-2014;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Отдел строительства Нуринского района», приказом №44-4 от 13 июля 2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и

соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО "Актаустройэксперт", директор Имангалиев Азамат Казбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Оспанов Ерканат Карбаевич, № аттестата эксперта №KZ55VJE00041014 от 14.09.2018 г., №KZ33VJE00039567 от 16.07.2018 г., №KZ61VJE00039257 от 29.06.2018 г.;.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«13» октября 2020г.

Авторский надзор ТОО «Аква-Рем»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лицеАсхадуллина Фаниля Файзулхановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании 190050 от 31.07.2019г
№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей в селеАкмешитНуринского района»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком объекта является ГУ «Отдел строительства Нуринского района», п. Нура, Нуринский район, Карагандинская область
И.о. руководителя Акмагамбетов Куралбай Казжанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания НурайСтрой» №14019281 от 18.12.2014г
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора АкмагамбетоваЖанатаКанатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Жана-Арка-2006»
№15010613 от 04.06.2015г
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Бекова Айдара Хамзеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 25.08.2019г;
месяц, год
окончание работ 01.10.2020г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5,5 месяц;
фактически5,5месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Аква-Рем», 04-2014
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) ТОО «Қазақстансараптауқауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)» № ҚСҚKAZ-0123/18 от 11.07.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «Аква-Рем» Мейзбекова Бота Мейрамовна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

"Аква-Рем" подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Асхадуллин Фаниль Файзулханович действующий на основании приказа №105а от 6 августа 2019
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

"Аква-Рем" подпись, дата М.П.
