Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Сноска. Форма с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 года № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"__21__" октября 2024 года.

Заказчик ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" в лице руководителя Дербіс Ж.Ж. БИН 060140005381,тел:87134321107, Актюбинская область, Иргизский район, с. Иргиз, Абилхайыр хана, 2.

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон– для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 18.10.2024 г, ТОО «Орхан Иншаат», г.Актобе, ул. Абилкайр хана 15,30, директор Сулейменов Акнысан Айнысанович БИН-060940009105, тел: 87054760000

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 18.10.2024 г, ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс" Директор Дуров А.А, эксперта Комекбаев Б.А. Аттестат №KZ41VJE00037192 от 23.04.2018г. №KZ68VJE00037191 от 23.04.2018г. №KZ14VJE00037193 от 23.04.2018 г, БИН 150340016452, тел: 87479655777.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 18.10.2024 года ТОО "Build Project" Директор Таран В. Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, Желтоксан,7 БИН 101240011332, тел 7021676680

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, юридический адрес, БИН, телефон.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком ТОО «ОрханИншаат», к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6**. Технически не сложный II (нормальный) уровень ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта по адресу: Актюбинская область Иргизский район, с.Иргиз, ул. Абулхаирхана,2.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает

проверив комплектность исполнительной технической документаций, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документаций " " года, дата ознакомления подтверждает, что

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от " " ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые

акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "28" марта 2024 года №253-058-015-423 ГКП на ПХВ «Иргизская районная больница»;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» 21.06.2024 г KZ 07REA00399025.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)организация ТОО "Build Project" РП42/10-2023-01-АС,02- ОВ,03- ВК,01-ЭО.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)) РП42/10-2023-01-АС,02- ОВ,03- ВК,01-ЭО. **ГКП на ПХВ «Иргизская районная больница» руководитель Ж.Ж. Дербіс, распоряжение № 85 от 06.12.2023 г.**

дата и номер проекта наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июня 2024 года;

месяц, год

окончание работ октября 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:3;

фактически, месяц:4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
строительный объем здания	м.куб	484,6		484,6	
этажность здания	эт	1		1	
площадь застройки	мкв	161,5		161,5	
площадь здания	м.кв	138,5		138,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Согласно ПСД.

- Полы: уплотнение грунта щебнем фракции 40-80 мм на площади 138,51 м.кв, устройство тепло-звукоизоляции засыпной из керамзита толщиной 70 мм на площади 138,51 м.кв и покрытие керамогранитом СТРК 1954-2010 с устройством цементной стяжки на площади 138,51 м.кв;

- Отделочные работы: устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с последующей штукатуркой сухими смесями поверхностей потолка, стен и откосов и окраской водоэмульсионной смесью на площади 310,87 м.кв, облицовка поверхностей плитками на площади 254,69 м.кв;

- Кровля: замена деревянных конструкций кровли (стропил, мауэрлат, обрешетки, стоек, прогон) с обработкой огнезащитными составами с покрытием профилированным листом с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТРК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм на площади 250 м.кв. Замена балок перекрытия в количестве 44 шт и утепление покрытия минеральной ватой марки СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100;

Фасад: облицовка фасада металлосайдингом без устройства теплоизоляционного слоя на площади 158,4 м.кв.

Внутреннее холодное водоснабжение: замена труб водоснабжения из труб PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм длиной 24 м, установка вентилей -13 шт, установка водомерных узлов 1 шт, установка счетчика ВСКМ Д 20 мм с фильтром 1 шт, установка задвижек -3шт;

Внутреннее горячее водоснабжение: замена труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм 6 м, замена труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм-10 м;

Внутренняя канализация: замена труб полиэтиленовых для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм-4 м, замена труб полиэтиленовых для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами

110х4,2 мм-24 м, установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным-1компл, Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды-8 компл;
Внутреннее отопление: замена труб полиэтиленовых повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20х1,9; PN 10-6 м, замена труб полиэтиленовых повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 32х2,9; PN 10-102 м, установка радиатор отопления биметаллических ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт -74 секций, замена вентилей и клапанов на трубопроводах, диаметр до 25 мм-32 шт, установка котла газового настенного модели Protherm с тепловой мощностью 18 кВ- 1 комплект;
Внутреннее электричество: замена щитка распределительного встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41- 1 компл, Замена светильников с лампами светодиодными, местного освещения-28 шт, замена выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке-42 шт, прокладка кабеля силового не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 -216 м, замена кабеля силового не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66-222 м;
Благоустройство: устройство брусчатки толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 на площади 44 м.кв с устройством основания, установка камней бортовых тротуарных ГОСТ 6665-91 длиной 49,2 м, монтаж ограждения их профильных труб секции 3,0мх2,0 м – 61 шт, секция 2,5м х2,0 м – 1 шт, калитка 1,5 м х2,0 м – 1 шт;
Заполнение проемов: установка оконных блоков из ПХВ профиля толщиной 60 мм двухстворчатых однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30674-99-23,1 с подоконниками с ПВХ м.кв, установка стальных противопожарных дверных блоков -4,2 м.кв, установка внутренних дверных блоков с декоративной облицовкой СТ РК 943,92 -18,9 м.кв;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 61 208,404 тенге с ндс , в том числе строительно-монтажных работ 57 615,127 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 286,557 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 58101,97113тысяч тенге с ндс , в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 56 462,82481 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 286,557 тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания __С ;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6.** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГКП «Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области» в лице руководителя Дербіс Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)Аккредитованная организация ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс" Директор Дуров А.А.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс" Комекбаев Б.А. Аттестат эксперта №KZ41VJE00037192 от 23.04.2018г, №KZ68VJE00037191 от 23.04.2018, №KZ14VJE00037193 от 23.04.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1)Разработчик проекта ТОО «Build Project» Директор Таран В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Орхан Иншаат», Директор Сулейменов А. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6.	1		14	161,5	484,6	138,5		138,5		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ленточный монолитный	силикатный кирпич	Профилированный лист	автономное	отВЛ	центральное	водонагреватель	уличный туалет	отГРПШ

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			90,4					
			48,1					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____приложено 1 листе_____
2. Экспликация к поэтажным планам _приложено 1 листе _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2098 (0,2098 га)	161,5	161,5				

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1				138,5			138,5

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		ленточно-монолитный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		силикатный кирпич
	2) перегородки		силикатный кирпич
3	Перекрытия	чердачное	чердачное
		междуэтажное	
4	Крыша		профилированный лист
5	Полы	1-го этажа	керамогранит
		последующих этажей	
6	Проемы	окна	пластиковые
		двери	деревянные

7	Отделочные работы	внутренние		сухими смесями
		наружные		металлосайдинг
8	Горячее водоснабжение			водонагреватель
9	Водопровод			центральная
10	Канализация			уличный туалет
11	Электроосвещение			от ВЛ
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	автономное
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	

Разные работы	
Итого:	

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик _____ Дербіс Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____ Таран В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них		44	
	асфальтовое покрытие	м2		
	щебеночное покрытие	м2		
	Плитами тротуарными	м2	44	
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт		
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		
14	цветники			
15	газоны	м2		
16	порода деревьев			
17	возраст	год		

Заказчик _____ Дербіс Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Таран В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

План 1 этажа

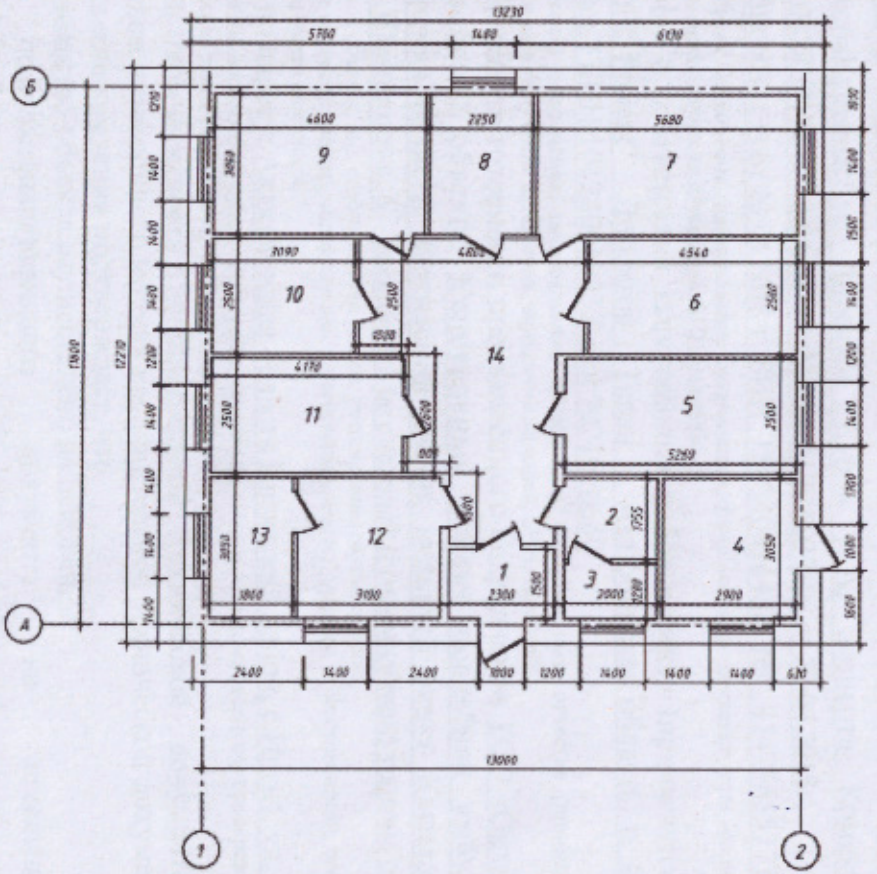

Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Примечание
1	Коридор	3,5	
2	Санузел	3,5	
3	Комната уборочного инвентаря	2,4	
4	Топочная	8,8	
5	Кабинет	13,2	
6	Комната	11,4	
7	Кабинет	17,3	
8	Кабинет	6,9	
9	Комната	14,0	
10	Комната	7,7	
11	Кабинет	10,4	
12	Кабинет	9,5	
13	Коридор	5,5	
14	Коридор	24,4	
	Итого:	138,5	

Ведомость демонтажных работ

№ п/п	Наименование видов работ	ед.изм.	Количество
1	Демонтаж наружного дверного блока металлического 2,1х0,9 м	шт	2
2	Демонтаж внутренних дверных блоков 2,1х0,9; 2,1х0,7	шт	12
3	Демонтаж оконных блоков 1,4х1,5 м	шт	11
4	Демонтаж полов	м²	139,0
5	Демонтаж отмостки	м²	55,0
6	Демонтаж облегченного перекрытия	м²	161,5
7	Демонтаж кровли	м²	161,5

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	42/10-2023-01-АС			
						"Капитальный ремонт здания Кызылжарской врачебной амбулатории", расположенной по адресу Актюбинская область Иргизский район, сельский округ Кызылжар, селе Курлык улица А.Шокпарова, 6.			
ГИП		Таран В.В.				Врачебная амбулатория	Стадия	Лист	Листов
Н.контроль		Саимова					РП	2и	11
