ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№2
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 01/6315 «23» 11 2023 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

№149-14 "22" 11 2023 года

Заказчик ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, БИН-060140014281, 872422271673, 120000, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. К. Казантаева 43***

*фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «22» 11 2023 г. ТОО «Алтын Айдарлы», директор Егізбайулы Е. Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Левый берег, дом 3, офис 21А, БИН 060840008183, 8/747/240/10/10.***

*дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «22» 11 2023г.***

***ТОО "АҚБОЗАТ LTD", Муратбеков П.М., Аттестат: KZ44VJE00045092 от 07.03.2019г, KZ71VJE00045091 от 07.03.2019г;; БИН- 050140013499 ,тел-8776-888-41-43***

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от «22» 11 2023 г. ТОО «ПроектСервис», эксперта Асанханов А., приказа №9-П от 10.04.2023. БИН-971140000650, 87017194506.***

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

***"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г. Кызылорда. Наружные сети телефонизации"***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

***Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, урочище Жанадария 126***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: ***от 27.05.2022г. №24***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

*наименование органа вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

***КГУ "Управление по контролю Кызылординской области" от 14.07.2023г. KZ36REA00341564***

*наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона*

3) проекта (проектно-сметной документации)

***ТОО «Проект Сервис», рабочий проект №05-22-1/1-СС***

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденного(й) ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда», № 1119-НК от 27.10.2022 года.***

*дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

***начало работ «_____» июль, 2023 года;***

***окончание работ «_____» ноябрь, 2023 года;***

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5;***

фактически, месяц: ***4;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| Сети телефонизации | | | | | |
| Волоконно-оптический кабель ВОЛС типа ОКЛ-24 | м | 22500 | | 13800 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муфта оптическая МО FOSC-TV | шт | 12 | | 5 | |
| Колодец ж/б ККС-2 | шт | 15 | | 30 | |
| Колодец ж/б ККС-3 | шт | 2 | | 2 | |
| Оптическая полка RP144-02 | шт | 48 | | 48 | |
| Адаптер FC.SM simplex TWT-2LC/S-AM-SM | шт | 48 | | 48 | |
| Пигтейл многодомовой. TWT-PIG-SC/M5/1.5 | шт | 48 | | 48 | |
| Патчкорды TWT-LC-SC/5.0-S | шт | 48 | | 48 | |
| Труба полиэтиленовая д.110 | м | 13065 | | 7072 | |
| Труба полиэтиленовая д.40 | м | 5300 | | 6469 | |
| Труба стальная д.102х6мм | м | 385 | | 325 | |
| Труба стальная д.219мм | м | 1280 | | 674 | |
| Столбик кабельный с табличкой СКТ-1,6 размеры. Высота -1,6 м, диаметр 83 мм, табличка размером 300х400 мм, | шт | 55 | | 55 | |
| Ж/б столбик замерный | шт | 55 | | 55 | |
| Кабель оптоволоконный емк.8 ОКБ | м | 1500 | | 1500 | |
| Кабель оптоволоконный емк.4 ОКнГ | м | 450 | | 450 | |
| Телекоммуникационный шкаф 42 U.19" | шт | 1 | | 1 | |
| Оптический кросс с разъемами FC/24 | шт | 1 | | 1 | |
| Абонентская оптическая розетка с двумя дуплексными разъемами 4 порта LC | шт | 1 | | 2 | |
| Оптические пачкорды одномодовые FC-FC | шт | 8 | | 8 | |
| Оптические пачкорды одномодовые LC-LC | шт | 4 | | 4 | |
| Оптические пачкорды одномодовые FC/LC-1 | шт | 8 | | 8 | |
| Оптические пачкорды одномодовые FC/UPS-SC/UPS-1 | шт | 4 | | 4 | |
| Абонентский VOIP-шлюз TAU-32M.IP Eltex FXO | компл | 2 | | 2 | |
| Абонентский VoIP-шлюз TAU-32M.IP Eltex FXS | компл | 2 | | 2 | |
| SFP оптические модули на 40 км, 10G 1310 mm для одномодовых волокон | шт | 8 | | | |
| Оптический модем RAD OP - 108 /B/ETH/SC/13L(C) | шт | 4 | | | |
| Оптическая муфта разветвительная на 24/8 | шт | 1 | | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FOSC400 S8 | | | | | |
| Субмодуль абонентских комплектов TAU32M-M8O | шт | | | 2 | |
| Субмодуль абонентских комплектов TAU32M-M8S | шт | | | 2 | |
| Модуль питания, модель: PM160-220/12 | шт | | | 4 | |
| Фотодиод приемопередающий лазерный FH-SPB231TCDL40 | шт | | | 4 | |
| Фотодиод приемопередающий лазерный FH-SPB321TCDL40 | шт | | | 4 | |
| Промышленный медиконвертер Planet GT-1205A | шт | | | 8 | |
| Кабель от АТС до кросса – 2 м (18x2) | шт | | | 4 | |

*4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:* ***Сети телефонизации:*** *Кабели - Волоконно-оптический ВОЛС типа ОКЛ-24. Муфта оптическая- МО FOSC-TV. Колодец ж/б ККС-2 и ККС-3. Оптическая полка- RP144-02. Адаптер-FC.SM simplex TWT-2LC/S-AM-SM. Пигтейл многодомовой-TWT-PIG-SC/M5/1.5. Патчкорды-TWT-LC-SC/5.0-S. Кабельная канализация - труба полиэтиленовая д.110мм и труба полиэтиленовая д.40мм. Кабельная канализация по мосту - труба стальная д.102х6мм. Футляр в местах ГНБ - труба стальная д.219мм. Столбик кабельный с табличкой – стойка из стальных труб д40мм, табличка размером 300х400м. Ж/б столбик замерный – 120х120х1200*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 229 495,512 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 194 672,921 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 197,705 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 182 526,199 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 194 672,921 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 197,705 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации",***

*наименование объекта (комплекса)*

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель - Әнуар А.С.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Муратбеков П.М.***

Технический надзор по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций и в части инженерных сетей

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)*

*Место печати (при наличии)*

2) аккредитованная организация ***ТОО "АҚБОЗАТ LTD", Жумиров Б.С.***

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество) (при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***ТОО «ПроектСервис», Асанханов Г.К.***

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

2) организация ***ТОО «ПроектСервис», директор – Амруллин М.Х.***

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик)

***ТОО «Алтын Айдарлы», директор - Егізбайұлы Е.***

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя*

*Место печати (при наличии)*

Приложение 16 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (линии связи)**

"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г. Кызылорда. Наружные сети телефонизации"

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные линии связи, в том числе: | км | |
| | 1) марка | км | |
| | 2) марка | км | |
| | 3) марка | км | |
| 2 | Кабельные линии связи, в том числе: | км | 15,75 |
| | 1) Кабель волоконно-оптический «ОКЛ-24» | км | 13,8 |
| | 2) Кабель волоконно-оптический «ОКБ-Т-А8-8,0» | км | 1,5 |
| | 3) Кабель волоконно-оптический «ОКнг(А)-HF-м4п-а4-1.0» | км | 0,45 |
| 3 | Опоры, в том числе: | шт | |
| | 1) металлические | шт | |
| | 2) деревянные | шт | |
| | 3) анкерные | шт | |
| | 4) железобетонные | шт | |
| | 5) тросовые подвесы | шт | |
| 4 | Колодцы сетевые, в том числе: | шт | 32 |
| | 1) ККС 1 | шт | |
| | 2) ККС 2 | шт | 30 |
| | 3) ККС 3 | шт | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 4) ККС 4 | шт | |
| | 5) ККС 5 | шт | |
| 5 | Муфты соединительные | шт | 5 |
| 6 | Коллекторы коммуникационные, в том числе: | | |
| | 1) керамические | км | |
| | 2) бетонные | км | |
| | 3) асбесто-цементные | км | |
| | 4) пластмассовые | км | |
| 7 | НУП (необслуживаемые усилительные пункты) | шт | |
| 8 | Прочие устройства | | |

| Горизонтальный разрез колодца | Вертикальный разрез колодца |
|---|---|
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |
| 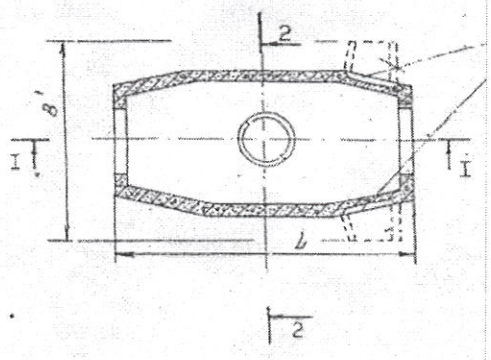 | 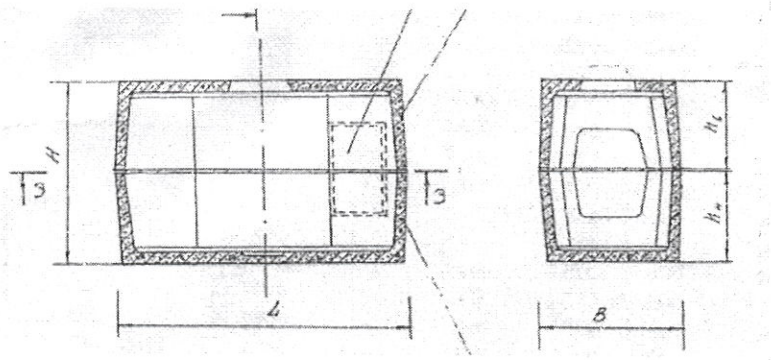 |

## Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колодец кабельный | ККС-2 | Ж/Б | 1350x1030 | 30 | |
| 2 | Колодец кабельный | ККС-3 | Ж/Б | 1950x1160 | 2 | |
| | | | | | | |

| Горизонтальный разрез НУП | Вертикальный разрез НУП |
|---|---|
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |

## Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Единицы измерения | Материал | Количество (размеры) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Заказчик: ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда***
***Руководитель – Әнуар А.С.***

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя*
*Место печати (при наличии)*

Авторский надзор: ***ТОО «ПроектСервис»***
***Асанханов Г.К.***
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта*
*Место печати (при наличии)*

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

"22" 11 2023 года

Авторский надзор ***ТОО «ПРОЕКТ СЕРВИС» Директор Амруллин Марат Харисович Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. А. Байтурсынова №48***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ***эксперта Асанханов Г.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании ***приказа №9-П от 10.04.2023***
№ договора и дата
по объекту ***"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Наружные сети телефонизации"***
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, Руководитель – Әнуар А.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Алтын Айдарлы», №19022557 от 15.11.2019 г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***директора Егізбайұлы Е.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями ***ТОО «Фирма» МТО-Центр», ГСЛ №16003106 от 17.02.2016г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в *лице* ***директора Жалгасбаева Н.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль, 2023 года;***
месяц, год
окончание работ ***ноябрь, 2023 года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяц;
фактически **4** месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
***ТОО «Проект Сервис», рабочий проект №05-22-1/1-СС***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) заказчиком ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда», № 1119-НК от 27.10.2022 года.***

Авторский надзор:
***ТОО «ПРОЕКТ СЕРВИС», директор – Амруллин М.Х.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору
***Асанханов Г.К., приказа №9-П от 10.04.2023***
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

"22" 11 2023 года

Технический надзор ***ТОО "АҚБОЗАТ LTD", директор-Жумиров Б.С. Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон Саяхат, улица Саяхат-35, дом 34***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта ***Муратбеков П.М., Аттестат: KZ44VJE00045092 от 07.03.2019г., KZ71VJE00045091 от 07.03.2019г;***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора ***№57/1 от 14.07.2023года***
№ договора и дата
по объекту: ***"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г. Кызылорда. Наружные сети телефонизации"***
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, Руководитель – Әнуар А.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Алтын Айдарлы», №19022557 от 15.11.2019 г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***директора Егізбайұлы Е.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями ***ТОО «Фирма» МТО-Центр», ГСЛ №16003106 от 17.02.2016г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в *лице* ***директора Жалгасбаева Н.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль, 2023 года;***
месяц, год
окончание работ ***ноябрь, 2023года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяц;
фактически 4 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 229 495,512 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 194 672,921 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 197,705 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 182 526,199 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 194 672,921 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 197,705 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
***ТОО «Проект Сервис», рабочий проект №05-22-1/1-СС***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) заказчиком ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда», № 1119-НК от 27.10.2022 года.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
***ТОО "АҚБОЗАТ LTD", директор-Жумиров Б.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
***Муратбеков П.М., Аттестат: KZ44VJE00045092 от 07.03.2019г., KZ71VJE00045091 от 07.03.2019г;***
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)
