Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за июль 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	3	765 396,00	82 006,71
2	Отопление и вентиляция	4	577 815,00	61 908,75
3	Внутренние сети водопровода и канализации	5	1 099 939,00	117 850,61
4	Электроосвещение	6	372 779,00	39 940,61
5	Углярка	7	359 797,00	38 549,68
6	Уборная на 1 очко. №1	8	131 546,00	14 094,21
7	Уборная на 1 очко. №2	9	131 546,00	14 094,21
8	Наружные сети электроснабжения	10	630 283,00	67 530,32
9	Телефонизация	11	1 208 115,00	129 440,89
10	Наружные сети водопровода	12	304 876,00	32 665,29
11	Наружные сети канализации	13	571 295,00	61 210,18
12	Вертикальная планировка	14	74 266,00	7 957,07
13	Ограждение	15	1 662 347,00	178 108,61
ВСЕГО:			7 890 000,00	845 357,14

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

м.п

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.Р

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	21 192 466,00
Лимит финансирования на 2018 г.	20 938 155,84
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	17 952 000,00
б) за отчетный месяц	7 890 000,00

СПРАВКА ФЗ
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 года

По Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июль месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	10 062 000,00	7 890 000,00	7 044 642,86	845 357,14	17 952 000,00	16 028 571,43	1 923 428,57

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т.

"SANA 2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Калыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п и п/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
40	Е8-41-1	Кладка дымохода								
		м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
				1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
41	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий								
43	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	-
		м2 стен (за вычетом проемов)	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	-
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	-
70	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	11,04	4539,36		50115				
		м3								
71	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим.	49,49	208,17	4,51	10302	223	8454	1,04	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности								
	72-1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;		167,4	1,71	8285	85	101	0,0084	–
			115,92	169		19590				
		м2								
	Раздел 5 Окна									
	92 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),								
			18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
		м2 проемов								
				171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1
	93 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)								
			1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
		м2 проемов								
				230,97	6,18	249	7	120	0,0302	–
	98 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м								
			18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
		м2 проемов								
				94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	–
	Раздел 6 Двери									
	107 3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	9090		27270				
		шт								
	108 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
		комплект								
	109 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
	Раздел 7 Полы									
	7.2 П-2									
	121 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,5	201,7	9,95	15833	781	5402	0,356	28
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1
	122 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
		м2 стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,63	0,25	99	39	123	0,0012	–
	7.4 П-4									
139	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	27	3	123	0,0048	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
141	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	–
143	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	109,56	37		4054				
		кг								
	Раздел 9 Фасад									
	9.1 Стены									
150	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	116,732	216,7	1,96	25296	229	13403	0,611	71
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	12712	53	105	0,0262	3
		Всего прямые затраты				**195944**	**2273**			**219**
						36626	**811**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				157049				
		Накладные расходы, тенге				40892				
		- заработная плата, тенге				6134				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14210				
		Всего				**251046**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2762				
		- сметная заработная плата, тенге				389				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				4660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	- сметная заработная плата, тенге	2144
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2538
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1015
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**262021**
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**669990**
	- материалы, тенге	401574
	- сметная заработная плата, тенге	126973
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	260
	Налог (2 %)	13400
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**683390**
	НДС (12 %)	82007
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**765 396**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) *котел*	1	5265,48 4264,2	347,53 129,78	5265 4264	348 130	5624 128	22,763 0,6386	23 1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт *шт*	1	13600		13600				
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 *бак*	1	4578,67 639,63	70,66 25,49	4579 640	71 25	851 128	3,7389 0,1339	4 –
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	12,64	4331,43	35,77	54749	452	2024	0,70246	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВт								
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	111,7 367	13,4	1412 367	169	128	0,06541	1
		шт								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1
		м трубопровода		53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	41	266,17	4,08	10913	167	2903	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	34	424,17	4,08	14422	139	2406	0,30591	10
		м трубопровода		53,77	1,53	1828	52	128	0,00752	–
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
		м трубопровода		67,44	3,06	270	12	128	0,01494	–
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	111	11,31	–	1255	–	1564	0,0516	6
		м трубопровода		11,01	–	1222	–	128	–	–
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	32	148,39	0,07	4748	2	3630	0,646	21
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью		108	0,02	3456	1	105	0,0001	–
		м2	2	62,4	0,05	125	–	5	0,0138	–
14	Е26-1-1			2,77	0,02	6	–	90	0,0001	–
		Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
15	Е26-1-7			103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
		Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
		м трубопровода	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
16	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм		135,68	2,03	543	8	100	0,01	–
		м3	0,1	17600		1760				
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
18	1-1-939			29,93	2,48	239	20	100	0,012	–
		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)								
		1000м2	0,0031	185900		576				
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15								
		м2	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
20	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
			0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	85	17	100	0,092	
21	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
		м3								
22	Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
		м2 покрытия								
				151,65	9,9	227	15	100	0,048	
23	1-1-939									
		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
		1000м2								
24	Е26-1-19									
		Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	
		м трубопровода								
				198	2,03	40	–	100	0,01	
25	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
		м3								
26	Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,1433	3
		м трубопровода								
				194,21	10,66	544	30	128	0,05202	
27	8-6-90									
		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,8	1055		2954				
		м								
28	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
		м трубопровода								
				67,44	3,06	202	9	128	0,01494	
29	8-10-45									
		Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	200		500				
		кг								

Раздел 2 Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,617	10
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1614	32	128	0,02531	–
31	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
32	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
33	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
		м2								
34	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,045	3950		178				
		м2								
35	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,378	1
		зонт		63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–
36	Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
		м трубопровода		75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37	Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
		м трубопровода		86,85	6,53	165	12	100	0,032	–
38	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
		м3								
39	Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия								
				151,65	9,9	637	42	100	0,048	
40	1-1-967									
		Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
		м2								
		Всего прямые затраты				**151629**	**1969**			**130**
						22726	**739**			2
		В том числе стоимость: материалов, тенге				113335				
		оборудования, тенге				13600				
		Накладные расходы, тенге				28472				
		- заработная плата, тенге				4271				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9990				
		Всего				**190091**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1941				
		- сметная заработная плата, тенге				274				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3276				
		- сметная заработная плата, тенге				1507				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1784				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				714				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**197806**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**505790**				
		- материалы, тенге				289798				
		- оборудование, тенге				34775				
		- сметная заработная плата, тенге				81862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	- нормативная трудоемкость, чел-ч	157
	Налог (2 %)	10116
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**515906**
	НДС (12 %)	61909
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**577 815**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области" (подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" (подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау" (подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №5
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
	1.1 Водоснабжение									
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	15	329,67 59,85	4,19 1,58	4945 898	63 24	1180 128	0,337 0,0076	5 –
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	5	364,67 59,85	4,19 1,58	1823 299	21 8	393 128	0,337 0,0076	2 –
3	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	7	401		2807				
4	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
		кран								
				54	–	54	–	128	–	–
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401				
		шт								
7	Е16-29-1									
		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	20	10,99	–	220	–	274	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	214	–	128	–	–
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,3	148,39	0,07	193	–	147	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	140	–	105	0,0001	–
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
10	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1690,04		1690				
		шт								
	1.2 Горячее водоснабжение									
11	Е16-7-1									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
		м трубопровода								
				59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
12	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	367		1835				
		шт								
13	Е16-29-1									
		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	107	–	128	–	–
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
15	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	108 1467,32	0,02 97,07	65 2935	– 194	105 3601	0,0001 7,87	– 16
		комплект								
16	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	1	1370,25 6774,12	36	2741 6774	72	128	0,18	–
		шт								
17	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	1	9218,39		9218				
		шт								
	1.3 Канализация									
18	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
		м трубопровода								
19	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11	106,2 748,88	0,25 1,43	425 8238	1 16	128 1449	0,0012 0,56	– 6
		м трубопровода								
20	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	8	102,38 1218,62	0,54 10,58	1126 9749	6 85	128 1516	0,0026 0,77	– 6
		м трубопровода								
21	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	2,72	144 22,29	3,96 –	1152 61	32 –	128 54	0,0194 0,11	– –
		м2 окрашиваемой поверхности								
22	99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	18,68 233,95	–	51 234	–	105	–	–
		шт								
23	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	1	46,44		46				
		шт								
24	30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820				
		м3								
25	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23 38,59	16,85 4,33	114 77	34 9	86 100	0,211 0,025	– –
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
		м								
27	E26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная	8	72,96	16,85	584	135	344	0,211	2
		м трубопровода								
				38,59	4,33	309	35	100	0,025	–
28	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	2,72	3700		10064				
		м2								
	1.4 Санитарно-технические приборы									
29	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
30	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект								
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
31	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
32	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
33	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								
	1.5 Противопросадочные мероприятия									
34	E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,32	1722,2	97,07	551	31	57	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	36	12	118	0,18	–
35	E7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	0,463	1986,57	564,43	920	261	496	3,33	2
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	263	91	140	0,7533	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2	0,463	17200		7964				
		м3								
37	30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	0,2	18200		3640				
		м3								
38	Е7-57-15	Деформационный шов	0,9	55,34	0,07	50	–	67	0,298	–
		м шва								
				53,1	0,02	48	–	140	0,0001	–
39	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,2	665,48	8,23	4126	51	620	0,468	3
		м2 поверхности								
				81,68	3,08	506	19	118	0,0151	–
40	2-1-262	Опоры скользящие	0,0022	107900		237				
		т								
41	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах	0,68	33843,2	2104,76	23013	1431	2640	13,9	9
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	1607	424	130	2,475	2
42	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
43	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,01385	133700		1852				
		т								
44	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02772	64092,87	304,24	1777	8	100	20	1
		т								
				3330	114,75	92	3	105	0,56	–
45	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	7940,17	66,01	4367	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

Раздел 2 Опорный пункт

2.1 Водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
47	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром		67,5	–	68	–	128	–	–
			1	1690,04		1690				
		шт								
48	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
		м трубопровода								
49	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
			5	127		635				
		м								
50	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,005	28631,24	8426,72	143	42	104	69,9	–
		км трубопровода								
51	Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм		12712,5	3183,75	64	16	130	15,55	–
			1	839,36	70,85	839	71	484	1,98	2
		м трубопровода								
52	8-6-106			351	26,53	351	27	128	0,1296	–
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2999		2999				
		м								
53	Е22-17-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм	0,001	68118,49	10815,1	68	11	26	89,2	–
		км трубопровода								
54	30-14-3	Упор бетонный		16155	4086	16	4	130	19,95	–
			0,02	18200		364				
		м3								
55	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,337	–
		м трубопровода								
56	Е16-7-2			59,85	1,58	60	2	128	0,0076	–
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				59,85	1,58	299	8	128	0,0076	
57	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
		шт								
58	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	11	10,99	–	121	–	151	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	118	–	128	–	
59	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,46	148,39	0,07	68	–	53	0,646	
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	50	–	105	0,0001	
		2.2 Канализация								
60	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	5
		м трубопровода								
				106,2	0,25	850	2	128	0,0012	
61	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	8	781,79	7,07	6254	57	1363	0,7	6
		м трубопровода								
				130,5	2,66	1044	21	128	0,0129	
62	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,44	22,29	–	32	–	28	0,11	
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18,68	–	27	–	105	–	
63	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	46,44		93				
		шт								
64	Е26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная	8	72,96	16,85	584	135	344	0,211	2
		м трубопровода								
				38,59	4,33	309	35	100	0,025	
65	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	1,44	3700		5328				
		м2								
		2.3 Санитарно-технические приборы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
		2.4 Противопросадочные мероприятия								
67	E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,64	1722,2	97,07	1102	62	112	0,78	–
		м3 основания		112,5	36	72	23	118	0,18	–
68	E7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	1,326	1986,57	564,43	2634	748	1415	3,33	4
		м3 сборных конструкций		567	195,49	752	259	140	0,7533	1
69	30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2	0,926	17200		15927				
		м3								
70	30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	0,4	18200		7280				
		м3								
71	E7-57-15	Деформационный шов	1,8	55,34	0,07	100	–	134	0,298	1
		м шва		53,1	0,02	96	–	140	0,0001	–
72	E8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	12,3	665,48	8,23	8185	101	1231	0,468	6
		м2 поверхности		81,68	3,08	1005	38	118	0,0151	–
73	2-1-262	Опоры скользящие	0,00178	107900		192				
		т								
74	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах	1,49	33843,2	2104,76	50426	3136	5784	13,9	21
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3520	929	130	2,475	4
75	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,03093	133700		4135				
		m								
77	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05544	64092,87	304,24	3553	17	201	20	1
		m								
				3330	114,75	185	6	105	0,56	--
78	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	7940,17	66,01	8734	73	254	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	215	27	105	0,1218	--
		Всего прямые затраты				**310774**	**7162**			**126**
						22279	**2264**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				265352				
		оборудования, тенге				15992				
		Накладные расходы, тенге				31117				
		- заработная плата, тенге				4668				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19554				
		Всего				**361445**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3800				
		- сметная заработная плата, тенге				536				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				6412				
		- сметная заработная плата, тенге				2950				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3493				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1397				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**376547**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**962831**				
		- материалы, тенге				678505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- оборудование, тенге				40892				
		- сметная заработная плата, тенге				96110				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				170				
		Налог (2 %)				19257				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**982088**				
		НДС (12 %)				117851				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 099 939**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	1	2514,11		2514				
		шт								
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
		шт								
6	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим.	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				101	–	303	–	95	–	–
7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				
		шт								
9	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим.	1	1020		1020				
		шт								
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	–	521	–	477	0,188	3
		шт								
				29,48	–	442	–	108	–	–
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195		1560				
		шт								
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254	7	237		1659				
		шт								
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	–	75	–	58	0,337	–
		шт								
				53,55	–	54	–	108	–	–
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт								
				29,48	–	118	–	108	–	–
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт								
				27	–	81	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	
		шт		31,05	–	93	–	108	–	
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	
		комплект		45,68	–	46	–	108	–	
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
23	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
		1000шт								
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653				
		шт								
25	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	
26	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	17,46		175				
		м								
27	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
28	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	2	365		730				
		шт								
29	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	2	209		418				
		шт								
30	17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	1	158		158				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	5	101,26		506				
		шт								
32	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
		шт								
				47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
33	18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
		шт								
34	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
		м провода								
				24,75	–	6683	–	108	–	–
35	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	32123		3534				
		1000м								
36	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	50586		8094				
		1000м								
37	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
		км								
38	18-1-7	Коробка клемная на 3-4 контакта на 25 А прим.	5	112		560				
		шт								
39	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	14	51,7	2,8	724	39	370	0,16	2
		м								
				27,5	0,3	385	4	95	0,002	–
40	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт								
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
41	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
		м								
				23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
	Раздел 2 Опорный пункт									
42	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	18-3-154	Щиток осветительный прим.		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
			1	5310		5310				
		шт								
44	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный								
			1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт								
45	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711		54	2,3	54	2	95	0,013	–
			1	2514,11		2514				
		шт								
46	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.								
			1	300		300				
		шт								
47	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А								
			1	1430		1430				
		шт								
48	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.								
			1	1160		1160				
		шт								
49	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
			5	34,7	–	174	–	159	0,188	1
		шт								
				29,48	–	147	–	108	–	–
50	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220								
			5	195		975				
		шт								
51	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт								
				29,48	–	118	–	108	–	–
52	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
			1	36,26	–	36	–	29	0,171	–
		шт								
				27	–	27	–	108	–	–
53	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
		шт								
54	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,009	28100		253				
		1000шт								
56	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
		шт								
57	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
58	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	17,46		175				
		м								
59	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1
60	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
		шт								
61	17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
		шт								
62	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
		шт								
63	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
		шт								
64	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
65	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	1	365		365				
		шт								
66	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	1	209		209				
		шт								
67	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	2	101,26		203				
		шт								
68	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,152	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м провода								
				24,75	–	3465	–	108	–	–
69	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	32123		2891				
		1000м								
70	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	50586		2529				
		1000м								
71	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
		км								
72	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
		м								
				23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
		Всего прямые затраты				**98382**	**1226**			94
						15382	**543**			2
		В том числе стоимость: материалов, тенге				81774				
		Накладные расходы, тенге				16967				
		- заработная плата, тенге				2545				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6921				
		Всего				**122270**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1345				
		- сметная заработная плата, тенге				190				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2270				
		- сметная заработная плата, тенге				1044				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1236				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**127615**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**326312**
- материалы, тенге	209096
- сметная заработная плата, тенге	54807
- нормативная трудоемкость, чел-ч	111
Налог (2 %)	6526
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**332838**
НДС (12 %)	39941
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**372 779**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №7

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 3-1-2)

Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Раздел без наименования									
	1.1 Земляные работы									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
		м3 грунта								
				218,93	–	1708	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
		м3 грунта								
				134,1	–	838	–	113	–	–
	1.2 Фундаменты									
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9005,89	311,32	14590	504	950	2,82	5
		м3								
				441	117,61	714	191	105	0,5744	1
	1.3 Стены									
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки								
				594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11301	316,01	4181	117	578	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	506	44	105	0,583	–
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525				
		т								
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268				
		т								
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279				
		т								
	1.4 Проемы									
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
		м2 проемов								
				272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	0,2	6860		1372				
		м2								
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14	1-1-797	Скобяные изделия окон	1	360		360				
		комплект								
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	400,18	102,53	532	136	299	0,899	1
		м2 проемов								
				151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	1,33	4250		5653				
		м2								
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1)	0,01	13600		136				
		м3								
	1.5 Полы									
19	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
20	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм)	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
21	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000;	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
		м2 покрытия								
				1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–
	1.6 Кровля									
22	Е10-14-1	Установка стропил	0,22	23741,72	334,28	5223	74	930	22,1	5
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	747	28	120	0,62	–
23	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	578,74	8,2	7292	103	1061	0,424	5
		м2 кровли								
				67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	27	2	120	0,052	–
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	59	4	120	0,00168	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
27	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
		т								
	1.7 Наружная и внутренняя отделка									
28	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–
30	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
31	E15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
		м2 фасада		6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–
		Всего прямые затраты				**92040**	**3457**			**98**
						15966	**1270**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				72613				
		Накладные расходы, тенге				19292				
		- заработная плата, тенге				2894				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6680				
		Всего				**118012**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1298				
		- сметная заработная плата, тенге				183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2191
- сметная заработная плата, тенге	1008
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1193
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	477
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**123171**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**314948**
- материалы, тенге	185671
- сметная заработная плата, тенге	58788
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Налог (2 %)	6299
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**321247**
НДС (12 %)	38550
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**359 797**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №8

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко. №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	5,6	294,75	–	1651	–	1866	1,89	11
		м3 грунта		294,75	–	1651	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	402	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9304,72	86,6	7248	67	427	3,06	2
		м3		490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6
		м2 проемов		792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
		м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
		м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**33255**	**268**			**41**
						6472	**101**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26514				
		Накладные расходы, тенге				7450				
		- заработная плата, тенге				1118				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2442				
		Всего				**43147**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения (1,1 %)	475
- сметная заработная плата, тенге	67
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	801
- сметная заработная плата, тенге	368
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	436
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	174
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**45033**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**115149**
- материалы, тенге	67796
- сметная заработная плата, тенге	22338
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Налог (2 %)	2303
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**117452**
НДС (12 %)	14094
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**131 546**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №9

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко. №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	5,6	294,75 294,75	– –	1651 1651	– –	1866 113	1,89 –	11 –
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3	134,1 134,1	– –	402 402	– –	454 113	0,972 –	3 –
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы *м3*	0,779	9304,72 490,5	86,6 32,72	7248 382	67 25	427 105	3,06 0,1598	2 –
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02243	41200		924				
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,202	22951,16 3487,5	316,57 119,25	4636 704	64 24	874 120	22,5 0,58	5 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6
		м2 проемов		792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
		м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
		м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**33255**	**268**			**41**
						6472	**101**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26514				
		Накладные расходы, тенге				7450				
		- заработная плата, тенге				1118				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2442				
		Всего				**43147**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Временные здания и сооружения (1,1 %)	475
	- сметная заработная плата, тенге	67
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	801
	- сметная заработная плата, тенге	368
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	436
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	174
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**45033**
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**115149**
	- материалы, тенге	67796
	- сметная заработная плата, тенге	22338
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
	Налог (2 %)	2303
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**117452**
	НДС (12 %)	14094
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**131 546**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №10
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1613 105	5,98 2,29	6 2
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А *шт*	2	12100		24200				
3	99-14-38(пл)	Крюк SOT 21.1 *шт*	1	985,74		986				
4	99-14-37(пл)	Зажим натяжной SO 118.425 *шт*	1	1487,16		1487				
5	99-14-36(пл)	Дистанционный бандаж SO 721 *шт*	1	739,92		740				
6	99-14-35(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.127 *шт*	1	541,93		542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	99-14-34(пл)	Зажим заземляющий SM 2.24	1	886,22		886				
		шт								
8	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00014	493900		69				
		т								
9	1-7-6	Зажим плашечный	0,01	7100		71				
		100шт								
10	18-4-2014	Проводник заземляющий ЗП(прим)	1	164		164				
		шт								
11	18-4-1332	Изолятор колпачок	2	13		26				
		шт								
12	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	1	584		584				
		шт								
13	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	
14	99-14-33(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
15	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2		214				
		шт								
16	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								
17	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	1	1340,16		1340				
		шт								
18	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
19	99-14-37(пл)	Крюк PD 2.2	1	945,93		946				
		шт								
20	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,053	5096,44	752,81	270	40	246	24,4	1
		км линии		4140	276,75	219	15	105	1,35	
21	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,019	34872		663				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	16-7-926	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,034	61264		2083				
		км								
23	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт								
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
24	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
		м								
				23	0,4	92	2	95	0,002	–
	Раздел 2 Опорный пункт									
25	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление								
				213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
26	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
27	99-14-41(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2	1	945,93		946				
		шт								
28	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	1	274,81		275				
		шт								
29	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,018	5096,44	752,81	92	14	84	24,4	–
		км линии								
				4140	276,75	75	5	105	1,35	–
30	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,018	34872		628				
		км								
31	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
32	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2		214				
		шт								
33	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	1	274,81		275				
		шт								
34	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	1	1340,16		1340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
	Раздел 3 ВЛ-10кВ									
35	Е33-103-2 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) kмат1=0;	2	2975,76	1990,26	5952	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
36	Е33-109-7 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2 kмат1=0;	0,232	14282,6	2155,1	3314	500	3148	69,5	16
		км линии		12127,5	794,25	2814	184	105	3,87	1
37	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
38	30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	4	19600		78400				
		шт								
39	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) (прим)	0,208	18200		3786				
		м3								
40	99-14-55(пл)	Траверса ТМ 5	2	3020,42		6041				
		шт								
41	99-14-56(пл)	Оголовок ОГ1	2	1344,35		2689				
		шт								
42	99-14-57(пл)	Хомут Х-1 - 2шт, Х-2 - 2 шт	4	384,1		1536				
		шт								
43	99-14-58(пл)	Кронштейн У-1	2	1449,1		2898				
		шт								
44	99-14-60(пл)	Стяжка Г 1	4	1361,81		5447				
		шт								
45	99-14-59(пл)	Проводник ЗП1	4	296,8		1187				
		м								
46	99-14-61(пл)	Изолятор ШФ 20 В	12	558,69		6704				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	99-14-62(пл)	Колпачок К 9	12	18,86		226				
		шт								
48	99-14-63(пл)	Крепление провода	12	157,13		1886				
		шт								
49	99-14-64(пл)	Зажим ПС2	4	96,02		384				
		шт								
50	99-14-65(пл)	Зажим ПА	8	55,87		447				
		шт								
51	Е33-109-7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2 (демонтированный)	0,232	15256,85	2155,1	3540	500	3148	69,5	16
		км линии		12127,5	794,25	2814	184	105	3,87	1
		Всего прямые затраты				**179402**	**11169**			60
						11718	**3176**			14
		В том числе стоимость: материалов, тенге				156517				
		Накладные расходы, тенге				15594				
		- заработная плата, тенге				2339				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				586				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11735				
		Всего				**206731**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2274				
		- сметная заработная плата, тенге				321				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3837				
		- сметная заработная плата, тенге				1765				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2090				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				836				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**215768**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**551719**
- материалы, тенге	400214
- сметная заработная плата, тенге	56880
- нормативная трудоемкость, чел-ч	103
Налог (2 %)	11034
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**562753**
НДС (12 %)	67530
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**630 283**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №11
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 5-1-1)

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружные сети телефонизации									
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	4,88	402,75	–	1965	–	2220	2,8	14
		м3 грунта		402,75	–	1965	–	113	–	–
2	Е33-101-3	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	8	3626,62	1886,24	29013	15090	16734	9,02	72
		опора		1480,5	511,65	11844	4093	105	2,1	17
3	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	4	17600		70400				
		м3								
4	30-19-56	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30 СТ РК 2386-2013	12	3520		42240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Е34-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 16	1,032	2973,38	–	3069	–	2809	14,5	15
		км провода		2475	–	2554	–	110	–	–
6	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,04	501603,38	–	20064	–	915	133	5
		канало-километр трубопровода		20790	–	832	–	110	–	–
7	Ц10-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг	39	28,9	–	1127	–	692	0,1	4
		м кабеля		18,1	–	706	–	98	–	–
8	Ц10-55-1	Прокладка кабеля по стене деревянной, масса 1 м до 1 кг	21	51,6	–	1084	–	761	0,25	5
		м кабеля		40,3	–	846	–	90	–	–
9	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	15	60,5	2,8	908	42	793	0,32	5
		м		55,1	0,5	827	8	95	0,003	–
10	16-6-528	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,361	61333		22141				
		км								
11	16-6-529	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,771	103129		79512				
		км								
12	1-7-25	Консоли швеллерные, марка ЖС-1 ЛЭ3.40.0066, оцинкованные	28	1970		55160				
		шт								
13	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	30	24,4	–	732	–	759	0,13	4
		пара		23	–	690	–	110	–	–
14	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	2	626,1	–	1252	–	1362	4	8
		кабель		619	–	1238	–	110	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами на опоре	18	129	52,7	2322	949	936	0,21	4
		м ограждения		33,8	13,5	608	243	110	0,079	1
16	Ц10-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость боксов 50х2, в пластмассовой оболочке	1	1713	631	1713	631	1117	5	5
		бокс		866	149	866	149	110	0,868	1
17	Ц10-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	3	970,2	–	2911	–	2917	5	15
		шт		884	–	2652	–	110	–	–
18	Ц8-165-1	Муфта разветвительная на кабеле ТСВ 10х2	1	2021,1	1245	2021	1245	979	4	4
		шт		756	275	756	275	95	1,604	2
19	16-10-3	Муфта ВССК-10 (прим)	1	3200		3200				
		шт								
		Всего прямые затраты				**340834**	**17957**			**160**
						26384	**4768**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				296492				
		Накладные расходы, тенге				32994				
		- заработная плата, тенге				4949				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22430				
		Всего				**396258**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				4359				
		- сметная заработная плата, тенге				615				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				7355				
		- сметная заработная плата, тенге				3383				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4006
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1602
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**413580**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1057524**
- материалы, тенге	758130
- сметная заработная плата, тенге	116873
- нормативная трудоемкость, чел-ч	221
Налог (2 %)	21150
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1078674**
НДС (12 %)	129441
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 208 115**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №12
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	30	27,84	26,18	835	785	258	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	50	216	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	0,9	262,72	–	236	–	267	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	236	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	30	6,48	6,48	194	194	61	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	63	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,9	134,1	–	121	–	137	0,972	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				134,1	–	121	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	30	21,55	4,52	647	136	496	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	511	–	97	–	–
6	Е1-164-1	Подготовка из мягкого грунта	0,4	167,4	–	67	–	76	1,18	–
		м3 грунта								
				167,4	–	67	–	113	–	–
7	Е1-164-1	Защитный слой из мягкого грунта	0,12	167,4	–	20	–	23	1,18	–
		м3 грунта								
				167,4	–	20	–	113	–	–
8	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
		км трубопровода								
				29700	4698,68	297	47	130	18,1	–
9	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10	32		320				
		м								
10	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,0003	51202,26	20326,01	15	6	14	179	–
		км трубопровода								
				30825	5353,43	9	2	130	20,64	–
11	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0006	104944,76	54237,13	63	33	51	296	–
		км трубопровода								
				49950	14426,1	30	9	130	56,71	–
12	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,3	131		39				
		м								
13	8-4-894	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-250x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,6	1929		1157				
		м								
14	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244		244				
		шт								
15	8-4-3385	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1615		1615				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	0,1	41,11	0,05	4	–	–	0,0136	–
		м2								
				2,75	0,02	–	–	90	0,0001	–
17	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,42	25580,84	1879,87	36325	2669	3644	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	2038	765	130	2,061	3
18	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
19	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
20	2-1-267	Стремянки	0,01708	133700		2284				
		т								
21	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,02808	93997,62	304,24	2639	9	979	198	6
		т								
				33075	114,75	929	3	105	0,56	–
22	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0312	2288,24	335,84	71	10	31	4,54	–
		м3 кладки								
				699,75	126	22	4	118	0,61	–
23	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,016	12200		195				
		1000шт								
24	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03444	247994,13	49389,75	8541	1701	3647	312,7	11
		т фасонных частей								
				62775	18657	2162	643	130	91,12	3
25	8-4-1469	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	69		69				
		шт								
26	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471		471				
		шт								
28	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
29	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	139		556				
		шт								
30	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	904		1808				
		шт								
31	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
		врезка								
				1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	–
32	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,01	8097,13	–	81	–	104	51,5	1
		км трубопровода								
				8032,5	–	80	–	130	–	–
		Всего прямые затраты				**81706**	**5948**			**60**
						8379	**1841**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				67379				
		Накладные расходы, тенге				12633				
		- заработная плата, тенге				1895				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5660				
		Всего				**99999**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1100				
		- сметная заработная плата, тенге				155				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				1856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- сметная заработная плата, тенге	854
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1011
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	404
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**104370**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**266874**
- материалы, тенге	172288
- сметная заработная плата, тенге	37176
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Налог (2 %)	5337
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**272211**
НДС (12 %)	32665
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**304 876**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №13
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Жилой дом										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	37,5	27,84	26,18	1044	982	322	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	62	270	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,12	262,72	–	294	–	332	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	294	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	37,5	6,48	6,48	243	243	77	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	2,1	–	79	97	0,00806	–
		м3 грунта	1,12	134,1	–	150	–	170	0,972	1
5	Е1-134-1			134,1	–	150	–	113	–	–
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	37,5	21,55	4,52	808	170	620	0,108	4
		м3 уплотненного грунта								
6	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм		17,03	–	639	–	97	–	–
		км трубопровода	0,025	444788,62	1733,92	11120	43	2002	361	9
7	Е23-13-1			60966	650,25	1524	16	130	3,17	–
		Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,5	29041,97	5028,34	14521	2514	4073	27,104	14
		м3 конструкций колодцев								
8	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		4382,55	1883,03	2191	942	130	9,196	5
			0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
9	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
			1	8060		8060				
		комплект								
10	2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
		т								
11	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	33398,37	34,3	259	–	270	198	2
		т								
12	Е23-13-8			33075	8,8	257	–	105	0,56	–
		Устройство септика	2,37	20828,82	1265,69	49364	3000	6245	9,16	22
		м3 конструкций колодцев								
13	1-1-773			1552,73	474,08	3680	1124	130	2,315	5
		Скобы ходовые	17	221		3757				
		шт								
14	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	229,59	3,39	2870	42	1546	0,65	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	117 233,52	0,72 9,95	1463 733	9 31	105 216	0,0505 0,356	1 1
		м2 стяжки								
16	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000;	-9,42	52,2 27,92	3,74 0,67	164 -263	12 -6	123 -10	0,0182 0,0044	– –
		м2 стяжки								
17	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,77	0,63 12300	0,25	-6 9471	-2	123	0,0012	–
		м2								
18	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
19	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,04632	93997,62	304,24	4354	14	1614	198	9
		т								
20	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	33075 387314,07	114,75 1984,82	1532 775	5 4	105 121	0,56 270	– 1
		км трубопровода								
21	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	45900 896,88	749,25 5,38	92 897	1 5	130 81	3,66 0,36	– –
		зонт								
22	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	60,75 8062,57	2,25 66,01	61 4434	2 36	128 128	0,01 1,35	– 1
		м3								
23	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0468	195,75 2288,24	24,93 335,84	108 107	14 16	105 46	0,1218 4,54	– –
		м3 кладки								
24	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,024	699,75 12200	126	33 293	6	118	0,61	–
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Опорный пункт										
25	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	27,84	26,18	167	157	51	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	10	43	97	0,025	–
26	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,18	262,72	–	47	–	53	1,848	–
		м3 грунта		262,72	–	47	–	113	–	–
27	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6	6,48	6,48	39	39	13	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	13	97	0,00806	–
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,18	134,1	–	24	–	27	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	24	–	113	–	–
29	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	102	–	97	–	–
30	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	444788,62	1733,92	1779	7	321	361	1
		км трубопровода		60966	650,25	244	3	130	3,17	–
31	Е23-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,4	29041,97	5028,34	11617	2011	3258	27,104	11
		м3 конструкций колодцев		4382,55	1883,03	1753	753	130	9,196	4
32	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
34	2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
		т								
35	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	93997,62	304,24	729	2	271	198	2
		т								
				33075	114,75	257	1	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**154574**	**9409**			**91**
						14897	**3319**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				130269				
		Накладные расходы, тенге				22202				
		- заработная плата, тенге				3330				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10607				
		Всего				**187383**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2061				
		- сметная заработная плата, тенге				291				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3478				
		- сметная заработная плата, тенге				1600				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1894				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				758				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**195574**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**500083**				
		- материалы, тенге				333098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	- сметная заработная плата, тенге	66710
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	130
	Налог (2 %)	10002
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**510085**
	НДС (12 %)	61210
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**571 295**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №14
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь) *м3 грунта*	131	9,24 –	9,24 3	1210 –	1210 393	381 97	– 0,0115	– 2
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	129,9	47,43 2,59	44,84 13,81	6161 336	5825 1794	2066 97	0,0179 0,0519	2 7
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800; *т*	233,82	45 –	45 9	10522 –	10522 2104	2104 100	– 0,0189	– 4
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	70	97	0,00023	–
5	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	70	97	0,00023	–
		Всего прямые затраты				**18293**	**17957**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**336** –	**4431**			**13**
		Накладные расходы, тенге				4687				
		- заработная плата, тенге				703				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1379				
		Всего				**24359**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				268				
		- сметная заработная плата, тенге				38				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				452				
		- сметная заработная плата, тенге				208				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				246				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				99				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**25424**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**65009**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				15498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Налог (2 %)				1300				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**66309**				
		НДС (12 %)				7957				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**74 266**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

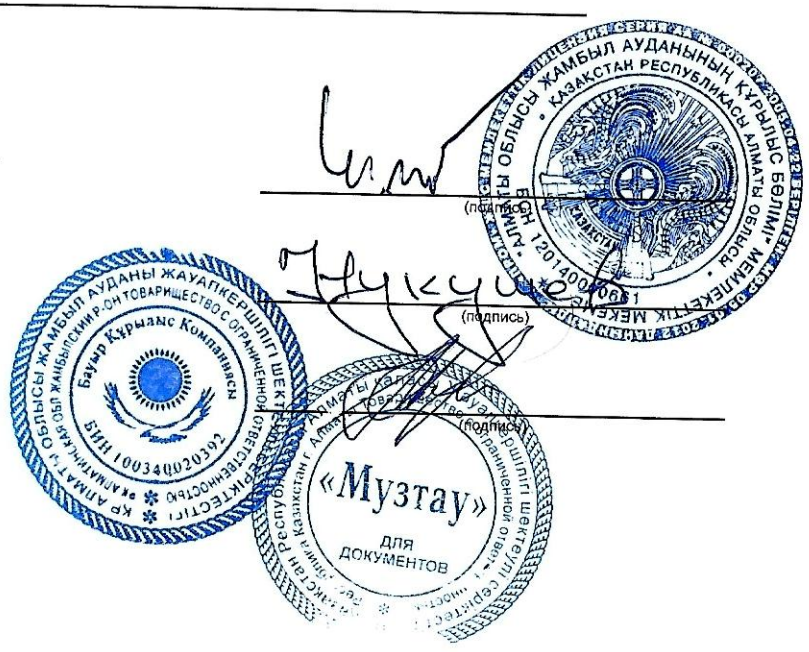

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №15
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 7-3-1)

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Сетчатое ограждение										
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения	136,4	567,3	214,15	77380	29210	76902	2,01	274
		м оград		344,25	58,46	46956	7974	140	0,2111	29
2	Е7-25-8	Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
4	2-1-45	Конструкции ограждения	2,80002	99800		279442				
		т								
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,48716	50800		24748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	195,48	23		4496				
		м2								
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	3,075	7520		23124				
		м3								
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	81,20058	20,35	0,02	1652	2	304	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	338	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**423173**	**31625**			**328**
						56600	**8669**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				334949				
		Накладные расходы, тенге				91207				
		- заработная плата, тенге				13681				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 00 %)				30863				
		Всего				**545243**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5998				
		- сметная заработная плата, тенге				846				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				10121				
		- сметная заработная плата, тенге				4656				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5512				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2205				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**569079**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1455135**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	- материалы, тенге	856465
	- сметная заработная плата, тенге	235676
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	439
	Налог (2 %)	29103
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1484238**
	НДС (12 %)	178109
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 662 347**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)
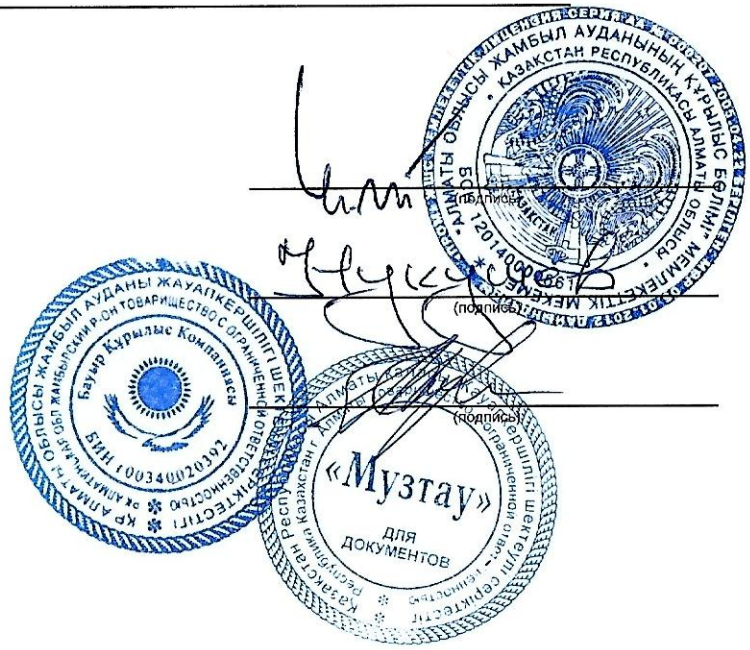
Технический надзор: ТОО "Мұзтау"
